

RELATÓRIO SEMANAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Consolidado das vistorias NR-18 da semana · Modelo único SST FDE rev01

Semana **37**

07/09/2026 a 11/09/2026

Obra: **218**

1 vistoria(s)

UNIDADE DE ENSINO 218 — EE CEL ANTONIO PAIVA DE SAMPAIO		MUNICÍPIO Osasco / SP	CONTRATO FDE 70/00255/26-001-001
EMPREITEIRO Rafael	CONTRATADA B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL Luis Júnior	FISCAL FDE DANILO
PRAZO DECORRIDO NO FIM DA SEMANA início 16/04/2026 · término previsto 16/11/2026 · decorridos 148 de 214 dias (69%) · restam 66 dias na sexta-feira			

VISTORIAS DA SEMANA

DATA	RESPONSÁVEL	FASE	CLASSIFICAÇÃO	MÉDIA	CONFORMIDADE	NC
10/09/2026	Maria Santos	Obra em execução — inspeção de segurança do SESMT	RUIM	3,000	25%	6

RUIM

situação na última vistoria (10/09/2026) · média ponderada **3,000**
CORREÇÃO IMEDIATA — item com nota 3 (RUIM)

ITENS NÃO CONFORMES NA VISTORIA

DATA	ITEM	O QUE FOI VERIFICADO	NR
10/09/2026	8.3	Instalações gerais — extensões, cabos e tomadas Luminárias penduradas em salas de aula em funcionamento e na sala dos professores (NC 05 e 06).	NR-18.21
10/09/2026	23.1	Armazenagem de materiais Escadas, perfis, placas e componentes de andaime armazenados de forma desorganizada (NC 02 e 04).	NR-18.19
10/09/2026	23.2	Ordem e limpeza — resíduos, embalagens e circulações desobstruídas Sacos de resíduos, caixas, perfis e cabos junto às rotas de circulação (NC 01 e 03).	NR-18.19
10/09/2026	23.3	Tapumes / isolamento da obra — barreira rígida, estável e contínua Isolamento por cones e fita zebrada, pontual, sem impedir fisicamente a aproximação (NC 04).	NR-18.13
10/09/2026	23.4	Interface com a comunidade escolar — controle efetivo de acesso Materiais e frente de obra em áreas acessíveis a alunos e funcionários (NC 01, 02 e 04).	NR-18.13

NÃO CONFORMIDADES DA SEMANA — REGISTRO FOTOGRÁFICO



10/09/2026 · Armazenamento de sacos com resíduos e materiais em área de circulação, junto ao acesso, reduzindo a passagem e comprometendo a organização do local.

Item	23.2 — Ordem e limpeza — resíduos, embalagens e circulações desobstruídas
Local	Circulação interna / área escolar
Classificação	ALTO
Ação corretiva	Retirar os materiais da circulação e destiná-los a local definido, mantendo acesso e rota de passagem permanentemente desobstruídos.
Prazo	—
Responsável	Rafael
Status	Aberta




10/09/2026 · Escadas, perfis, placas e sobras de materiais armazenados de forma desorganizada e apoiados em área acessível a alunos e funcionários, reduzindo a faixa segura de circulação e criando risco de tombamento, cortes, impacto e tropeço.

Item	23.1 — Armazenagem de materiais
Local	Acesso / circulação junto ao depósito
Classificação	ALTO
Ação corretiva	Reorganizar imediatamente o armazenamento em local exclusivo da obra, com escadas travadas e materiais empilhados de forma estável. Proibir o armazenamento em rotas de circulação e segregar a área com barreira física adequada.
Prazo	—
Responsável	Rafael
Status	Aberta



10/09/2026 · Caixas, perfis metálicos, cabos e recipientes depositados junto à passagem, sem segregação suficiente. Há risco de tropeço, queda, contato com arestas e interferência na circulação de alunos, funcionários e terceiros.

Item	23.2 — Ordem e limpeza — resíduos, embalagens e circulações desobstruídas
Local	Acesso / circulação próximo ao depósito
Classificação	ALTO
Ação corretiva	Realizar limpeza e organização do local, remover resíduos e cabos soltos, acondicionar perfis e materiais em suporte apropriado e manter a passagem totalmente desobstruída. Isolar o depósito temporário com tapume móvel ou barreira rígida.
Prazo	—
Responsável	Rafael
Status	Aberta

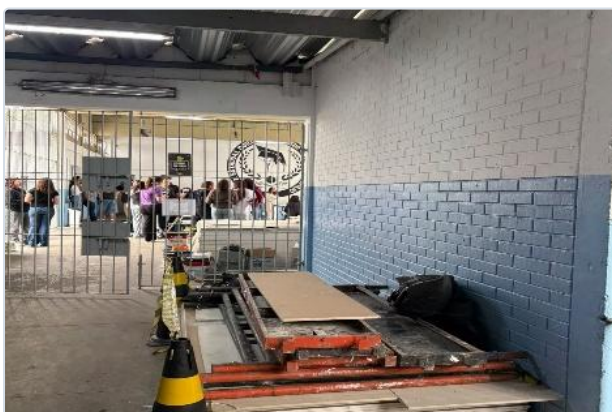


10/09/2026 · Componentes de andaime e placas armazenados junto à circulação escolar. O isolamento por cones e fita zebra é pontual e não impede fisicamente a aproximação de alunos e funcionários.

Item	23.3 — Tapumes / isolamento da obra — barreira rígida, estável e contínua
Local	Área de materiais / componentes de andaime
Classificação	ALTO
Ação corretiva	Implantar tapume móvel, contínuo, estável e resistente, separando fisicamente a área de armazenamento e a frente de obra da circulação. Manter acesso controlado somente aos trabalhadores autorizados; cones e fita zebra apenas como sinalização complementar.
Prazo	—
Responsável	Rafael
Status	Aberta



10/09/2026 · Luminárias penduradas em salas de aula em funcionamento, com risco de queda do material e iluminação insuficiente no ambiente.

Item	8.3 — Instalações gerais — extensões, cabos e tomadas
Local	Salas de aula / sistema de iluminação
Classificação	ALTO
Ação corretiva	Retirada dos alunos da sala e adequação das luminárias e componentes elétricos por profissional autorizado, restabelecendo iluminação adequada antes da liberação da sala.
Prazo	—
Responsável	Rafael
Status	Aberta

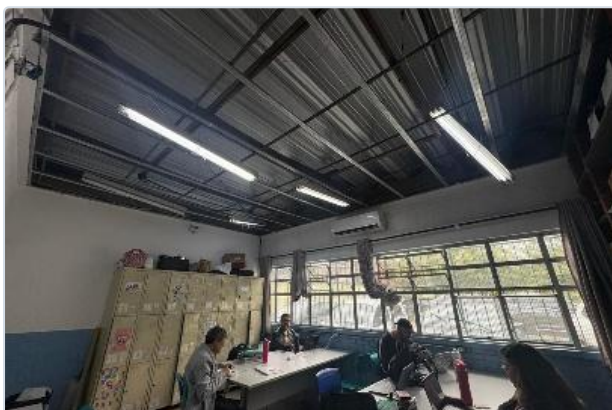

10/09/2026 · Luminárias da sala dos professores apresentando acabamento inadequado e possível risco de queda e insuficiência da iluminação no ambiente.

Item	8.3 — Instalações gerais — extensões, cabos e tomadas
Local	Sala dos professores / sistema de iluminação
Classificação	ALTO
Ação corretiva	Providenciar regularização das luminárias afetadas. Antes de qualquer intervenção, desenergizar o circuito, impedir reenergização indevida e permitir o serviço somente a trabalhador autorizado. Após a correção, verificar funcionamento e condição de iluminação.
Prazo	—
Responsável	Rafael
Status	Aberta

ACOMPANHAMENTO

DATA	EFETIVO	ATIVIDADES	ITENS DE SST OBSERVADOS	PENDÊNCIAS
10/09/2026	3	Análise e desobstrução de áreas para a eleição; ampliação da área de isolamento com tapume; retirada das telhas do pátio.	Tapume ampliado e área isolada; sacos de argamassa ainda no pátio.	Retirar o restante da argamassa do pátio até 29/09.

Colaboradores lançados na vistoria mais completa da semana: 1.

Maria Santos
Responsável SST

Luis Júnior
Engenheiro responsável

Rafael
Empreiteiro

Gerado em 03/10/2026 02:10 · consolidado de 1 vistoria(s) do formulário do painel (leg-218-20260910). Os relatórios de cada vistoria ficam na aba Segurança.
