

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Vistoria NR-18 · Modelo único SST FDE rev01 · pontuação conforme Relatório de Performance de Obra da FDE

Data: 11/09/2026 · 15:00
Obra: 282
Vistoria por: Maria Santos
código leg-282-20260911

UNIDADE DE ENSINO 282 — EE/CEL FRANCISCO MATARAZZO SOBRINHO (OSASCO/SP)		MUNICÍPIO Osasco / SP	TIPO DE OBRA Reforma
CONTRATO FDE 05/00186/26-001-001	PI 2026/01256	ORDEM DE SERVIÇO 05/00186/26	CÓDIGO FDE —
EMPREITEIRO Rafael	CONTRATADA B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	FASE DA OBRA NA VISTORIA Obra em execução — inspeção de segurança do SESMT	
RESPONSÁVEL TÉCNICO Viktor	ENCARREGADO / PREPOSTO —	RESPONSÁVEL PELA VISTORIA (SST) Maria Santos	REGISTRO PROFISSIONAL —
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL Luís Júnior	FISCAL FDE DANILO	PRAZO CONTRATUAL 120 dias	ENDEREÇO Rua Palestina, 137 - Munhoz Júnior - CEP 06240-170

PRAZO DECORRIDO NA DATA DA VISTORIA
início 03/07/2026 · término previsto 03/11/2026 · decorridos 70 de 123 dias (57%) · restam 53 dias na data da vistoria

OBSERVAÇÕES
Preenchido a partir do Relatório de Não Conformidades do SESMT de 11/09/2026. A aba VISTORIA foi respondida SOMENTE nos itens evidenciados por esse relatório — os demais ficaram em branco por falta de evidência, e a pontuação é PARCIAL. ATENÇÃO: as 5 NCs desta inspeção repetem as condições já apontadas em 31/08/2026 — todas marcadas como REINCIDENTES. — Relatório convertido para o padrão do formulário em 03/10/2026 a partir da ficha anterior. Campos que o relatório original não trazia ficaram em branco.

RESULTADO DA AVALIAÇÃO

Classificação geral

RUIM

média ponderada 3,000 (0 = ótimo · 4 = péssimo)

CORREÇÃO IMEDIATA — item com nota 3 (RUIM)

25%

Índice de conformidade

4

Itens avaliados (de 38)

18

Total de pontos (peso × nota)

4,500

Média FDE (total ÷ itens)

3 · Ruim

Pior nota da vistoria

5

Não conformidades abertas

Distribuição das notas dos itens avaliados: Ruim 4


RESUMO DA VISTORIA POR GRUPO

GRUPO DE ITENS (NR-18)	ITENS	CONFORMES	NÃO CONFORMES	N.A.
8 · Instalações elétricas	4	0	1	—
23 · Gerais	4	0	4	—



NC 1 · Armazenamento de sacos com resíduos e materiais em área de circulação, junto ao acesso, reduzindo a passagem e comprometendo a organização do local.

Item da vistoria	23.2 — Ordem e limpeza — resíduos, embalagens e circulações desobstruídas (NR-18.19)
Local	Acesso / circulação interna
Risco	Obstrução da passagem, tropeço e queda no mesmo nível.
Classificação	ALTO · recorrente
Ação corretiva	Retirar os materiais da circulação e destiná-los a local definido, mantendo acesso e rota de passagem permanentemente desobstruídos.
Prazo	18/09/2026 vencido
Responsável	Rafael
Status	Aberta

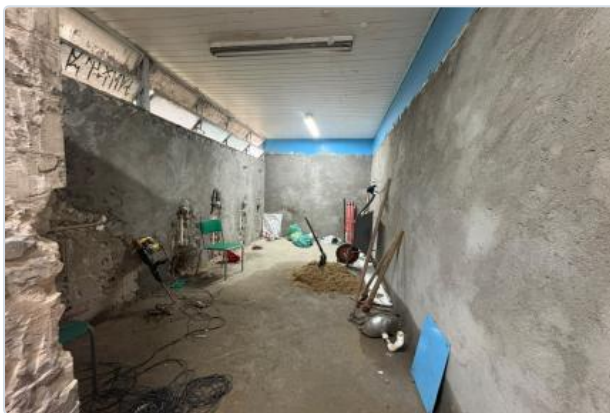

NC 2 · Ferramentas, cabos, materiais e agregado depositados no piso sem organização e sem delimitação adequada da frente de serviço.

Item da vistoria	23.1 — Armazenagem de materiais (NR-18.19)
Local	Área interna em reforma
Risco	Tropeço, cortes e contato acidental com ferramentas e cabos.
Classificação	ALTO · recorrente
Ação corretiva	Retirar os materiais da circulação e destiná-los a local definido, mantendo acesso e rota de passagem permanentemente desobstruídos.
Prazo	18/09/2026 vencido
Responsável	Rafael
Status	Aberta



NC 3 · Cabos e ferramentas dispostos no piso, materiais apoiados de forma inadequada e instalações aparentes durante a execução dos serviços.

Item da vistoria	8.3 — Instalações gerais — extensões, cabos e tomadas (NR-18.21)
Local	Área de instalações / parede
Risco	Contato acidental com instalações aparentes, tropeço e queda de materiais.
Classificação	ALTO · recorrente
Ação corretiva	Manter cabos e ferramentas organizados fora das rotas de circulação, acondicionar materiais com segurança e sinalizar a área em intervenção.
Prazo	18/09/2026 vencido
Responsável	Rafael
Status	Aberta



NC 4 · Acesso parcialmente obstruído por mobiliário e material utilizado como barreira improvisada, sem isolamento físico adequado da área em reforma.

Item da vistoria	23.3 — Tapumes / isolamento da obra — barreira rígida, estável e contínua (NR-18.13)
Local	Acesso à área em obra
Risco	Deslocamento da barreira improvisada e acesso indevido à frente de serviço.
Classificação	MÉDIO · recorrente
Ação corretiva	Implantar isolamento físico firme e sinalização adequada, com tapume móvel.
Prazo	18/09/2026 vencido
Responsável	Rafael
Status	Aberta



NC 5 · Área escolar adjacente à frente de obra, exigindo controle de acesso para evitar aproximação de alunos, funcionários e terceiros durante os serviços.

Item da vistoria	23.4 — Interface com a comunidade escolar — controle efetivo de acesso (NR-18.13)
Local	Área adjacente / espaço de uso escolar
Risco	Aproximação de alunos, funcionários e terceiros da frente de obra.
Classificação	MÉDIO · recorrente
Ação corretiva	Manter segregação física contínua entre a obra e a área escolar, com sinalização visível (tapume móvel).
Prazo	18/09/2026 vencido
Responsável	Rafael
Status	Aberta

PONTUAÇÃO FDE — ITENS AVALIADOS

Nº	ITEM AVALIADO	PESO	NOTA	PONTOS
13	Instalações elétricas (ajustada)	3	3 · Ruim	9
36	Armazenagem de Materiais (ajustada)	1	3 · Ruim	3
37	Ordem e Limpeza (ajustada)	1	3 · Ruim	3
38	Tapumes / Isolamento Obra (ajustada)	1	3 · Ruim	3
Total · 4 itens · soma dos pesos 6				18

34 item(ns) da pontuação sem avaliação nesta vistoria (N.A. ou não verificados) — fora da média.

VISTORIA NR-18 — ITENS VERIFICADOS

ITEM	O QUE FOI VERIFICADO	NR	RESPOSTA
8 · Instalações elétricas			
8.3	Instalações gerais — extensões, cabos e tomadas Cabos e instalações aparentes durante a execução dos serviços (NC 03). — ação: Correção conforme NC — prazo 18/09/2026	NR-18.21	Insatisfatório
23 · Gerais			
23.1	Armazenagem de materiais Ferramentas, materiais e agregado depositados no piso sem local definido (NC 02). — ação: Correção conforme NC — prazo 18/09/2026	NR-18.19	Insatisfatório
23.2	Ordem e limpeza — resíduos, embalagens e circulações desobstruídas Sacos de resíduos e materiais na circulação, reduzindo a passagem (NC 01 e 02). — ação: Correção conforme NC — prazo 18/09/2026	NR-18.19	Insatisfatório

ITEM	O QUE FOI VERIFICADO	NR	RESPOSTA
23.3	Tapumes / isolamento da obra — barreira rígida, estável e contínua Acesso obstruído por mobiliário usado como barreira improvisada (NC 04). — ação: Correção conforme NC — prazo 18/09/2026	NR-18.13	Insatisfatório
23.4	Interface com a comunidade escolar — controle efetivo de acesso Área escolar adjacente à frente de obra, sem segregação física contínua (NC 05). — ação: Correção conforme NC — prazo 18/09/2026	NR-18.13	Insatisfatório

COLABORADORES EM OBRA

1 colaborador(es) (1 próprio(s), 0 subempreitado(s)). Pendências: CTPS 0 · ASO 0 · treinamento 0 · ficha de EPI 0. Nomes só na versão completa (pasta INSPECOES).

ACOMPANHAMENTO DO DIA

EFETIVO NO DIA 3	EPI / UNIFORME ENTREGUE Sim	ATIVIDADES DO DIA Análise e desobstrução de áreas para a eleição; ampliação da área de isolamento com tapume; retirada das telhas do pátio.
ITENS DE SST OBSERVADOS Tapume ampliado e área isolada; sacos de argamassa ainda no pátio.		PENDÊNCIAS Retirar o restante da argamassa do pátio até 29/09.

Maria Santos Responsável pela vistoria (SST)	Luis Júnior Engenheiro responsável	Rafael Empreiteiro
---	---------------------------------------	-----------------------

Gerado em 03/10/2026 02:09 a partir do formulário do painel (preenchido por Maria Santos, enviado em). Ficha oficial no modelo rev01 (Excel) na pasta INSPECOES.
Escala FDE: 0 ótimo · 1 bom · 2 regular · 3 ruim · 4 péssimo; N.A. não entra na média.
