

RELATÓRIO SEMANAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Consolidado das vistorias NR-18 da semana · Modelo único SST FDE rev01

Semana **37**

07/09/2026 a 11/09/2026

Obra: **298**

1 vistoria(s)

UNIDADE DE ENSINO 298 — ANTONIO RAPOSO TAVARES		MUNICÍPIO Osasco / SP	CONTRATO FDE 05/00928/26-001-001
EMPREITEIRO Rafael	CONTRATADA B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL Luis Júnior	FISCAL FDE DANILO
PRAZO DECORRIDO NO FIM DA SEMANA início 27/07/2026 · término previsto 27/02/2027 · decorridos 46 de 215 dias (21%) · restam 169 dias na sexta-feira			

VISTORIAS DA SEMANA

DATA	RESPONSÁVEL	FASE	CLASSIFICAÇÃO	MÉDIA	CONFORMIDADE	NC
08/09/2026	Maria Santos	Obra em execução — inspeção de segurança do SESMT	RUIM	3,000	25%	8

RUIM

situação na última vistoria (08/09/2026) · média ponderada **3,000**
CORREÇÃO IMEDIATA — item com nota 3 (RUIM)

ITENS NÃO CONFORMES NA VISTORIA

DATA	ITEM	O QUE FOI VERIFICADO	NR
08/09/2026	8.3	Instalações gerais — extensões, cabos e tomadas Extensão no piso da circulação, sem cabo PP e sem proteção mecânica (NC 03).	NR-18.21
08/09/2026	8.4	Quadros elétricos — proteção, identificação e DR Extensão ligada diretamente ao quadro, sem plugue; fiação retirada do quadro sem acondicionamento (NC 04 e 05).	NR-18.21
08/09/2026	9.1	Demolições Demolição de muro executada sem isolamento e sinalização adequados (NC 01).	NR-18.6
08/09/2026	21.1	Sinalização de segurança — EPI obrigatório, riscos, setorização e isolamento Área de demolição sem sinalização adequada (NC 01).	NR-18.13
08/09/2026	22.1	EPIs adequados fornecidos, com CA válido e em uso efetivo Mão de obra sem padronização prévia de vestimenta de trabalho (NC 02).	NR-06.6.1 / NR-06.7.1
08/09/2026	23.1	Armazenagem de materiais Tapumes armazenados em frente à Secretaria, apoiados sobre banco de atendimento (NC 06).	NR-18.19
08/09/2026	23.2	Ordem e limpeza — resíduos, embalagens e circulações desobstruídas Entulhos na área de intervenção e fiação solta junto à frente de trabalho (NC 02 e 05).	NR-18.19
08/09/2026	23.3	Tapumes / isolamento da obra — barreira rígida, estável e contínua Tapume provisório sem fixação e com instabilidade, com risco de queda (NC 07 e 08).	NR-18.13
08/09/2026	23.4	Interface com a comunidade escolar — controle efetivo de acesso Área de intervenção acessível a terceiros durante a demolição (NC 01).	NR-18.13



08/09/2026 · Demolição de muro executada sem isolamento e sinalização adequados, permitindo aproximação de terceiros à área de intervenção.

Item	9.1 — Demolições
Local	Demolição de muro sem isolamento
Classificação	ALTO
Ação corretiva	Isolar integralmente a área com barreira física e sinalização visível, restringindo o acesso durante a demolição e a retirada de entulho.
Prazo	17/09/2026
Responsável	Rafael
Status	Aberta




08/09/2026 · Área de intervenção com entulhos e sem isolamento adequado. Foi observada a utilização de mão de obra sem padronização prévia de vestimenta de trabalho; o empreiteiro disponibilizou calçados e calças.

Item	22.1 — EPIs adequados fornecidos, com CA válido e em uso efetivo
Local	Área de intervenção / entulhos sem isolamento
Classificação	ALTO
Ação corretiva	Manter a área isolada e organizada, retirar os entulhos e assegurar que todos os trabalhadores estejam devidamente orientados e equipados antes do início das atividades.
Prazo	17/09/2026
Responsável	Rafael
Status	Aberta



08/09/2026 · Extensão/fiação disposta no piso em área de circulação, sem cabo PP adequado e sem proteção contra danos mecânicos, criando risco de tropeço e contato elétrico.

Item	8.3 — Instalações gerais — extensões, cabos e tomadas
Local	Fiação/extensão no chão em área de circulação de pedestres
Classificação	MÉDIO
Ação corretiva	Substituir por extensão com cabo PP compatível, manter conexões protegidas e retirar a fiação da rota de circulação, utilizando passagem aérea ou proteção mecânica adequada.
Prazo	17/09/2026
Responsável	Rafael
Status	Aberta

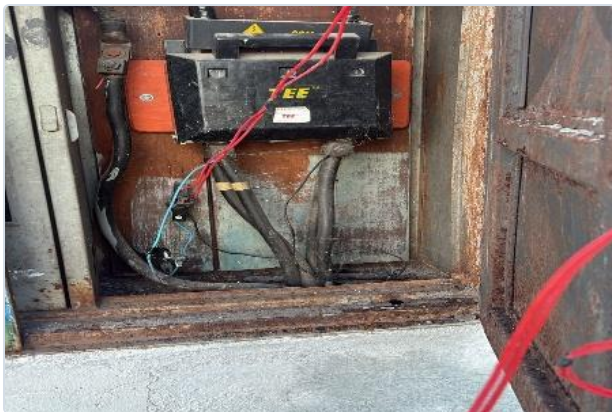

08/09/2026 · Fiação de extensão conectada diretamente ao quadro elétrico, sem plugue/conector apropriado.

Item	8.4 — Quadros elétricos — proteção, identificação e DR
Local	Extensão irregular ligada diretamente ao quadro elétrico
Classificação	MÉDIO
Ação corretiva	Regularizar a alimentação elétrica utilizando plugue, tomada e conexões adequadas, sem ligações improvisadas, mantendo o quadro protegido contra acesso não autorizado.
Prazo	17/09/2026
Responsável	Rafael
Status	Aberta



08/09/2026 · Fiação retirada do quadro elétrico e deixada próxima à área de trabalho, sem acondicionamento adequado.

Item	8.4 — Quadros elétricos — proteção, identificação e DR
Local	Fiação retirada do quadro elétrico
Classificação	ALTO
Ação corretiva	Recolher e acondicionar imediatamente a fiação e os componentes elétricos em local protegido, mantendo a área livre e organizada.
Prazo	17/09/2026
Responsável	Rafael
Status	Aberta



08/09/2026 · Tapumes armazenados em frente à Secretaria, sem isolamento e apoiados sobre banco destinado ao atendimento da escola, com risco de queda e obstrução.

Item	23.1 — Armazenagem de materiais
Local	Tapumes armazenados em frente à Secretaria
Classificação	ALTO
Ação corretiva	Retirar os tapumes da área de atendimento e armazená-los em local definido, estável e isolado, sem bloquear circulação ou mobiliário da escola.
Prazo	17/09/2026
Responsável	Rafael
Status	Aberta



08/09/2026 · Tapume instalado de forma provisória, sem fixação definitiva e sem garantia de estabilidade.

Item	23.3 — Tapumes / isolamento da obra — barreira rígida, estável e contínua
Local	Tapume montado provisoriamente
Classificação	ALTO
Ação corretiva	Executar a fixação adequada do tapume, garantindo estabilidade, resistência e isolamento contínuo da área da obra.
Prazo	17/09/2026
Responsável	Rafael
Status	Aberta



08/09/2026 · Tapume apresentando instabilidade e risco de queda sobre pedestres e veículos estacionados junto à obra.

Item	23.3 — Tapumes / isolamento da obra — barreira rígida, estável e contínua
Local	Tapume com risco de queda
Classificação	ALTO
Ação corretiva	Regularizar e reforçar o tapume com urgência, garantindo sua estabilidade e eliminando o risco de queda sobre pedestres e veículos.
Prazo	17/09/2026
Responsável	Rafael
Status	Aberta

ACOMPANHAMENTO

DATA	EFETIVO	ATIVIDADES	ITENS DE SST OBSERVADOS	PENDÊNCIAS
08/09/2026	3	Análise e desobstrução de áreas para a eleição; ampliação da área de isolamento com tapume; retirada das telhas do pátio.	Tapume ampliado e área isolada; sacos de argamassa ainda no pátio.	Retirar o restante da argamassa do pátio até 29/09.

Colaboradores lançados na vistoria mais completa da semana: 1.

Maria Santos Responsável SST	Luis Júnior Engenheiro responsável	Rafael Empreiteiro
---------------------------------	---------------------------------------	-----------------------

Gerado em 03/10/2026 02:10 · consolidado de 1 vistoria(s) do formulário do painel (leg-298-20260908). Os relatórios de cada vistoria ficam na aba Segurança.
