

ATA FDE CONTRATO ATA.FDE 42.228	RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA Modelo conforme o Livro de Ocorrências da FDE · documento de acompanhamento da contratada	Nº 1
		Data: 01/10/2026
		Visita: 13:30
		Preenchido por: Eng. Leonardo

OBRA / UNIDADE DE ENSINO NERCY AMELIA MARTELINI DAHER PROFESSORA	CÓDIGO DO PRÉDIO 125102
LOCAL PIRAPORA DO BOM JESUS	PI (PORTAL) 2023/02722
ORDEM DE SERVIÇO —	CONTRATO FDE 70/00313/26-001-001
EMPREITEIRO ARAUJO	ENG. RESPONSÁVEL / FISCAL FDE LEONARDO / RODRIGO

ITENS VERIFICADOS NA VISITA

1. Mão-de-obra / Número de funcionários Qtd. (6)	☒ Suficiente ☐ Insuficiente
2. Material em canteiro	☒ Suficiente ☐ Insuficiente
3. Equipamentos	☒ Suficiente ☐ Insuficiente
4. Tempo	☐ Seco ☒ Chuva
5. Falhas construtivas a serem corrigidas	☒ Sim ☐ Não
6. Placa de obra instalada	☐ Sim ☒ Não
7. Andamento dos serviços () % atual aprovado 65% · fiscal FDE 57% (LO 18/09/2026)	☐ Não iniciada ☒ Em execução ☐ Obra paralisada ☐ Obra concluída ☐ Em rescisão
8. Ritmo da obra	☒ Normal ☐ Lento ☐ Parado
9. Previsão de término	29/01/2027

PONTOS DE ATENÇÃO

- ALTO Falhas construtivas a corrigir — registrar quais e o prazo
- ATENÇÃO Placa de obra não instalada

AVANÇO DA OBRA

Indicador	%	Referência
Aprovado pela FDE (medições aprovadas)	65%	M001 a M004 aprovadas · M005 em análise fiscal
Execução apontada pelo engenheiro	—	não informado na visita
Fiscal da FDE — último livro de ocorrências	57%	LO nº 13 de 18/09/2026

SERVIÇOS EXECUTADOS

- EXECUÇÃO DE FORRO DE GESSO NA SALA DE LEITURA
- ADEQUAÇÃO DA RAMPA DE ACESSO ÀS SALAS
- EXECUÇÃO DE LIMPEZA DA OBRA
- INSTALAÇÃO DE PORTAS NAS SALAS

MATERIAIS — PEDIDOS E ENTREGAS (SIENGE)

20 pedidos no Sienge · 0 entregues · 20 sem baixa · 0 marcado(s) como pendente pelo engenheiro.

20 pedido(s) sem baixa no Sienge. Neste centro de custo o Sienge não registra a entrega dos pedidos, então "pendente" no relatório do Sienge não quer dizer que o material não chegou. Vale a marcação do engenheiro na aba *Pedidos do Sienge* do painel. Abaixo, só os pedidos dos últimos 45 dias e os marcados como pendentes; 19 pedido(s) mais antigo(s) sem marcação ficaram fora da lista.

Pedido	Fornecedor	Itens	Valor	Entrega
55568 28/08/2026	CIMEMPRIMO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pedido há 35 dias	18470 - Placa de gesso RU 1,20x1,80 verde — 5 un 43938 - PERFIL NIVELADOR F530 — 70 un 43942 - ARAME FIO 10 GALVANIZADO PARA GESSO DRYWALL 1 KG — 5 rol 7494 - Parafuso GN25 — 1.500 un 10569 - Fita telada para drywall — 2 rol 10570 - Massa junta para drywall 25kg — 2 un 43939 - PLACA DE DRYWALL — 50 un 43940 - PARAFUSO PONTA AGULHA METAL-METAL — 100 un 43941 - REGULADOR DE PERFIL F530 — 100 un	R\$ 4.046,51	SEM BAIXA

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES

Observações

- ADEQUAÇÕES E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA PREPARAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR PARA AS ELEIÇÕES

Recomendações à contratada

- REGULARIZAÇÃO DAS PENDÊNCIAS 01, 02, 03, 05, 06 E 07 ATÉ O DIA 02/10/2026, CONFORME COMBINADO. APÓS A REGULARIZAÇÃO, ENVIAR FOTOS NO GRUPO PARA REGISTRO

Pendências em aberto

- 1- PROBLEMA NO ENCANAMENTO DO RESERVATÓRIO, OCASIONANDO FALTA DE ÁGUA NA UNIDADE ESCOLAR. ENCANADOR ACIONADO, COM ATENDIMENTO PROGRAMADO PARA AMANHÃ, CONFORME INFORMAÇÃO DO EMPREITEIRO
- 2- EXECUÇÃO DE ACABAMENTOS (INSTALAÇÃO DE SIFÕES E CANTONEIRAS) E LIMPEZA GROSSA NOS BANHEIROS PARA LIBERAÇÃO DA UNIDADE PARA AS ELEIÇÕES
- 3- INSTALAÇÃO DE PORTAS NAS SALAS E LIMPEZA DA OBRA
- 4- VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE GÁS
- 5- ADEQUAÇÃO DA RAMPA DE ACESSO ÀS SALAS DE AULA
- 6- LIMPEZA DA OBRA PARA AS ELEIÇÕES
- 7- AJUSTE E REPOSICIONAMENTO DA LONA EXISTENTE NAS CADEIRAS DA QUADRA


REGISTRO FOTOGRÁFICO




01/10/2026




01/10/2026

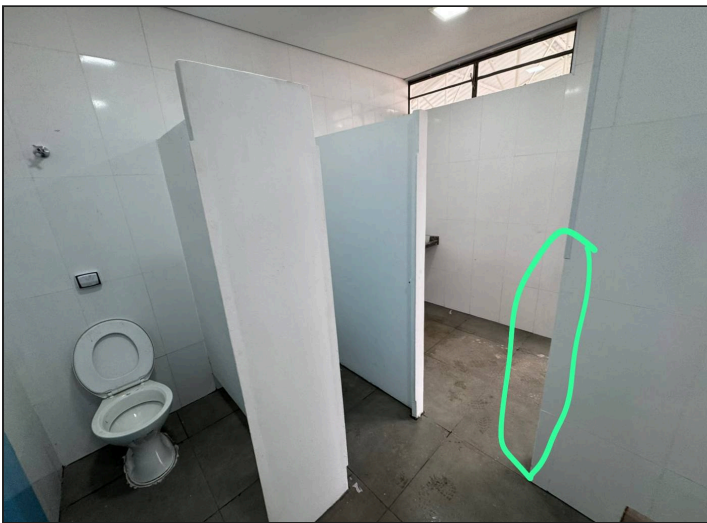

01/10/2026

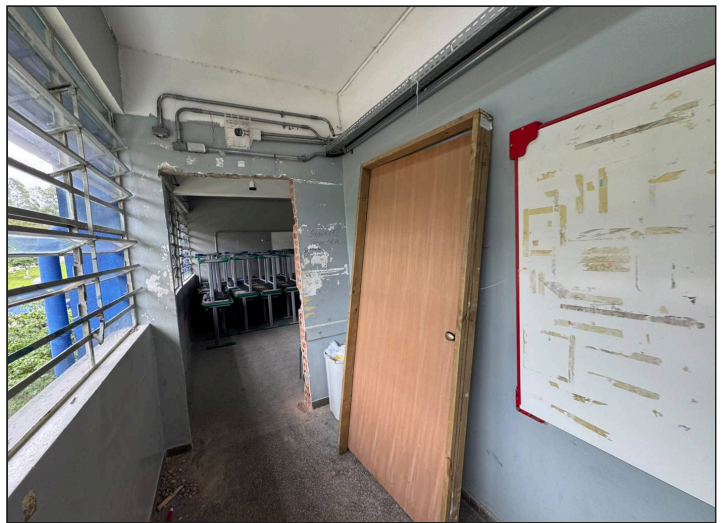


01/10/2026

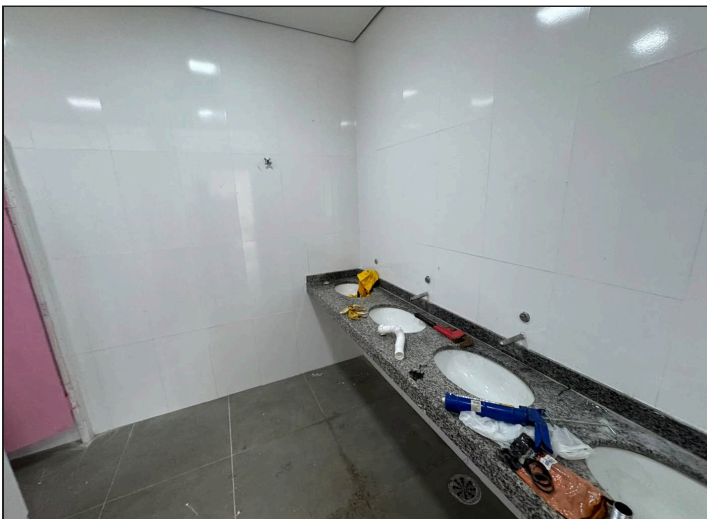

01/10/2026



01/10/2026

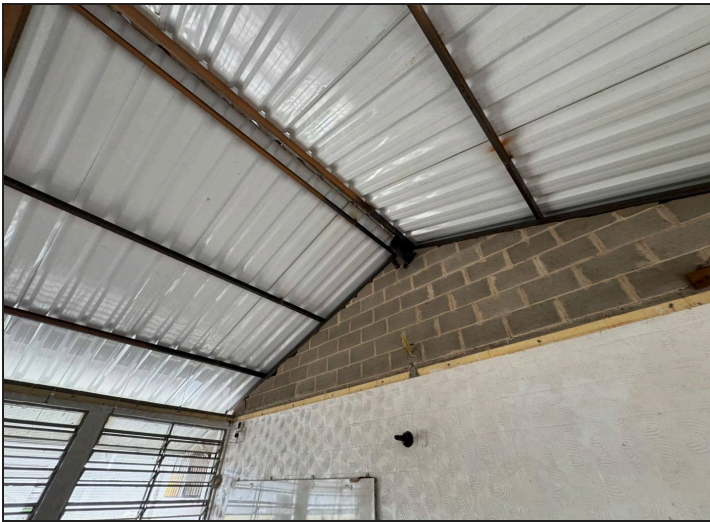

01/10/2026



01/10/2026



01/10/2026



01/10/2026



01/10/2026

LEONARDO Eng. responsável — contratada	ARAUJO Empreiteiro	RODRIGO Fiscal / FDE
--	--	--
