

ATA FDE CONTRATO ATA.FDE 42.228	RELATÓRIO SEMANAL DE ACOMPANHAMENTO Modelo conforme o Livro de Ocorrências da FDE · documento de acompanhamento da contratada	Semana 40
		28/09/2026 a 02/10/2026
		1 visita(s) registrada(s)
OBRA / UNIDADE DE ENSINO NERCY AMELIA MARTELINI DAHER PROFESSORA		CÓDIGO DO PRÉDIO 125102
LOCAL PIRAPORA DO BOM JESUS		PI (PORTAL) 2023/02722
ORDEM DE SERVIÇO —		CONTRATO FDE 70/00313/26-001-001
EMPREITEIRO ARAUJO		ENG. RESPONSÁVEL / FISCAL FDE LEONARDO / RODRIGO

RESUMO DA SEMANA

Data	Dia	Efetivo	Tempo	Ritmo	% execução (eng.)
01/10/2026	qui	6	Chuva	Normal	—

1 visita(s) entre 28/09/2026 e 02/10/2026 1 dia(s) de chuva. Previsão de término: **29/01/2027**.

AVANÇO DA OBRA

Indicador	%	Referência
Aprovado pela FDE (medições aprovadas)	65%	M001 a M004 aprovadas · M005 em análise fiscal
Execução apontada pelo engenheiro	—	não informado na visita
Fiscal da FDE — último livro de ocorrências	57%	LO nº 13 de 18/09/2026

SERVIÇOS EXECUTADOS NA SEMANA

- EXECUÇÃO DE FORRO DE GESSO NA SALA DE LEITURA - ADEQUAÇÃO DA RAMPA DE ACESSO ÀS SALAS - EXECUÇÃO DE LIMPEZA DA OBRA - INSTALAÇÃO DE PORTAS NAS SALAS
--

MATERIAIS — O QUE CHEGOU E O QUE FALTA

Nenhum pedido mudou de pendente para entregue nesta semana.

20 pedidos no Sienge · 0 entregues · **20 sem baixa** · 0 marcado(s) como pendente pelo engenheiro.

20 pedido(s) sem baixa no Sienge. Neste centro de custo o Sienge não registra a entrega dos pedidos, então “pendente” no relatório do Sienge não quer dizer que o material não chegou. Vale a marcação do engenheiro na aba *Pedidos do Sienge* do painel. Abaixo, só os pedidos dos últimos 45 dias e os marcados como pendentes; 19 pedido(s) mais antigo(s) sem marcação ficaram fora da lista.

Pedido	Fornecedor	Itens	Valor	Entrega
55568 28/08/2026	CIMEMPRIMO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pedido há 35 dias	18470 - Placa de gesso RU 1,20x1,80 verde — 5 un 43938 - PERFIL NIVELADOR F530 — 70 un 43942 - ARAME FIO 10 GALVANIZADO PARA GESSO DRYWALL 1 KG — 5 rol 7494 - Parafuso GN25 — 1.500 un 10569 - Fita telada para drywall — 2 rol 10570 - Massa junta para drywall 25kg — 2 un 43939 - PLACA DE DRYWALL — 50 un 43940 - PARAFUSO PONTA AGULHA METAL-METAL — 100 un 43941 - REGULADOR DE PERFIL F530 — 100 un	R\$ 4.046,51	SEM BAIXA

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES DA SEMANA

Observações

- ADEQUAÇÕES E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA PREPARAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR PARA AS ELEIÇÕES


Recomendações à contratada

- REGULARIZAÇÃO DAS PENDÊNCIAS 01, 02, 03, 05, 06 E 07 ATÉ O DIA 02/10/2026, CONFORME COMBINADO. APÓS A REGULARIZAÇÃO, ENVIAR FOTOS NO GRUPO PARA REGISTRO


Pendências em aberto

- 1- PROBLEMA NO ENCANAMENTO DO RESERVATÓRIO, OCASIONANDO FALTA DE ÁGUA NA UNIDADE ESCOLAR. ENCANADOR ACIONADO, COM ATENDIMENTO PROGRAMADO PARA AMANHÃ, CONFORME INFORMAÇÃO DO EMPREITEIRO
- 2- EXECUÇÃO DE ACABAMENTOS (INSTALAÇÃO DE SIFÕES E CANTONEIRAS) E LIMPEZA GROSSA NOS BANHEIROS PARA LIBERAÇÃO DA UNIDADE PARA AS ELEIÇÕES
- 3- INSTALAÇÃO DE PORTAS NAS SALAS E LIMPEZA DA OBRA
- 4- VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE GÁS
- 5- ADEQUAÇÃO DA RAMPA DE ACESSO ÀS SALAS DE AULA
- 6- LIMPEZA DA OBRA PARA AS ELEIÇÕES
- 7- AJUSTE E REPOSICIONAMENTO DA LONA EXISTENTE NAS CADEIRAS DA QUADRA


REGISTRO FOTOGRÁFICO DA SEMANA

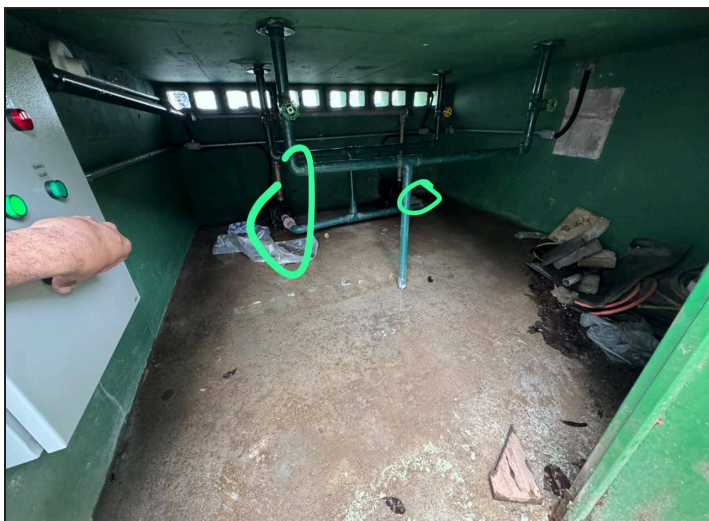

01/10/2026

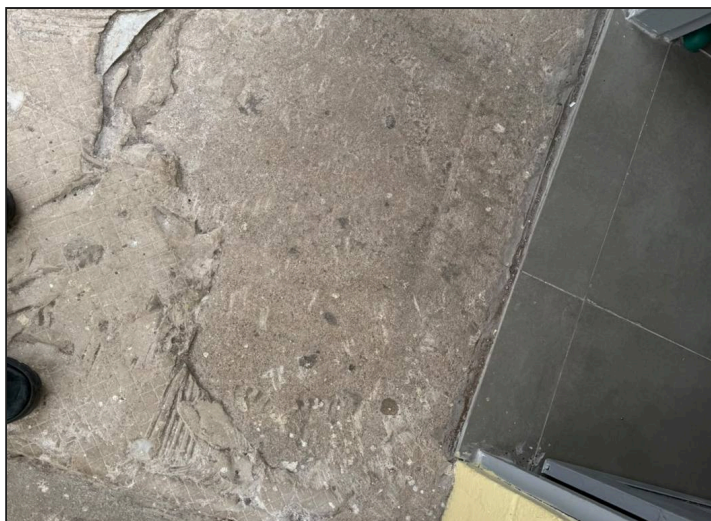


01/10/2026

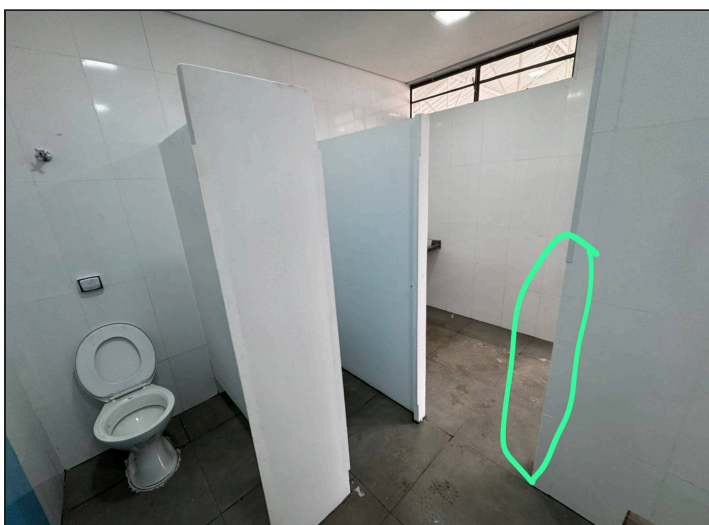

01/10/2026



01/10/2026

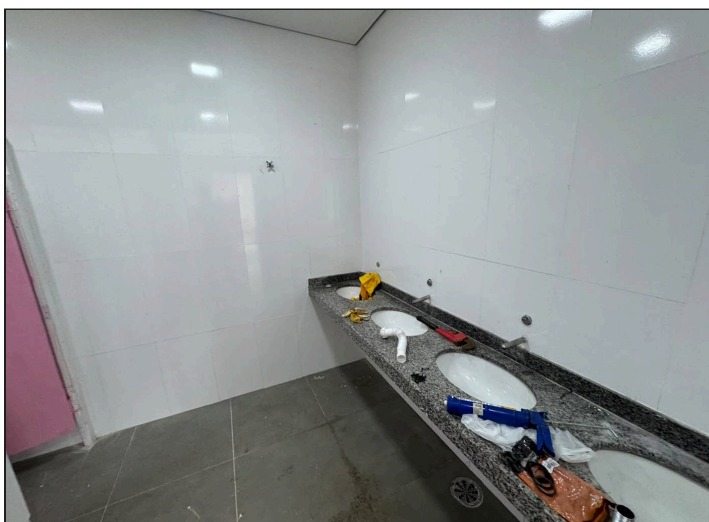

01/10/2026



01/10/2026



01/10/2026



01/10/2026



01/10/2026



01/10/2026



01/10/2026

LEONARDO Eng. responsável — contratada	ARAUJO Empreiteiro	RODRIGO Fiscal / FDE
---	-----------------------	-------------------------
