

ATA FDE CONTRATO ATA.FDE 41.268	RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA Modelo conforme o Livro de Ocorrências da FDE · documento de acompanhamento da contratada	Nº 1
		Data: 30/09/2026
		Visita: 11:35
		Preenchido por: Eng. Douglas
OBRA / UNIDADE DE ENSINO EE INSTITUTO IMACULADA		CÓDIGO DO PRÉDIO 116302
LOCAL ITAPECERICA DA SERRA		PI (PORTAL) 2026/01340
ORDEM DE SERVIÇO —		CONTRATO FDE 70/00588/26-001-001
EMPREITEIRO RONALDO BRITTES		ENG. RESPONSÁVEL / FISCAL FDE Douglas / FABIO

ITENS VERIFICADOS NA VISITA

1. Mão-de-obra / Número de funcionários Qtd. (2)	☒ Suficiente ☐ Insuficiente
2. Material em canteiro	☒ Suficiente ☐ Insuficiente
3. Equipamentos	☒ Suficiente ☐ Insuficiente
4. Tempo	☒ Seco ☐ Chuva
5. Falhas construtivas a serem corrigidas	☐ Sim ☒ Não
6. Placa de obra instalada	☐ Sim ☒ Não
7. Andamento dos serviços () % atual aprovado 58,1% · fiscal FDE 40% (LO 30/09/2026)	☐ Não iniciada ☒ Em execução ☐ Obra paralisada ☐ Obra concluída ☐ Em rescisão
8. Ritmo da obra	☐ Normal ☒ Lento ☐ Parado
9. Previsão de término	28/10/2026

PONTOS DE ATENÇÃO

- ATENÇÃO Placa de obra não instalada
- ATENÇÃO Ritmo da obra: lento
- ATENÇÃO Efetivo baixo: 2 funcionário(s) na visita
- ALTO 40% executado com 79% do prazo decorrido (desvio -39 p.p.)

AVANÇO DA OBRA

Indicador	%	Referência
Aprovado pela FDE (medições aprovadas)	58,1%	M001 a M003 aprovadas · M004 em análise fiscal
Execução apontada pelo engenheiro	—	não informado na visita
Fiscal da FDE — último livro de ocorrências	40%	LO nº 12 de 30/09/2026

SERVIÇOS EXECUTADOS

- Instalação do caixilhos
- Remoções caixilhos lado corredor
- Pintura laboratório

MATERIAIS — PEDIDOS E ENTREGAS (SIENGE)

27 pedidos no Sienge · 27 entregues · 0 com item pendente, somando **R\$ 0,00** a receber.

Nada pendente no período.

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES
Recomendações à contratada - Finalizar instalação dos caixilhos Pendências em aberto - Quadra, material forro

REGISTRO FOTOGRÁFICO



30/09/2026



30/09/2026



30/09/2026



30/09/2026



30/09/2026




30/09/2026



30/09/2026



30/09/2026

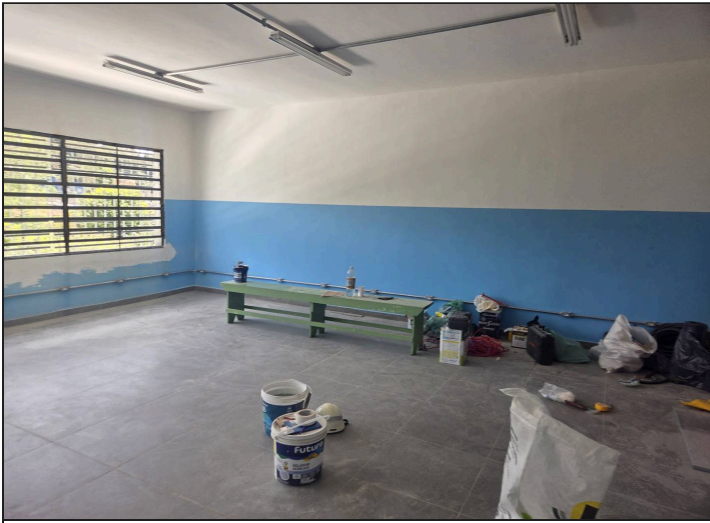

30/09/2026



30/09/2026

Douglas Eng. responsável — contratada	RONALDO BRITTES Empreiteiro	FABIO Fiscal / FDE
---	---	--
