

ATA FDE CONTRATO ATA.FDE 42.218	RELATÓRIO SEMANAL DE ACOMPANHAMENTO Modelo conforme o Livro de Ocorrências da FDE · documento de acompanhamento da contratada	Semana 41
		05/10/2026 a 09/10/2026
		1 visita(s) registrada(s)
OBRA / UNIDADE DE ENSINO EE CEL ANTONIO PAIVA DE SAMPAIO		CÓDIGO DO PRÉDIO 124138
LOCAL OSASCO		PI (PORTAL) 2026/00426
ORDEM DE SERVIÇO —		CONTRATO FDE 70/00255/26-001-001
EMPREITEIRO RAFAEL		ENG. RESPONSÁVEL / FISCAL FDE Luis / DANILO

RESUMO DA SEMANA

Data	Dia	Efetivo	Tempo	Ritmo	% execução (eng.)
07/10/2026	qua	6	Seco	Normal	85%

1 visita(s) entre 05/10/2026 e 09/10/2026 Execução: **85%**. Previsão de término: .

AVANÇO DA OBRA

Indicador	%	Referência
Aprovado pela FDE (medições aprovadas)	59,8%	M001 a M005 aprovadas · M006 em edição fiscal
Execução apontada pelo engenheiro	85%	visita de 09/10/2026
Fiscal da FDE — último livro de ocorrências	78%	LO nº 14 de 29/09/2026

SERVIÇOS EXECUTADOS NA SEMANA

• Limpeza com jato de água fria piso externo de concreto • Pintura mureta da quadra • Será iniciado montagem de forro na sala

MATERIAIS — SITUAÇÃO DOS PEDIDOS EM 09/10/2026

Situação na data de emissão deste relatório (09/10/2026 às 02:26): pedidos do Sienge (01/01/2025 a 07/10/2026, exportação de 07/10/2026 23:23), marcações de entrega do painel e solicitações sem pedido de compra.

Nenhum pedido mudou de pendente para entregue nesta semana.

8 pedidos no Sienge · 8 entregues · 0 com item pendente, somando **R\$ 0,00** a receber.

Nenhum pedido sem entrega confirmada até 09/10/2026.

Solicitações sem pedido de compra (7) — ≈ **R\$ 20.894,47** estimado pelos pedidos do Sienge

Solicitação	Finalidade	Itens ainda sem pedido	Entrega
28129 06/05/2026	FINALIDADE: PINTURA solicitado há 156 dias	PINCEL 2" — 5 un · R\$ 40,00 Tinta látex Branco 18L — 7 lt · R\$ 2.345,00 Pincel 4" — 5 un · R\$ 75,00 Tinta esmalte azul dos andes base d'água — 20 gl · ≈ R\$ 2.900,00 ROLO DE LÃ ALTA — 3 un · ≈ R\$ 82,17 ROLO DE PAPELÃO — 1 un · ≈ R\$ 192,00 ROLO DE LÃ BAIXA ANTI RESPINGO — 3 un · ≈ R\$ 33,93 ≈ R\$ 5.668,10 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra

Solicitação	Finalidade	Itens ainda sem pedido	Entrega
28284 13/05/2026	FINALIDADE: ELÉTRICA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO *ORÇAMENTO EM ANEXO* solicitado há 149 dias	UNIDUTE RETO 3/4" ALUMIL — 10 un · ≈ R\$ 22,50 Eletroduto Galvanizado 3/4 de 3m. — 10 un · ≈ R\$ 166,00 CURVA 3/4 GALV. — 2 un · R\$ 6,62 ABRACAD. D C/CUNHA 3/4" — 20 pç CONDUL MULTIPLO X ALUM 3/4 — 5 un UNIDUT MULTIPLO ALUM 3/4" — 10 pç · ≈ R\$ 105,30 TAMPAO CLICK 3/4" — 20 pç TAMPA P/CONDUL ALUM 1/2 - 3/4 CEGA — 5 pç · ≈ R\$ 28,95 ≈ R\$ 329,37 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28401 15/05/2026	FINALIDADE: PINTURA ESTRUTURA METÁLICA DA QUADRA solicitado há 147 dias	Tinta esmalte azul França 3,6 l — 8 gl · R\$ 1.080,00 ≈ R\$ 1.080,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28511 20/05/2026	FINALIDADE: PINTURA EXTERNA E INTERNA solicitado há 142 dias	Tinta esmalte azul dos andes base d'água — 16 gl · ≈ R\$ 2.320,00 ≈ R\$ 2.320,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28615 22/05/2026	FINALIDADE: PISO DE CONCRETO *ORÇAMENTO* solicitado há 140 dias	Tela Q-92 — 110 un · R\$ 7.645,00 ≈ R\$ 7.645,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28638 25/05/2026	FINALIDADE: MATERIAL PARA FAZER A ELÉTRICA DA CORONEL PAIVA SALA DE AULA TOCAR RÍGIDO POR CABO FLEX solicitado há 137 dias	Cabo flex 2,5mm² preto — 3 rol · R\$ 717,00 Cabo flex 1,5mm² azul — 3 rol · R\$ 501,00 CABO FLEX 2,5MM² AMARELO — 3 rol · R\$ 525,00 Cabo flex 1,5mm² branco — 3 rol · R\$ 501,00 FITA ISOLANTE 20MTS — 20 rol · R\$ 176,00 cabo flex 2,5mm azul — 2 rolo · R\$ 502,00 CABO FLEX 1,5MM MARROM — 3 rol TERMINAL BOINER 4MM — 5 pct SHAMPOO PASSA FIO GRANDE — 1 un PASSA FIO FIBRA 10M — 1 un ≈ R\$ 2.922,00 estimado ... e mais 1 itens	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28931 08/06/2026	FINALIDADE: PINTURA EXTERNA solicitado há 123 dias	ESMALTE A BASE D'AGUA AZUL FRANÇA 3,6L — 6 gl · ≈ R\$ 930,00 ≈ R\$ 930,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES DA SEMANA

Observações

- Piso da quadra de esporte está sujo de tinta e massa, danificando a pintura atual

Recomendações à contratada

- Cuidado com a pintura do piso da quadra para não ser necessário repintura de alguns trechos
- Necessário uso de Epi e calça/uniforme, funcionário com vestimenta inapropriado

Pendências em aberto

- Execução de forro pendente em banheiro e salas de aula
- Pintura do forro executado pendente em alguns ambientes

REGISTRO FOTOGRÁFICO DA SEMANA



Registro da visita

07/10/2026




Caçamba para remoção de entulho

07/10/2026




Resíduo de massa do forro no portão acesso administrativo

07/10/2026

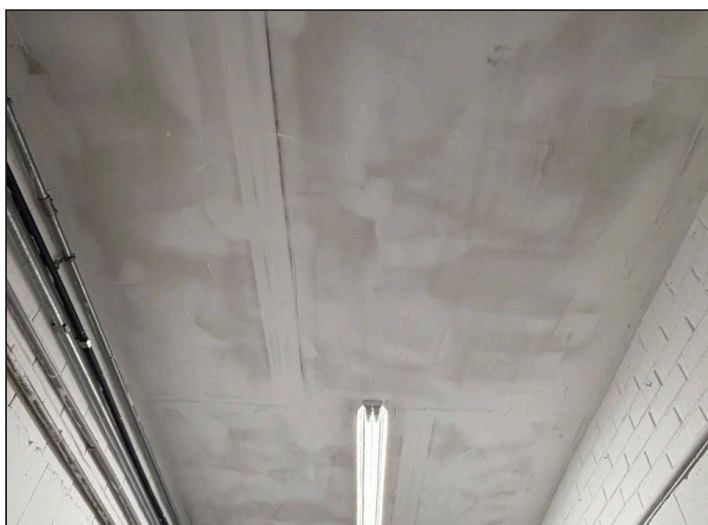


Corredor administrativo - pintura não finalizada

07/10/2026

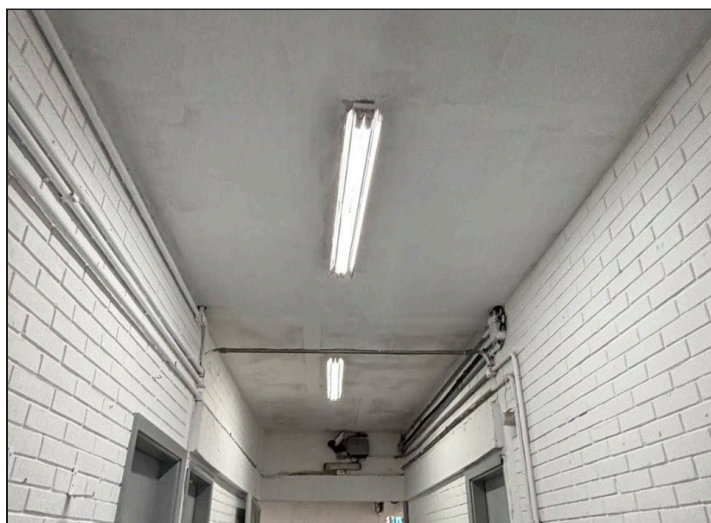


Corredor administrativo - não finalizada pintura

07/10/2026

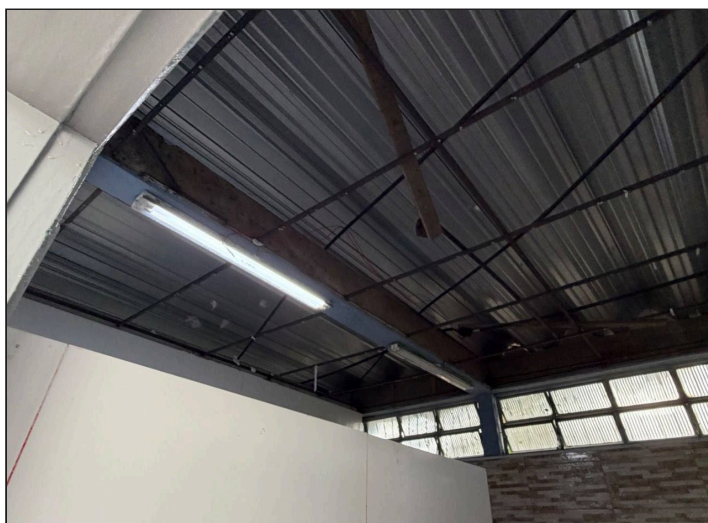

Forro não executado wc alunos masculino

07/10/2026

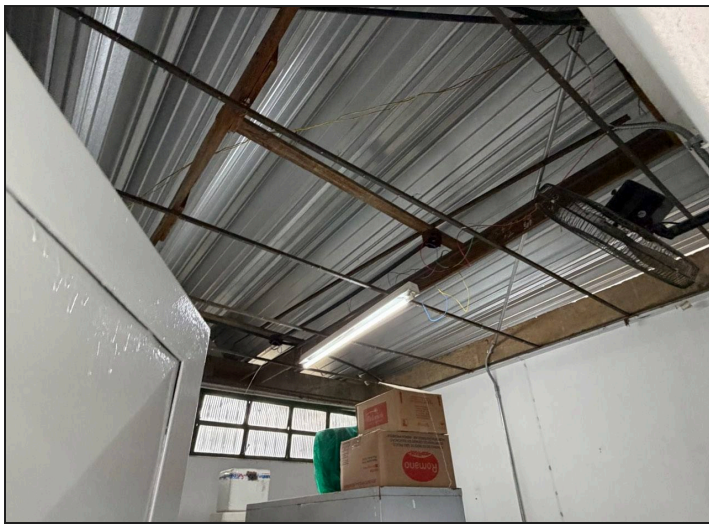


Forro - depósito material

07/10/2026



Forro não executado wc alunos feminino

07/10/2026

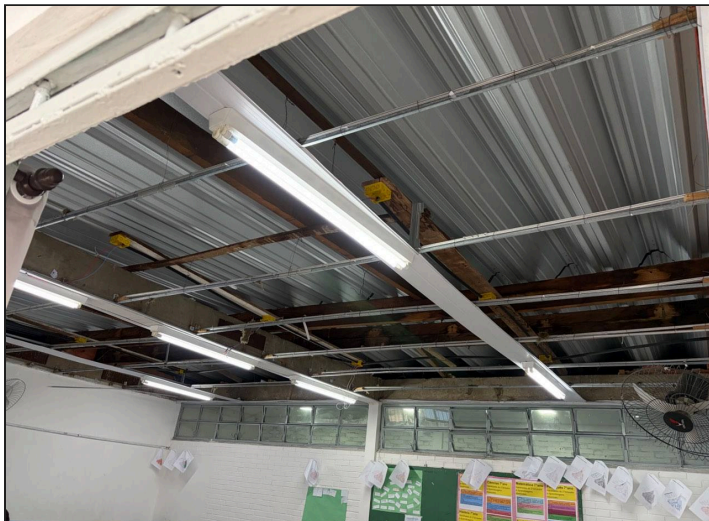

Forro não executado sala de aula

07/10/2026



Extensão fora da norma - apontado pela segurança do trabalho

07/10/2026



Quadra de esportes - pintura mureta

07/10/2026



Piso quadra sujo de tinta e massa

07/10/2026



Piso da quadra sujo

07/10/2026



Limpeza piso externo

07/10/2026



Trabalho em altura

07/10/2026

_____ LUIS JÚNIOR Eng. responsável — contratada	_____ RAFAEL Empreiteiro	_____ DANILO Fiscal / FDE
--	---	--
