

ATA FDE CONTRATO ATA.FDE 42.221	RELATÓRIO SEMANAL DE ACOMPANHAMENTO Modelo conforme o Livro de Ocorrências da FDE · documento de acompanhamento da contratada	Semana 41
		05/10/2026 a 09/10/2026
		1 visita(s) registrada(s)
OBRA / UNIDADE DE ENSINO ETEC PROF ANDRE BOGASIAN		CÓDIGO DO PRÉDIO 124164
LOCAL OSASCO		PI (PORTAL) 2026/00562
ORDEM DE SERVIÇO —		CONTRATO FDE 70/00314/26-001-001
EMPREITEIRO RAFAEL		ENG. RESPONSÁVEL / FISCAL FDE Luis / GUILHERME

RESUMO DA SEMANA

Data	Dia	Efetivo	Tempo	Ritmo	% execução (eng.)
07/10/2026	qua	0	Seco	Parado	75%

1 visita(s) entre 05/10/2026 e 09/10/2026 Execução: 75%. Previsão de término: .

AVANÇO DA OBRA

Indicador	%	Referência
Aprovado pela FDE (medições aprovadas)	83,5%	M001 a M005 aprovadas · M006 em análise fiscal
Execução apontada pelo engenheiro	75%	visita de 09/10/2026
Fiscal da FDE — último livro de ocorrências	83,5%	LO nº 14 de 21/09/2026

SERVIÇOS EXECUTADOS NA SEMANA

Nenhum serviço em execução
--

MATERIAIS — SITUAÇÃO DOS PEDIDOS EM 09/10/2026

Situação na data de emissão deste relatório (09/10/2026 às 02:26): pedidos do Sienge (01/01/2025 a 07/10/2026, exportação de 07/10/2026 23:23), marcações de entrega do painel e solicitações sem pedido de compra.

Nenhum pedido mudou de pendente para entregue nesta semana.

6 pedidos no Sienge · 6 entregues · 0 com item pendente, somando R\$ 0,00 a receber.

Nenhum pedido sem entrega confirmada até 09/10/2026.

Solicitações sem pedido de compra (5) — ≈ R\$ 9.611,52 estimado pelos pedidos do Sienge

Solicitação	Finalidade	Itens ainda sem pedido	Entrega
28467 19/05/2026	FINALIDADE: ADEQUAÇÃO SALA DE AULA E QUADROS solicitado há 143 dias	Cabo flex 2,5mm² preto — 1 rol · R\$ 239,00 Caixinha 4x4 — 10 un CABO FLEX 2,5MM AZUL — 2 rol · R\$ 410,40 CABO FLEX 35MM PRETO — 20 m · R\$ 634,20 Eletroduto Galvanizado 3/4 — 20 un · R\$ 332,00 Curva 90° PVC 3/4 — 15 un · ≈ R\$ 34,80 CABO 16MM 1KV PRETO — 20 m · R\$ 390,00 Cabo flex 4mm² azul — 1 rol · R\$ 510,00 TOMADA 20A BRANCA — 10 un · R\$ 46,90 TOMADA DE 20A VERMELHAS — 10 un · R\$ 53,90 ≈ R\$ 4.169,40 estimado ... e mais 20 itens	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra

Solicitação	Finalidade	Itens ainda sem pedido	Entrega
28805 01/06/2026	FINALIDADE: REVESTIMENTO DE PISO solicitado há 130 dias	ARGAMASSA ACII — 100 sc · R\$ 2.298,00 ≈ R\$ 2.298,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28882 05/06/2026	FINALIDADE: REMOÇÃO DE ENTULHO solicitado há 126 dias	CAÇAMBA METÁLICA — 1 un · R\$ 550,00 ≈ R\$ 550,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28929 08/06/2026	FINALIDADE: COBERTURA PRÉDIO E PINTURA TETO solicitado há 123 dias	Tinta látex Branco 18L — 4 lt · R\$ 1.340,00 ≈ R\$ 1.340,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28933 08/06/2026	FINALIDADE: PINTURA EXTERNA solicitado há 123 dias	TINTA COR CONCRETO 18L — 4 lt · ≈ R\$ 1.254,12 ≈ R\$ 1.254,12 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES DA SEMANA

Pendências em aberto • Troca de telhas bloco administrativo • Revisão telhado refeitório • Revisão telhado sala de aula (sala 9 e 10 com infiltrações) • Pendente trocas de soleiras • Iluminação estacionamento pendente
--

REGISTRO FOTOGRÁFICO DA SEMANA



Andaime armazenados no estacionamento

07/10/2026




Infiltração secretaria

07/10/2026



Infiltração almoxarifado

07/10/2026

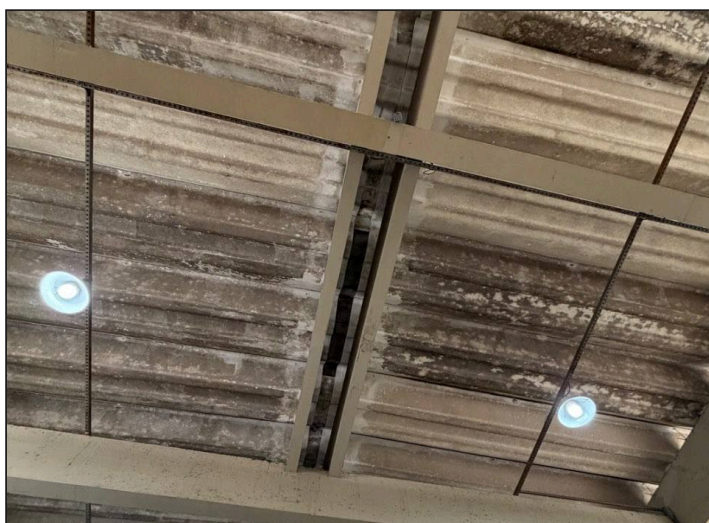


Infiltração refeitório

07/10/2026




Furo no piso para puxador portão- pendente

07/10/2026

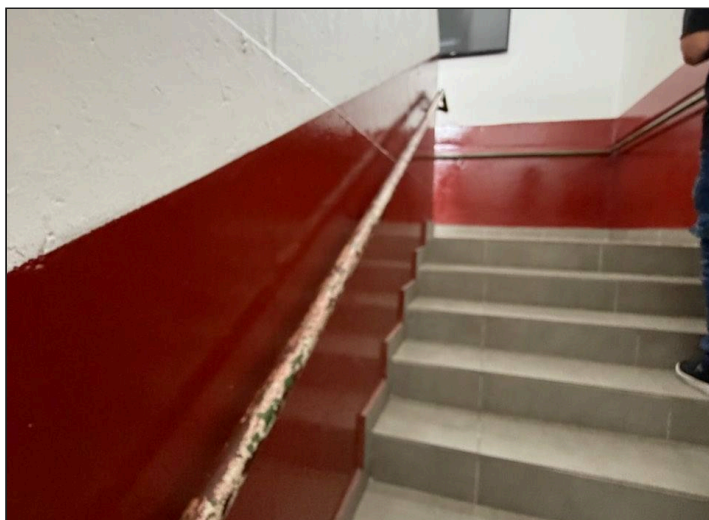


Pintura do corrimão não executada

07/10/2026

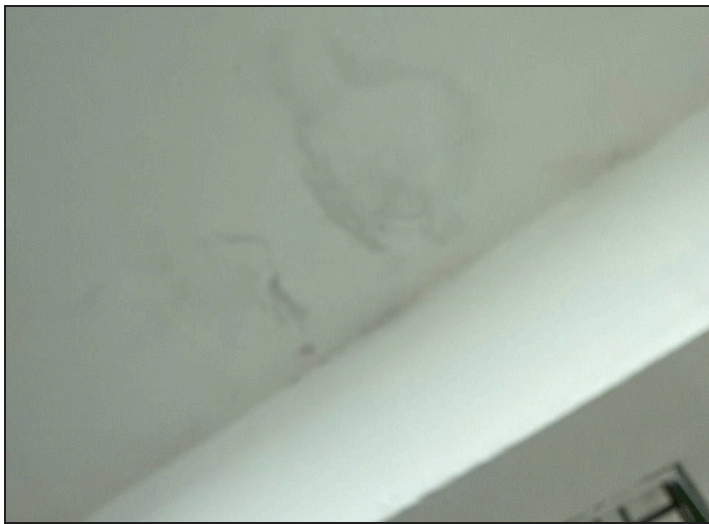

Infiltração sala 09

07/10/2026

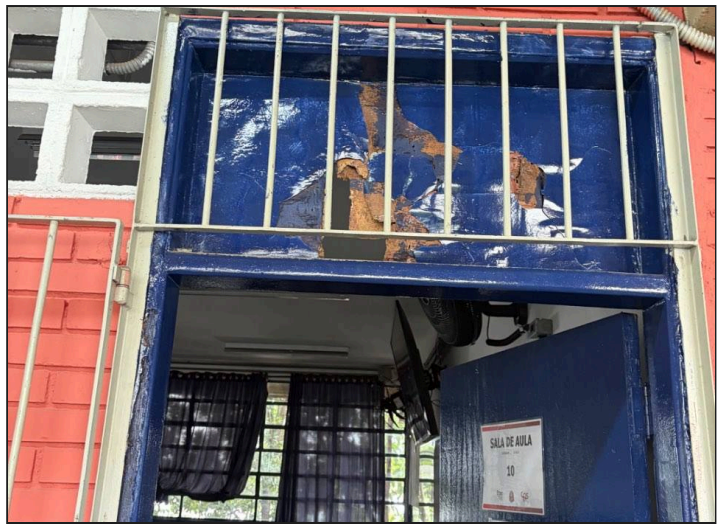


Troca bandeira da porta pendente

07/10/2026




Buraco sala de aula 01

07/10/2026

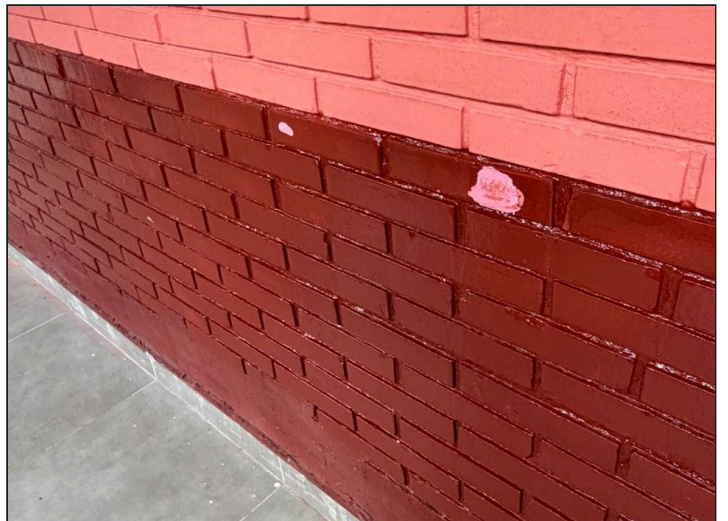

Pintura com bolha

07/10/2026

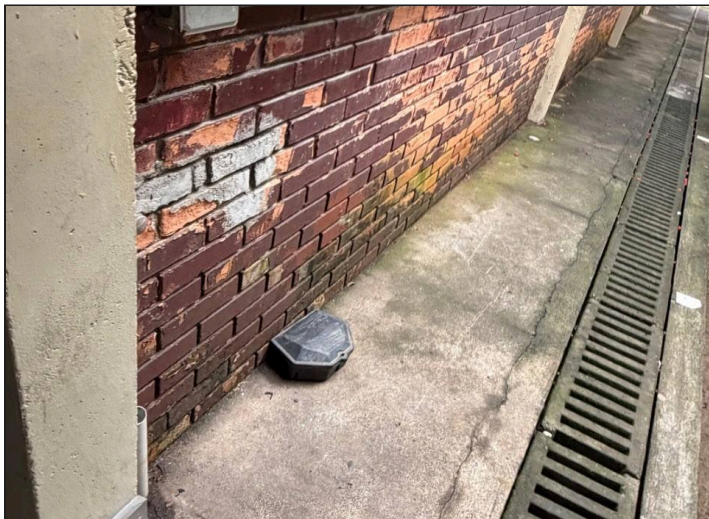

Pintura externa aguardando fiscalizacao

07/10/2026



Soleira auditório não trocada

07/10/2026



Soleira banheiro e salas próximo auditório não trocada 07/10/2026



Infiltração sala arquivo 07/10/2026



Soleira não trocada 07/10/2026

_____ LUIS JÚNIOR Eng. responsável — contratada	_____ RAFAEL Empreiteiro	_____ GUILHERME Fiscal / FDE
--	---	---
