

ATA FDE CONTRATO ATA.FDE 42.223	RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA Modelo conforme o Livro de Ocorrências da FDE · documento de acompanhamento da contratada	Nº 2
		Data: 07/10/2026
		Visita: 08:32
		Preenchido por: Eng. Leonardo
OBRA / UNIDADE DE ENSINO ETEC Antonio furlan		CÓDIGO DO PRÉDIO 1200388
LOCAL BARUERI		PI (PORTAL) 2026/00563
ORDEM DE SERVIÇO —		CONTRATO FDE 70/00315/26-001-001
EMPREITEIRO REINALDO		ENG. RESPONSÁVEL / FISCAL FDE LEONARDO / RODRIGO

ITENS VERIFICADOS NA VISITA	
1. Mão-de-obra / Número de funcionários Qtd. (4)	☒ Suficiente ☐ Insuficiente
2. Material em canteiro	☒ Suficiente ☐ Insuficiente
3. Equipamentos	☒ Suficiente ☐ Insuficiente
4. Tempo	☒ Seco ☐ Chuva
5. Falhas construtivas a serem corrigidas	☐ Sim ☒ Não
6. Placa de obra instalada	☐ Sim ☐ Não ☒ N/A
7. Andamento dos serviços (76) % atual aprovado 21,4% · fiscal FDE 57% (LO 30/09/2026)	☐ Não iniciada ☒ Em execução ☐ Obra paralisada ☐ Obra concluída ☐ Em rescisão
8. Ritmo da obra	☒ Normal ☐ Lento ☐ Parado
9. Organização e limpeza da obra	☒ Boa ☐ Regular ☐ Ruim
10. Previsão de término	14/10/2026

AVANÇO DA OBRA		
Indicador	%	Referência
Aprovado pela FDE (medições aprovadas)	21,4%	M001 a M004 aprovadas · M005 em aprovação gerente
Execução apontada pelo engenheiro	76%	visita de 07/10/2026
Fiscal da FDE — último livro de ocorrências	57%	LO nº 15 de 30/09/2026

SERVIÇOS EXECUTADOS
- INSTALAÇÃO DE PORTAS NOS BANHEIROS - EXECUÇÃO DE PINTURA

MATERIAIS — PEDIDOS SEM ENTREGA ATÉ 07/10/2026

21 pedidos no Sienge · 16 entregues · 5 com item pendente, somando R\$ 31.142,71 a receber.

5 pedido(s) sem entrega confirmada até 07/10/2026 — todos listados abaixo, do mais antigo para o mais novo.

Pedido	Fornecedor	Itens	Valor	Entrega
50902 26/05/2026	SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA pedido há 136 dias	6362 - Cabo flex 4mm² preto — 2 rol (pend. 2) 40536 - TOMADA 10A COMPLETA — 6 un (pend. 6) 6800 - Cabo flex 6mm² preto — 2 rol (pend. 2) 6364 - Cabo flex 2,5mm² preto — 3 rol (pend. 3) 17829 - cabo flex 2,5mm azul — 2 rolo (pend. 2) 40534 - TOMADA INDUSTRIAL — 1 un (pend. 1) 40535 - TOMADA 20A COMPLETA — 15 un (pend. 15)	R\$ 3.706,53	PARCIAL marcado por Eng. Leonardo · 08/10/2026 14:28
54494 10/08/2026	LEANDRO GONZALEZ ELETRICA pedido há 60 dias	16565 - TOMADA 10A — 24 un (pend. 24) 16569 - TOMADA 20A BRANCA — 10 un (pend. 10) 20444 - TOMADA DE 20A VERMELHAS — 10 un (pend. 10) 22367 - LUMINÁRIA IL-45 - COM LÂMPADA LED — 42 un (pend. 42)	R\$ 3.993,38	PARCIAL marcado por Eng. Leonardo · 08/10/2026 14:28
55427 26/08/2026	AEROTINTAS COMERCIAL LTDA pedido há 44 dias	43583 - TINTA ESMALTE AZUL TURQUESA BASE SOLVENTE — 4 lt (pend. 4) 19381 - Esmalte Brilhante Branco Coralit 3,6l — 20 gl (pend. 20) 19176 - TINTA ESMALTE BRANCO FOSCO 3,6L — 3 gl (pend. 3) 11105 - TINTA LATEX AZUL SERENO 18l — 1 lt (pend. 1) 10575 - Tinta esmalte cinza médio 3,6 LT — 20 gl (pend. 20) 6104 - Aguarrás 5l — 1 gl (pend. 1) 43585 - TINTA ACRÍLICA CINZA ALPINO — 2 lt (pend. 2) 18341 - Tinta esmalte 3,6l Laranja — 4 gl (pend. 4)	R\$ 7.538,80	PARCIAL marcado por Eng. Leonardo · 08/10/2026 14:28
57169 30/09/2026	ATACADAO DAS MADEIRAS LTDA pedido há 9 dias	44513 - PORTA DE BANHEIRO - 1,54 M X 55 CM, COM FECHADURA INDICADORA — 36 un (pend. 36)	R\$ 14.760,00	PARCIAL marcado por Eng. Leonardo · 08/10/2026 14:28
57422 05/10/2026	EVERSON CARLOS NOGUEIRA DE SOUZA 34422490826 pedido há 4 dias	13002 - CANTONEIRA 3/4 X 1/8 — 5 br 11301 - METALON 30X30 — 12 un 18616 - DISCO CORTE 4.1/2"-AÇO — 10 un	R\$ 1.144,00	PENDENTE marcado por Eng. Leonardo · 08/10/2026 14:28

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES

Recomendações à contratada

- APÓS A REGULARIZAÇÃO DAS PENDÊNCIAS, REALIZAR REGISTRO FOTOGRÁFICO E ENVIAR AS FOTOS NO GRUPO

Pendências em aberto

- 01 - INSTALAÇÃO DE 03 PORTAS DE FERRO NA COZINHA, CONFORME ALINHADO COM O FISCAL RODRIGO
- 02 - INSTALAÇÃO DE TELA MOSQUITEIRA DE ALUMÍNIO NAS JANELAS DA COZINHA
- 03 - RETIRADA URGENTE DO ENTULHO DA ÁREA DA FRENTE DA UNIDADE
- 04 - FINALIZAR A INSTALAÇÃO DAS PORTAS DOS BANHEIROS PARA LIBERAÇÃO DA UNIDADE PARA O 2º TURNO DAS ELEIÇÕES

REGISTRO FOTOGRÁFICO




PENDÊNCIA 04

09/10/2026




Registro da visita

09/10/2026

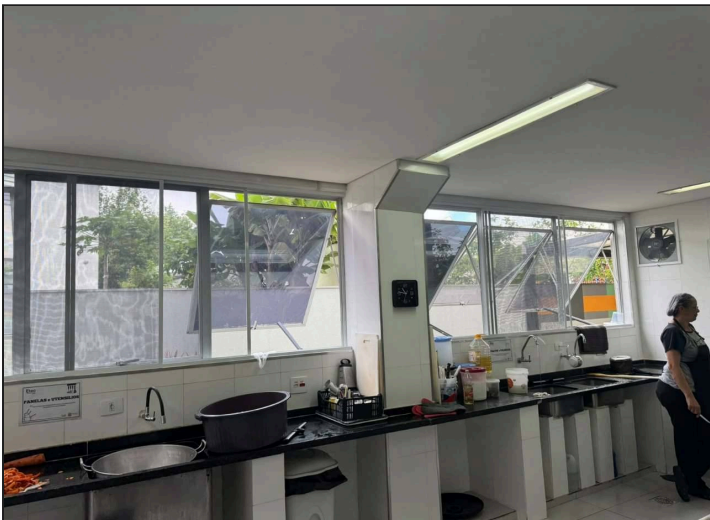

Registro da visita

09/10/2026

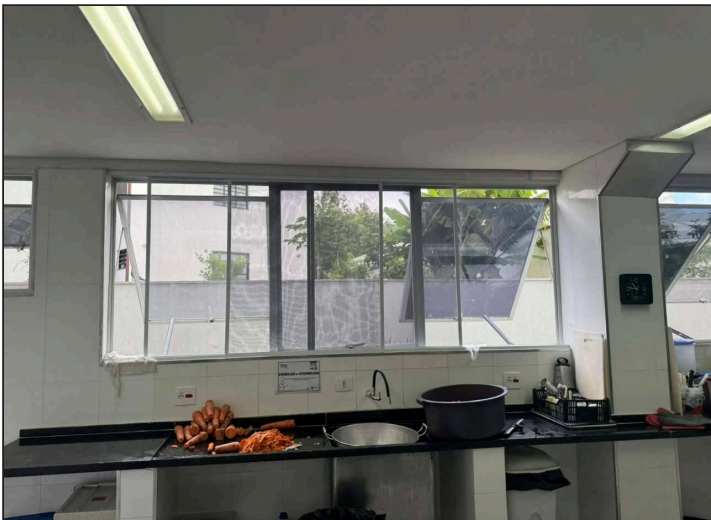


Registro da visita

09/10/2026



Registro da visita

09/10/2026

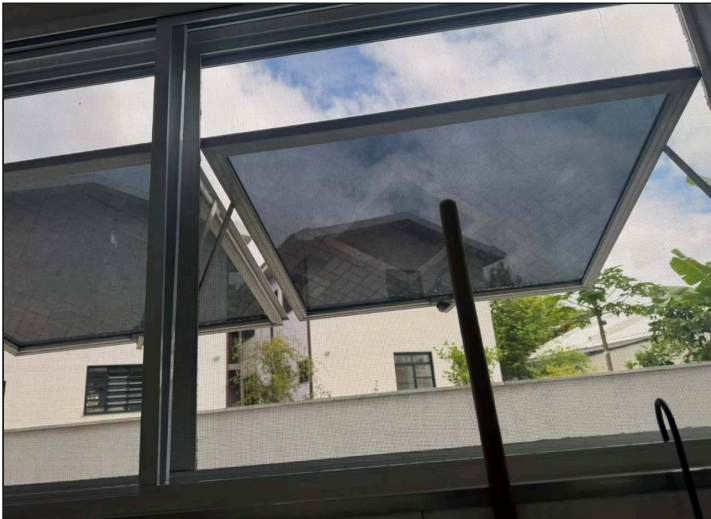

Registro da visita

09/10/2026




Registro da visita

09/10/2026




Registro da visita

09/10/2026

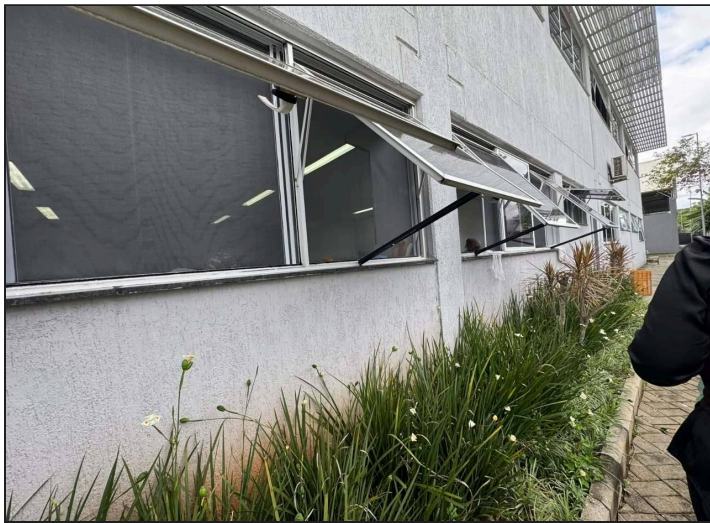


Registro da visita

09/10/2026

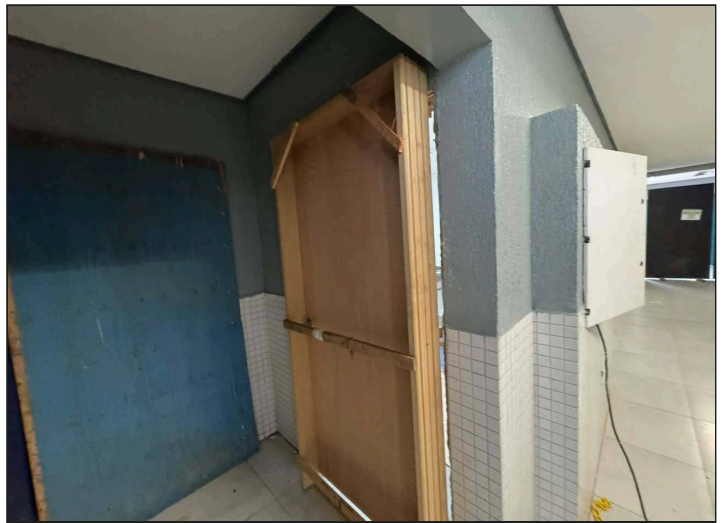

PENDÊNCIA 04

09/10/2026

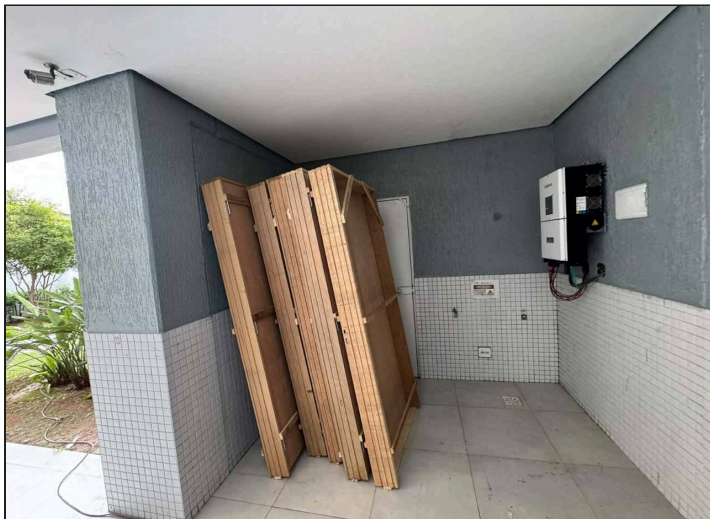

PENDÊNCIA 04

09/10/2026




Registro da visita

09/10/2026



Registro da visita 09/10/2026

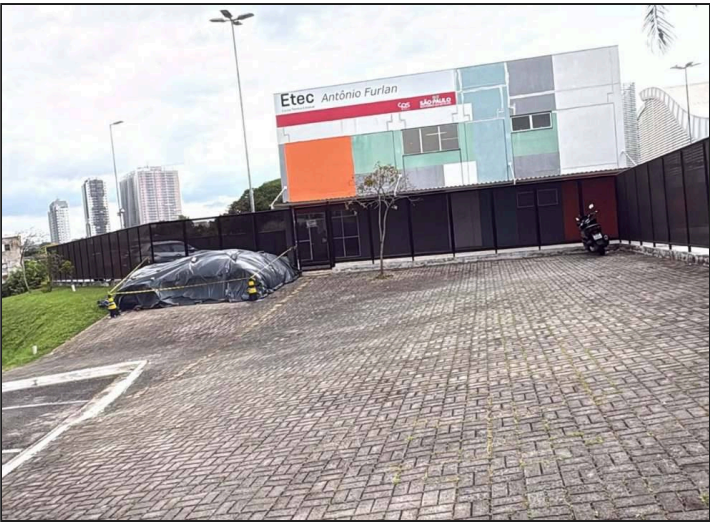

PENDÊNCIA 03 09/10/2026

LEONARDO Eng. responsável — contratada	REINALDO Empreiteiro	RODRIGO Fiscal / FDE
---	-------------------------	-------------------------
