

ATA FDE CONTRATO ATA.FDE 42.223	RELATÓRIO SEMANAL DE ACOMPANHAMENTO Modelo conforme o Livro de Ocorrências da FDE · documento de acompanhamento da contratada	Semana 41
		05/10/2026 a 09/10/2026
		1 visita(s) registrada(s)
OBRA / UNIDADE DE ENSINO ETEC Antonio furlan		CÓDIGO DO PRÉDIO 1200388
LOCAL BARUERI		PI (PORTAL) 2026/00563
ORDEM DE SERVIÇO —		CONTRATO FDE 70/00315/26-001-001
EMPREITEIRO REINALDO		ENG. RESPONSÁVEL / FISCAL FDE LEONARDO / RODRIGO

RESUMO DA SEMANA

Data	Dia	Efetivo	Tempo	Ritmo	% execução (eng.)
07/10/2026	qua	4	Seco	Normal	76%

1 visita(s) entre 05/10/2026 e 09/10/2026 Execução: 76%. Previsão de término: 14/10/2026.

AVANÇO DA OBRA

Indicador	%	Referência
Aprovado pela FDE (medições aprovadas)	21,4%	M001 a M004 aprovadas · M005 em aprovação gerente
Execução apontada pelo engenheiro	76%	visita de 09/10/2026
Fiscal da FDE — último livro de ocorrências	57%	LO nº 15 de 30/09/2026

SERVIÇOS EXECUTADOS NA SEMANA

- INSTALAÇÃO DE PORTAS NOS BANHEIROS - EXECUÇÃO DE PINTURA
--

MATERIAIS — SITUAÇÃO DOS PEDIDOS EM 09/10/2026

Situação na data de emissão deste relatório (09/10/2026 às 02:26): pedidos do Sienge (01/01/2025 a 07/10/2026, exportação de 07/10/2026 23:23), marcações de entrega do painel e solicitações sem pedido de compra.

Nenhum pedido mudou de pendente para entregue nesta semana.

21 pedidos no Sienge · 16 entregues · 5 com item pendente, somando R\$ 31.142,71 a receber.

5 pedido(s) sem entrega confirmada até 09/10/2026 — todos listados abaixo, do mais antigo para o mais novo.

Pedido	Fornecedor	Itens	Valor	Entrega
50902 26/05/2026	SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA pedido há 136 dias	6362 - Cabo flex 4mm² preto — 2 rol (pend. 2) 40536 - TOMADA 10A COMPLETA — 6 un (pend. 6) 6800 - Cabo flex 6mm² preto — 2 rol (pend. 2) 6364 - Cabo flex 2,5mm² preto — 3 rol (pend. 3) 17829 - cabo flex 2,5mm azul — 2 rolo (pend. 2) 40534 - TOMADA INDUSTRIAL — 1 un (pend. 1) 40535 - TOMADA 20A COMPLETA — 15 un (pend. 15)	R\$ 3.706,53	PARCIAL marcado por Eng. Leonardo · 08/10/2026 14:28
54494 10/08/2026	LEANDRO GONZALEZ ELETRICA pedido há 60 dias	16565 - TOMADA 10A — 24 un (pend. 24) 16569 - TOMADA 20A BRANCA — 10 un (pend. 10) 20444 - TOMADA DE 20A VERMELHAS — 10 un (pend. 10) 22367 - LUMINÁRIA IL-45 - COM LÂMPADA LED — 42 un (pend. 42)	R\$ 3.993,38	PARCIAL marcado por Eng. Leonardo · 08/10/2026 14:28

Pedido	Fornecedor	Itens	Valor	Entrega
55427 26/08/2026	AEROTINTAS COMERCIAL LTDA pedido há 44 dias	43583 - TINTA ESMALTE AZUL TURQUESA BASE SOLVENTE — 4 lt (pend. 4) 19381 - Esmalte Brilhante Branco Coralit 3,6l — 20 gl (pend. 20) 19176 - TINTA ESMALTE BRANCO FOSCO 3,6L — 3 gl (pend. 3) 11105 - TINTA LATEX AZUL SERENO 18l — 1 lt (pend. 1) 10575 - Tinta esmalte cinza médio 3,6 LT — 20 gl (pend. 20) 6104 - Aguarrás 5l — 1 gl (pend. 1) 43585 - TINTA ACRÍLICA CINZA ALPINO — 2 lt (pend. 2) 18341 - Tinta esmalte 3,6l Laranja — 4 gl (pend. 4)	R\$ 7.538,80	PARCIAL marcado por Eng. Leonardo · 08/10/2026 14:28
57169 30/09/2026	ATACADAO DAS MADEIRAS LTDA pedido há 9 dias	44513 - PORTA DE BANHEIRO - 1,54 M X 55 CM, COM FECHADURA INDICADORA — 36 un (pend. 36)	R\$ 14.760,00	PARCIAL marcado por Eng. Leonardo · 08/10/2026 14:28
57422 05/10/2026	EVERSON CARLOS NOGUEIRA DE SOUZA 34422490826 pedido há 4 dias	13002 - CANTONEIRA 3/4 X 1/8 — 5 br 11301 - METALON 30X30 — 12 un 18616 - DISCO CORTE 4.1/2"-AÇO — 10 un	R\$ 1.144,00	PENDENTE marcado por Eng. Leonardo · 08/10/2026 14:28

Solicitações sem pedido de compra (5) — ≈ R\$ 3.131,17 estimado pelos pedidos do Sienge

Solicitação	Finalidade	Itens ainda sem pedido	Entrega
30747 25/08/2026	FINALIDADE: PINTURA solicitado há 45 dias	TINTA PISO CINZA MÉDIO 18L — 5 lt · R\$ 1.725,00 ≈ R\$ 1.725,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
31080 09/09/2026	FINALIDADE: POÇO DO ELEVADOR solicitado há 30 dias	Bóia elétrica — 2 un BOMBA SUBMERSA SAPO 220V — 2 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
31194 16/09/2026	FINALIDADE: BANHEIROS solicitado há 23 dias	ARGAMASSA AC- II — 15 sc · R\$ 426,45 SOLEIRA 92 X 20CM — 6 un · R\$ 915,72 ESPELHO 40 X 50 CM — 18 un ≈ R\$ 1.342,17 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
31213 16/09/2026	FINALIDADE: PORTAS solicitado há 23 dias	PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA LADO DIREITO 2,10 M X 90 CM BATENTE 16 CM — 6 fl PORTA COM BATENTE DE MADEIRA SARRAFEADA 2,15 M X 97 CM BATENTE DE 20 CM LADO DIREITO — 1 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
31479 25/09/2026	FINALIDADE: DISPENSA solicitado há 14 dias	PU branco — 2 un · R\$ 64,00 CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 3/4 PINTADA DE BRANCO — 15 un ≈ R\$ 64,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES DA SEMANA

Recomendações à contratada

- APÓS A REGULARIZAÇÃO DAS PENDÊNCIAS, REALIZAR REGISTRO FOTOGRÁFICO E ENVIAR AS FOTOS NO GRUPO

Pendências em aberto

- 01 - INSTALAÇÃO DE 03 PORTAS DE FERRO NA COZINHA, CONFORME ALINHADO COM O FISCAL RODRIGO
- 02 - INSTALAÇÃO DE TELA MOSQUITEIRA DE ALUMÍNIO NAS JANELAS DA COZINHA
- 03 - RETIRADA URGENTE DO ENTULHO DA ÁREA DA FRENTE DA UNIDADE
- 04 - FINALIZAR A INSTALAÇÃO DAS PORTAS DOS BANHEIROS PARA LIBERAÇÃO DA UNIDADE PARA O 2º TURNO DAS ELEIÇÕES

REGISTRO FOTOGRÁFICO DA SEMANA




PENDÊNCIA 04

09/10/2026




Registro da visita

09/10/2026

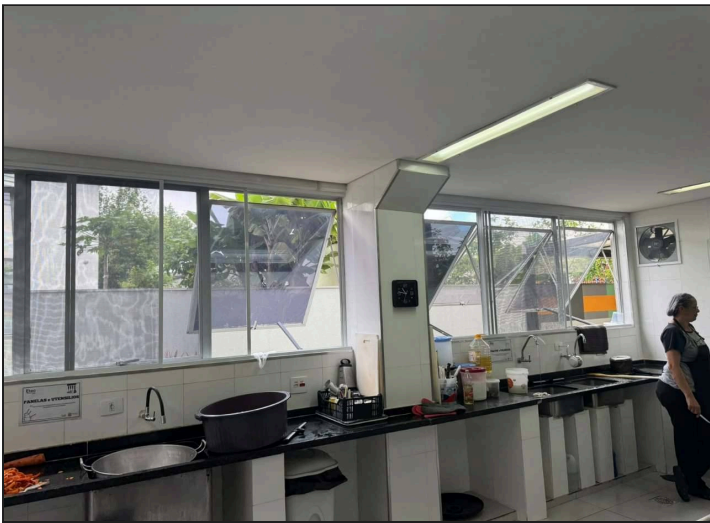

Registro da visita

09/10/2026

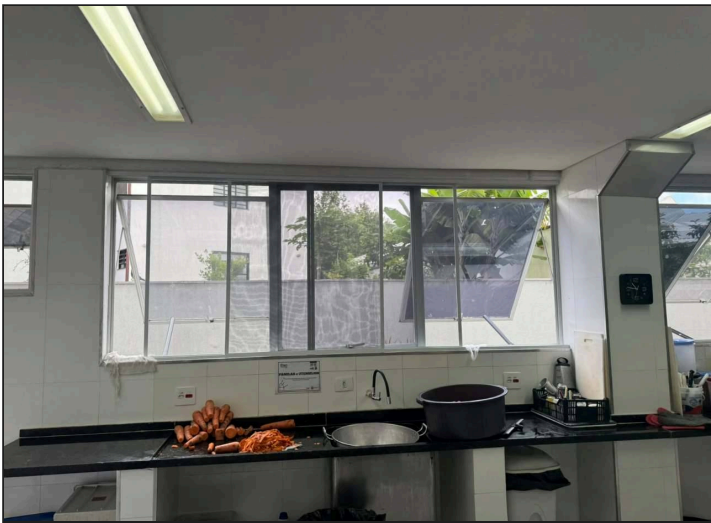


Registro da visita

09/10/2026



Registro da visita

09/10/2026

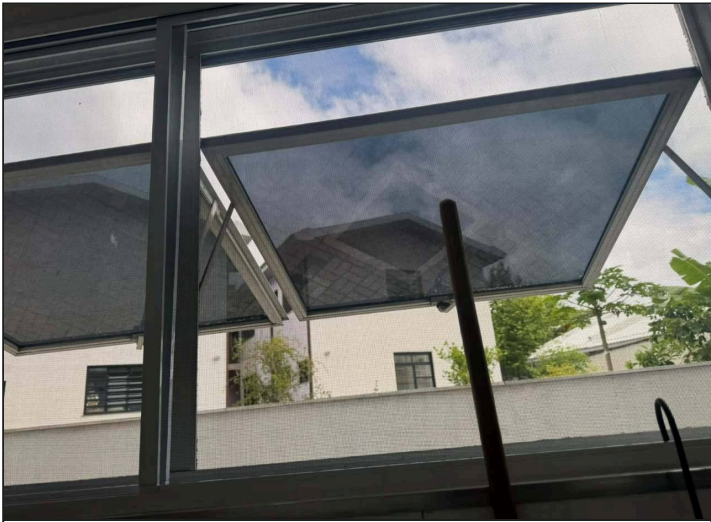

Registro da visita

09/10/2026




Registro da visita

09/10/2026




Registro da visita

09/10/2026

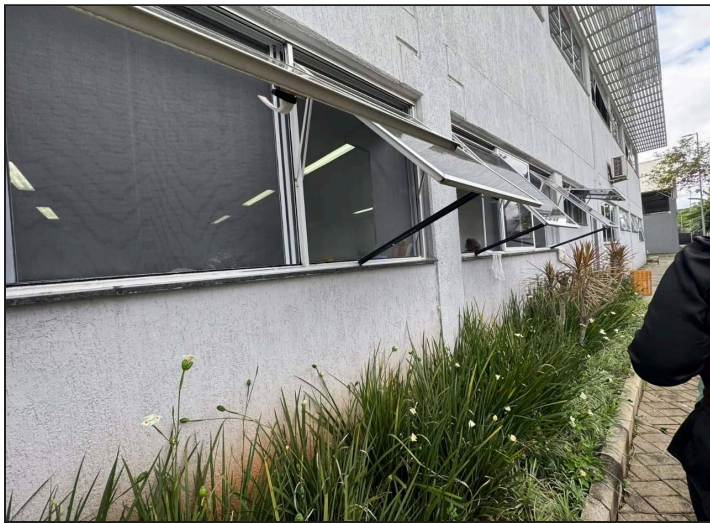


Registro da visita

09/10/2026

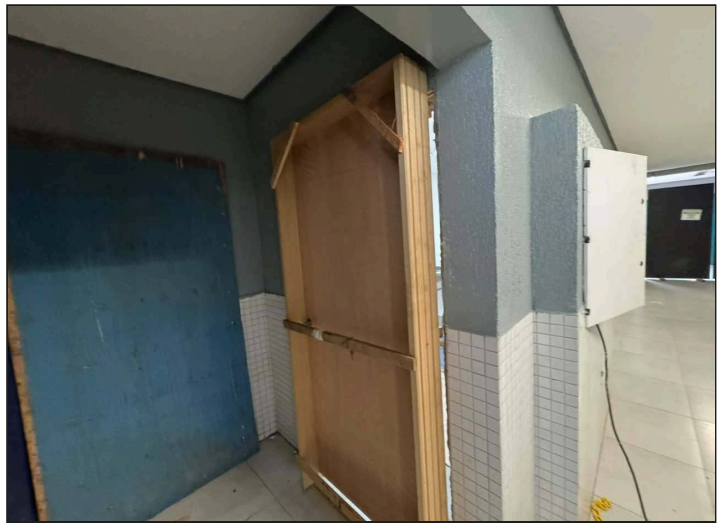

PENDÊNCIA 04

09/10/2026

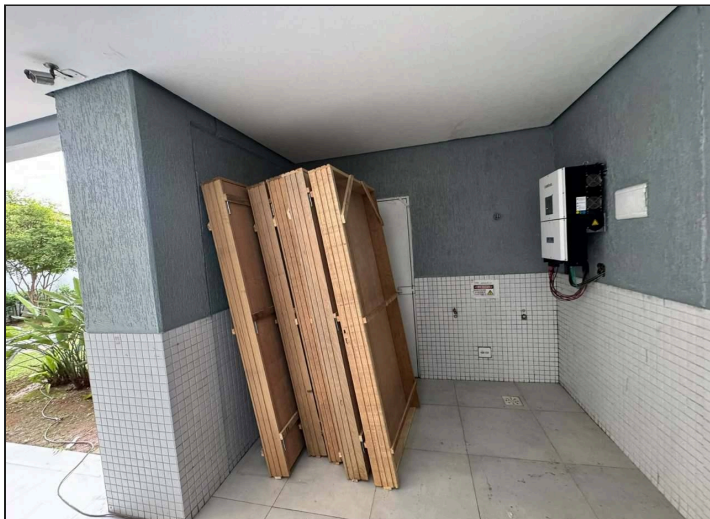

PENDÊNCIA 04

09/10/2026




Registro da visita

09/10/2026



Registro da visita 09/10/2026

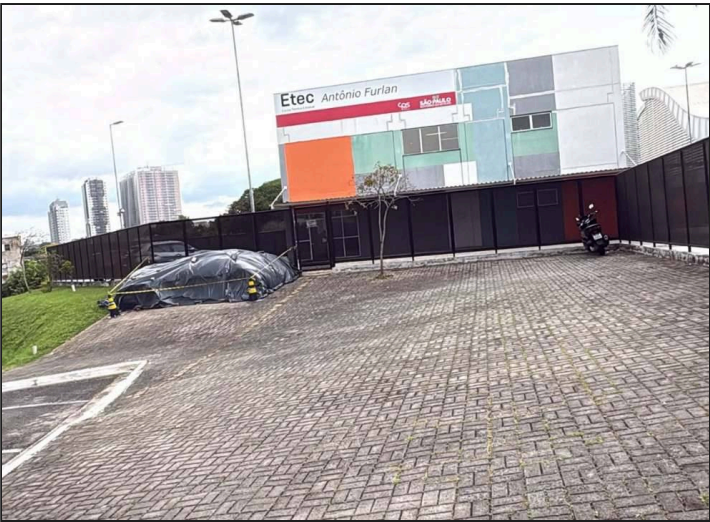

PENDÊNCIA 03 09/10/2026

LEONARDO Eng. responsável — contratada	REINALDO Empreiteiro	RODRIGO Fiscal / FDE
---	-------------------------	-------------------------
