

ATA FDE CONTRATO ATA.FDE 41.235	RELATÓRIO SEMANAL DE ACOMPANHAMENTO Modelo conforme o Livro de Ocorrências da FDE · documento de acompanhamento da contratada	Semana 41
		05/10/2026 a 09/10/2026
		1 visita(s) registrada(s)
OBRA / UNIDADE DE ENSINO EE PROF MARIA CONCEICAO APARECIDA PEREIRA ISMAEL		CÓDIGO DO PRÉDIO 120203
LOCAL JUQUITIBA		PI (PORTAL) 2026/00999
ORDEM DE SERVIÇO —		CONTRATO FDE 70/00360/26-001-001
EMPREITEIRO ANTONIO CABELO		ENG. RESPONSÁVEL / FISCAL FDE Douglas / RENATO

RESUMO DA SEMANA

Data	Dia	Efetivo	Tempo	Ritmo	% execução (eng.)
07/10/2026	qua	0	Seco	Normal	80%

1 visita(s) entre 05/10/2026 e 09/10/2026 Execução: 80%. Previsão de término: .

AVANÇO DA OBRA

Indicador	%	Referência
Aprovado pela FDE (medições aprovadas)	81,9%	M001 a M005 aprovadas
Execução apontada pelo engenheiro	80%	visita de 09/10/2026
Fiscal da FDE — último livro de ocorrências	70%	LO nº 15 de 29/09/2026

SERVIÇOS EXECUTADOS NA SEMANA

Cobertura e pintura

MATERIAIS — SITUAÇÃO DOS PEDIDOS EM 09/10/2026

Situação na data de emissão deste relatório (09/10/2026 às 02:27): pedidos do Sienge (01/01/2025 a 07/10/2026, exportação de 07/10/2026 23:23), marcações de entrega do painel e solicitações sem pedido de compra.

Nenhum pedido mudou de pendente para entregue nesta semana.

31 pedidos no Sienge · 31 entregues · 0 com item pendente, somando R\$ 0,00 a receber.

Nenhum pedido sem entrega confirmada até 09/10/2026.

Solicitações sem pedido de compra (6) — ≈ R\$ 2.718,01 estimado pelos pedidos do Sienge

Solicitação	Finalidade	Itens ainda sem pedido	Entrega
27770 17/04/2026	FINALIDADE: COBERTURA METALICA solicitado há 175 dias	Pu 40 — 20 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
27771 17/04/2026	FINALIDADE: REPARO PNTURA solicitado há 175 dias	Tinta látex Branco 18L — 2 lt · R\$ 670,00 ≈ R\$ 670,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
27933 27/04/2026	FINALIDADE: PREPARAÇÃO DE ESTRUTURA solicitado há 165 dias	Aguarrás 5l — 1 gl · R\$ 150,00 ≈ R\$ 150,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra

Solicitação	Finalidade	Itens ainda sem pedido	Entrega
28588 22/05/2026	FINALIDADE: PINTURA TETO solicitado há 140 dias	Tinta látex Branco 18L — 2 lt · R\$ 670,00 Tinta esmalte Branco — 1 gl · R\$ 191,07 Massa corrida PVA 18 lts — 2 lt · R\$ 136,94 ≈ R\$ 998,01 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
30259 07/08/2026	FINALIDADE: LIMPEZA DE OBRA solicitado há 63 dias	ALUGUEL CAÇAMBA 4M3 — 1 un · R\$ 450,00 ≈ R\$ 450,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
30310 10/08/2026	FINALIDADE: ENTULHO solicitado há 60 dias	ALUGUEL CAÇAMBA 4M3 — 1 un · R\$ 450,00 ≈ R\$ 450,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES DA SEMANA

Observações • Remover telha pendurada em muro • Vazamentos calha e rufo Recomendações à contratada • Finalizwr pintura de muros • Estrutura cobertura, remover da passagem de alunos
--

REGISTRO FOTOGRÁFICO DA SEMANA




Registro da visita

08/10/2026




Registro da visita

08/10/2026

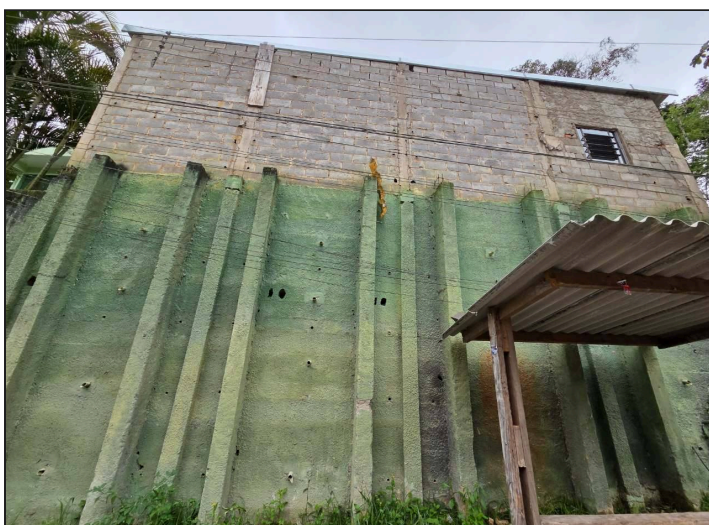


Registro da visita

08/10/2026

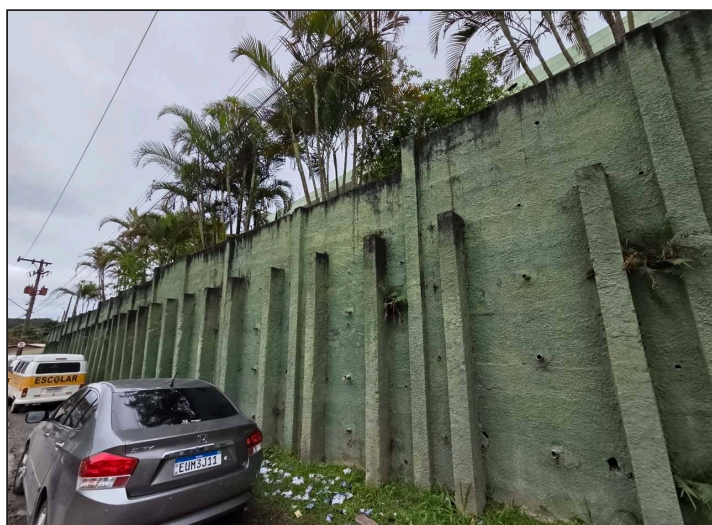

Registro da visita

08/10/2026

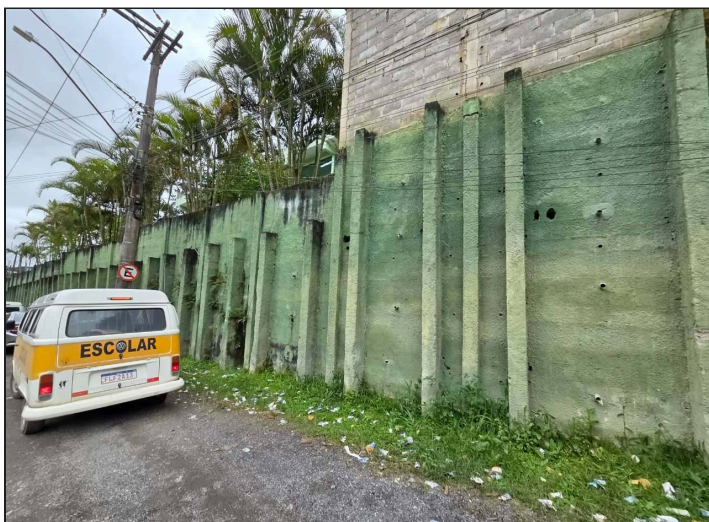


Registro da visita

08/10/2026



Registro da visita

08/10/2026

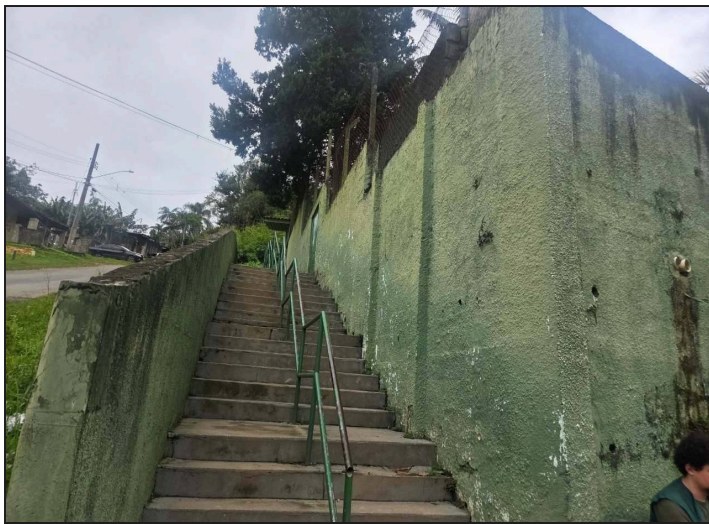


Registro da visita

08/10/2026



Registro da visita

08/10/2026

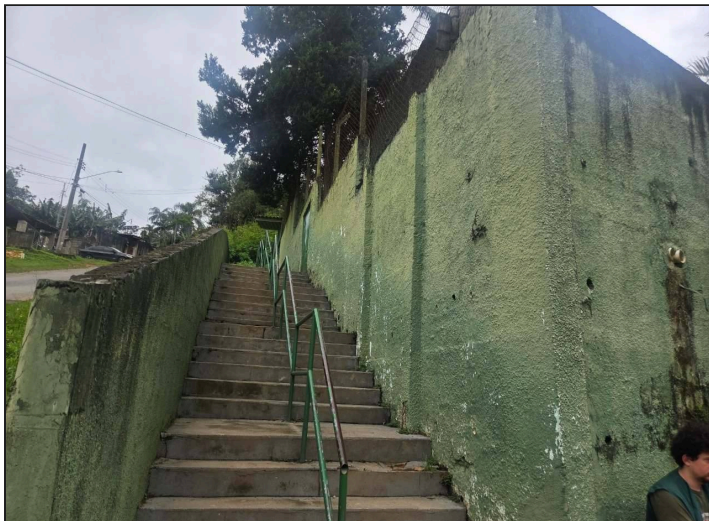

Registro da visita

08/10/2026




Registro da visita

08/10/2026




Registro da visita

08/10/2026

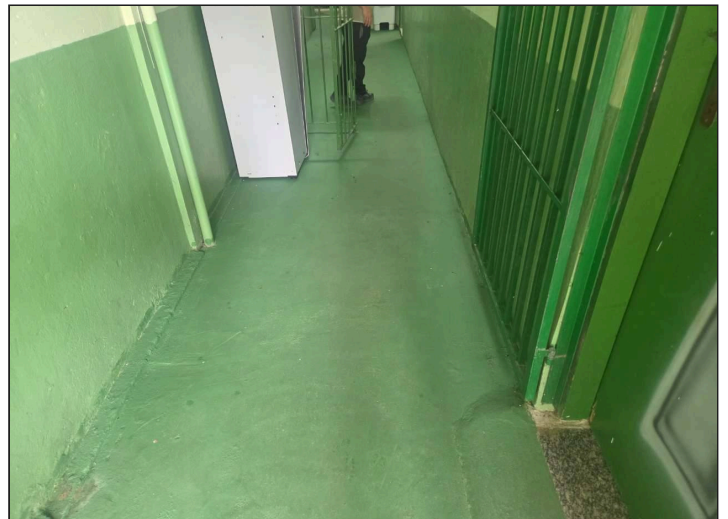

Registro da visita

08/10/2026

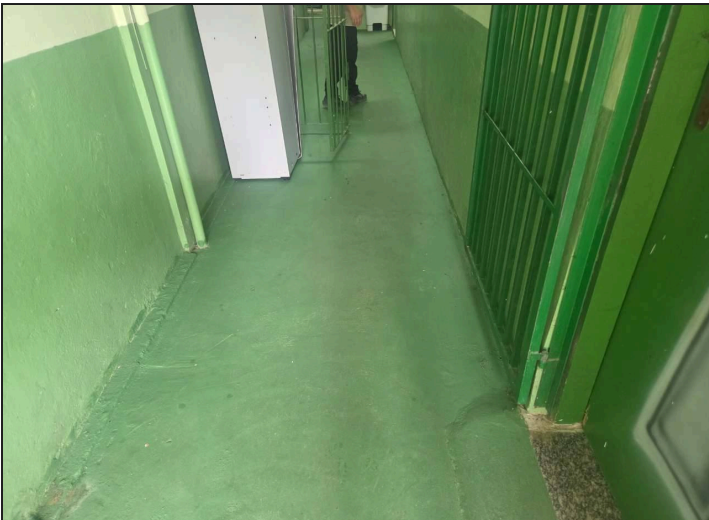


Registro da visita

08/10/2026



Registro da visita

08/10/2026

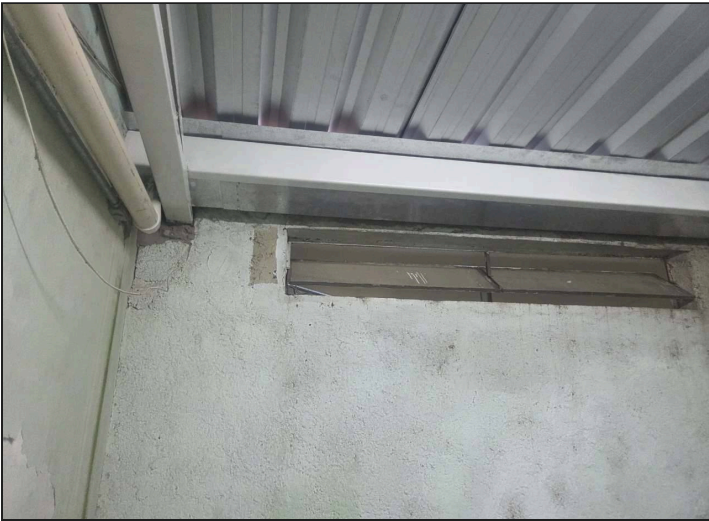

Registro da visita

08/10/2026

DOUGLAS Eng. responsável — contratada	ANTONIO CABELO Empreiteiro	RENATO Fiscal / FDE
---	--	---
