

ATA FDE CONTRATO ATA.FDE 41.287	RELATÓRIO SEMANAL DE ACOMPANHAMENTO Modelo conforme o Livro de Ocorrências da FDE · documento de acompanhamento da contratada	Semana 41
		05/10/2026 a 09/10/2026
		1 visita(s) registrada(s)
OBRA / UNIDADE DE ENSINO EEPROF LAERT ALMEIDA SÃO BERNARDO		CÓDIGO DO PRÉDIO 136207
LOCAL TABOÃO DA SERRA		PI (PORTAL) 2026/01149
ORDEM DE SERVIÇO —		CONTRATO FDE 05/00008/26-001-001
EMPREITEIRO PEDRO		ENG. RESPONSÁVEL / FISCAL FDE Douglas / FABIO

RESUMO DA SEMANA

Data	Dia	Efetivo	Tempo	Ritmo	% execução (eng.)
05/10/2026	seg	6	Seco	Lento	20%

1 visita(s) entre 05/10/2026 e 09/10/2026 Execução: **20%**. Previsão de término: .

AVANÇO DA OBRA

Indicador	%	Referência
Aprovado pela FDE (medições aprovadas)	10,5%	M001 a M002 aprovadas · M003 em edição fiscal
Execução apontada pelo engenheiro	20%	visita de 09/10/2026
Fiscal da FDE — último livro de ocorrências	20%	LO nº 9 de 30/09/2026

SERVIÇOS EXECUTADOS NA SEMANA

- Muro - Sanitário - Elétrica

MATERIAIS — SITUAÇÃO DOS PEDIDOS EM 09/10/2026

Situação na data de emissão deste relatório (09/10/2026 às 02:30): pedidos do Sienge (01/01/2025 a 07/10/2026, exportação de 07/10/2026 23:23), marcações de entrega do painel e solicitações sem pedido de compra.

Entregue durante a semana: pedido 56759 (KPR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA).

35 pedidos no Sienge · 33 entregues · 2 com item pendente, somando **R\$ 2.960,00** a receber.

2 pedido(s) sem entrega confirmada até 09/10/2026 — todos listados abaixo, do mais antigo para o mais novo.

Pedido	Fornecedor	Itens	Valor	Entrega
57637 07/10/2026	REFERENCIA RENTAL SAO PAULO COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA pedido há 2 dias	6065 - Rodízio — 4 un	R\$ 80,00	PENDENTE falta R\$ 80,00
57641 07/10/2026	LIGEIRINHO COLETA E GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA pedido há 2 dias	25765 - CAÇAMBA — 6 un	R\$ 2.880,00	PENDENTE falta R\$ 2.880,00

Solicitações sem pedido de compra (15) — ≈ R\$ 45.897,73 estimado pelos pedidos do Sienge

Solicitação	Finalidade	Itens ainda sem pedido	Entrega
29586 13/07/2026	FINALIDADE: COMPONENTE ESPORTIVO solicitado há 88 dias	QE-02 Poste para rede de voleibol — 1 un · R\$ 1.440,00 QE-03 Trave de futebol de salão — 2 un · R\$ 2.357,00 ≈ R\$ 3.797,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
29598 13/07/2026	FINALIDADE: MURO DE DIVISA solicitado há 88 dias	CIMALHA PRÉ-MOLDADA — 100 m · ≈ R\$ 3.960,00 ≈ R\$ 3.960,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
29601 13/07/2026	FINALIDADE: AGUAS PLUVIAIS solicitado há 88 dias	CANAleta DE CONCRETO 1/2 CANA DN 60CM — 100 m TC-05 TAMPA DE CONCRETO 35CM — 100 m	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
30337 10/08/2026	FINALIDADE: DESCIDA PLUVIAL solicitado há 60 dias	Tubo de cola para PVC — 2 l · ≈ R\$ 73,24 Cotovelo 45° x 100mm — 20 un · R\$ 110,40 LIXA FERRO 150 — 100 un · R\$ 5.500,00 TUBO PVC 100MM — 15 br · R\$ 2.100,00 ≈ R\$ 7.783,64 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
30589 19/08/2026	FINALIDADE: TAPUME E MURO solicitado há 51 dias	Cimento CP-II 50kg — 50 sc · R\$ 2.054,50 SARRAFO 10 CM 3M — 15 un · R\$ 150,00 AREIA MÉDIA LAVADA — 6 m³ · ≈ R\$ 1.460,10 MADEIRITE PLASTIFICADO ROSA 1,10 X 2,20M — 10 fl ≈ R\$ 3.664,60 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
30653 21/08/2026	FINALIDADE: TAPUME solicitado há 49 dias	THINNER 18l — 1 un · R\$ 406,91 SARRAFO 10 CM 3M — 40 un · R\$ 400,00 COMPENSADO RESINADO FENÓLICO (MADEIRITE ROSA), 2,20 X 1,10 M — 35 fl PONTALETE DE MADEIRA 5 X 5 CM X 3M — 40 un ≈ R\$ 806,91 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
30654 21/08/2026	FINALIDADE: MURO E PINTURA solicitado há 49 dias	Tinta látex Branco 18L — 6 lt · R\$ 2.010,00 CIMENTO CPII — 10 sc · R\$ 320,30 AREIA MÉDIA LAVADA — 6 m³ · ≈ R\$ 1.460,10 ≈ R\$ 3.790,40 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
31118 11/09/2026	FINALIDADE: BANCADA SANITARIOS *ARQUIVO EM ANEXO* solicitado há 28 dias	BANCADA CONFORME PADRAO FDE LT06, PARA 3 CUBAS — 2 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
31119 11/09/2026	FINALIDADE: SANITARIOS solicitado há 28 dias	SOLEIRA CORUMBA 0,96 X 0,25 — 1 un SOLEIRA CORUMBA 0,96 X 0,29 — 1 un SOLEIRA CORUMBA 0,97 X 0,27 — 1 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
31121 11/09/2026	FINALIDADE: SANT *FECHADURA LIVRE/OCUPADO CROMADA, LINHA SILVANA, FERROLHO 530* solicitado há 28 dias	Fechadura tipo livre / ocupado — 7 un · R\$ 350,00 Dobradiça — 10 jg · R\$ 100,00 FECHADURA ROSETA EXTERNA — 3 un · ≈ R\$ 324,00 PORTA PARA PINTURA 0,62 X 1,65M — 6 un PORTA PARA PINTURA 0,92 X 1,65M — 1 un PORTA PARA PINTURA 0,92 X 2,10M — 3 un FLANGE PARA TORNEIRA AUTOMÁTICA ANTIVANDALISMO — 6 un ≈ R\$ 774,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
31289 18/09/2026	FINALIDADE: PINTURA solicitado há 21 dias	Aguarrás — 36 l · R\$ 574,20 TINTA MARFIM LÁTEX 18L — 10 lt · ≈ R\$ 5.108,80 TINTA LÁTEX VERDE KIWI 18L — 10 un · R\$ 3.650,00 VERDE NILO ESMALTE SINTÉTICO 3,6L — 2 gl · R\$ 223,88 TINTA LÁTEX SUPER BRANCO — 10 lt · ≈ R\$ 3.350,00 TINTA LÁTEX VERDE SELVA — 10 lt · ≈ R\$ 2.900,00 ESMALTE SINTÉTICO CREME — 12 gl ESMALTE SINTÉTICO PLATINA — 12 gl ESMALTE SINTÉTICO ROMANCE — 2 gl ≈ R\$ 15.806,88 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
31455 24/09/2026	FINALIDADE: MURO solicitado há 15 dias	Areia média — 6 m³ · R\$ 1.460,10 Cimento CP-II 50kg — 40 sc · R\$ 1.643,60 ≈ R\$ 3.103,70 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra

Solicitação	Finalidade	Itens ainda sem pedido	Entrega
31457 24/09/2026	FINALIDADE: ELÉTRICA solicitado há 15 dias	Cabo flex 2,5mm² preto — 200 m · R\$ 504,00 TAMPA CEGA PARA CONDULETE 3/4 GALVANIZADO — 400 un · R\$ 1.600,00 ≈ R\$ 2.104,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
31461 24/09/2026	FINALIDADE: ALAMBRADO *ELETRODO REVESTIDO E6013 2,5MM (FINO) PARA SOLDA DE AÇO GALVANIZADO* solicitado há 15 dias	ARAME GALVANIZADO N.12 — 20 kg Eletrodo 2,5mm — 5 kg · R\$ 89,00 ≈ R\$ 89,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
31636 01/10/2026	FINALIDADE: MURO solicitado há 8 dias	Arame recozido 12 — 10 kg · ≈ R\$ 217,60 ARMADURA DE BALDRAME CORTE E DOBRA, 4 BARRAS Ø10,0 MM (3/8") CA-50, ESTRIBO 13 X 18 CM Ø5,0 MM CA-60 A CADA 15 CM — 10 m ARMADURA DE BROCA Ø20 CM CORTE E DOBRA, 4 BARRAS Ø10,0 MM — 5 un ARMADURA DE PILAR 15 X 15 CM CORTE E DOBRA, 4 BARRAS Ø10,0 MM CA-50 COM 2,60 M — 10 un VERGALHÃO CA-50 Ø8,0 MM 5/16" 12 M — 20 br ≈ R\$ 217,60 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES DA SEMANA


Pendências em aberto - Finalizar sanitário masculino - Areia e thinner
--

REGISTRO FOTOGRÁFICO DA SEMANA




Registro da visita

05/10/2026

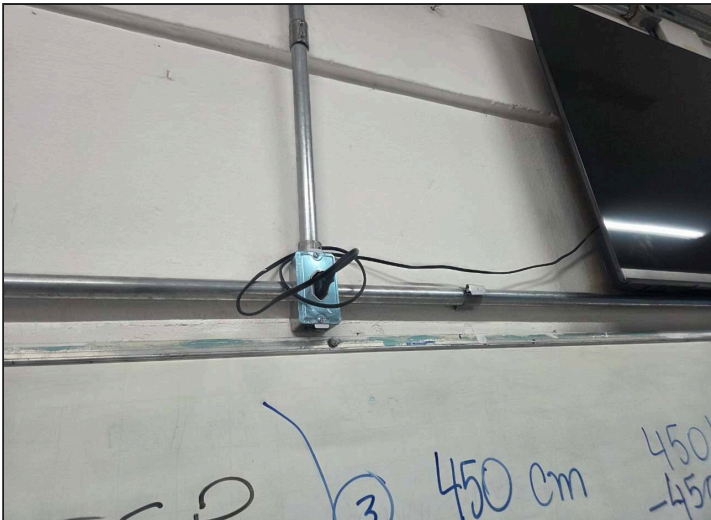

Registro da visita

05/10/2026

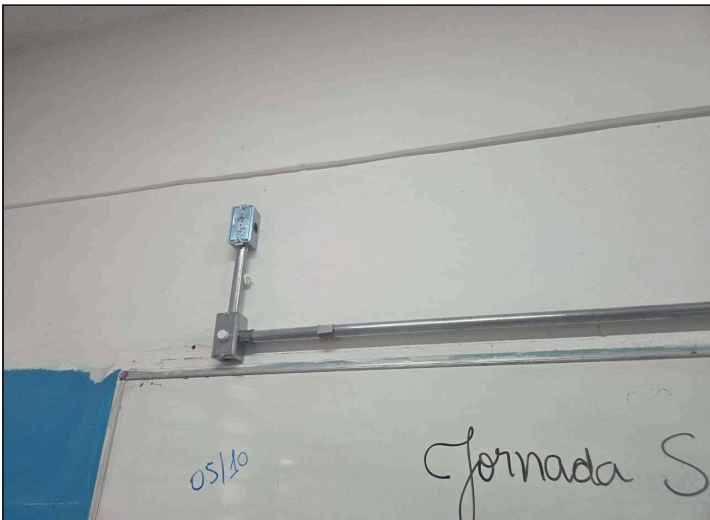

Registro da visita

05/10/2026



Registro da visita

05/10/2026




Registro da visita

05/10/2026




Registro da visita

05/10/2026

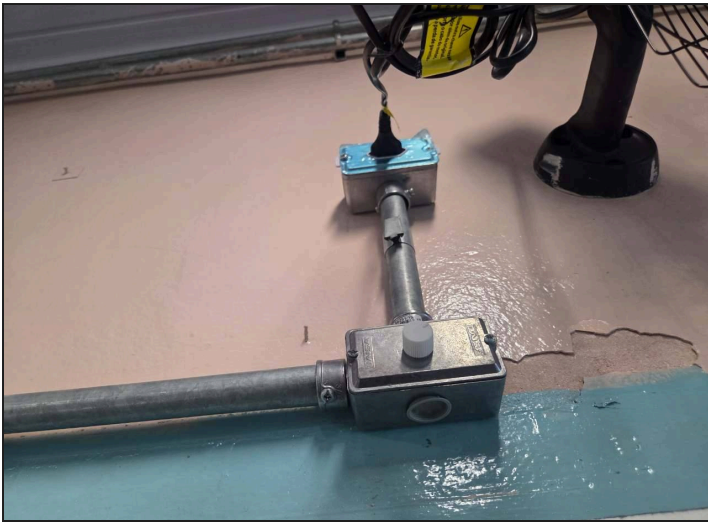


Registro da visita

05/10/2026

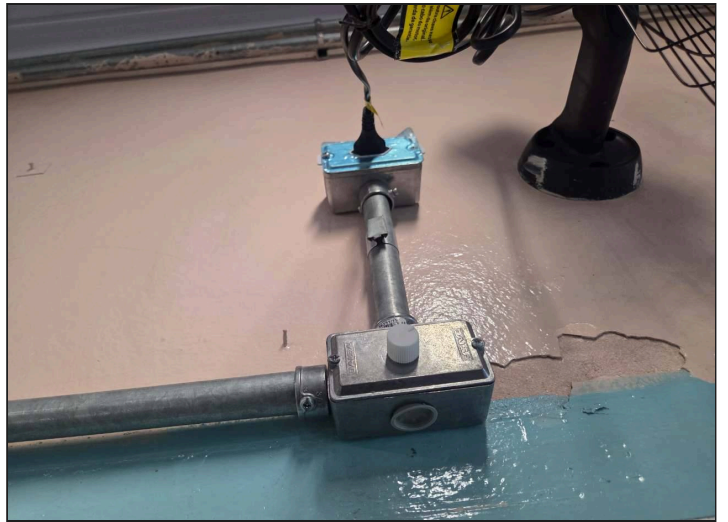

Registro da visita

05/10/2026

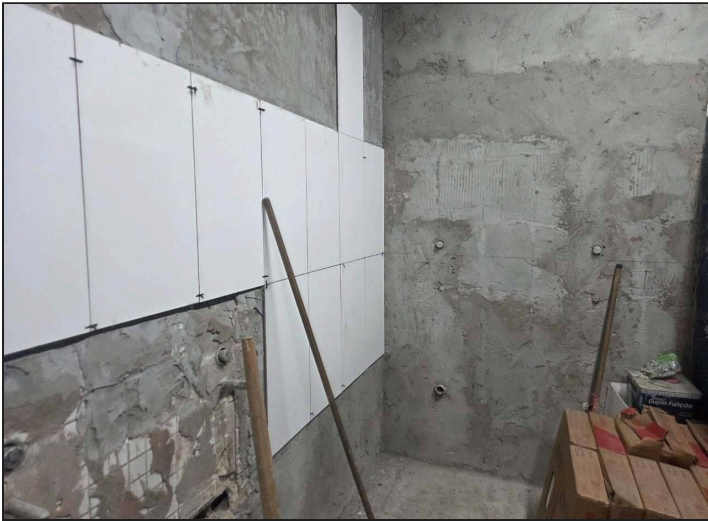

Registro da visita

05/10/2026



Registro da visita

05/10/2026



Registro da visita

05/10/2026



Registro da visita

05/10/2026



Registro da visita

05/10/2026



Registro da visita

05/10/2026



Registro da visita

05/10/2026

DOUGLAS Eng. responsável — contratada	PEDRO Empreiteiro	FABIO Fiscal / FDE
---	---	--
