

ATA FDE CONTRATO ATA.FDE 41.274	RELATÓRIO SEMANAL DE ACOMPANHAMENTO Modelo conforme o Livro de Ocorrências da FDE · documento de acompanhamento da contratada	Semana 41
		05/10/2026 a 09/10/2026
		1 visita(s) registrada(s)
OBRA / UNIDADE DE ENSINO ETEC EMBU		CÓDIGO DO PRÉDIO 1200296
LOCAL EMBU DAS ARTES		PI (PORTAL) 2026/00851
ORDEM DE SERVIÇO —		CONTRATO FDE 70/00445/26-001-001
EMPREITEIRO RAFAEL		ENG. RESPONSÁVEL / FISCAL FDE Douglas / FABIO

RESUMO DA SEMANA

Data	Dia	Efetivo	Tempo	Ritmo	% execução (eng.)
05/10/2026	seg	1	Seco	Lento	40%

1 visita(s) entre 05/10/2026 e 09/10/2026 Execução: **40%**. Previsão de término: .

AVANÇO DA OBRA

Indicador	%	Referência
Aprovado pela FDE (medições aprovadas)	36,6%	M001 a M004 aprovadas · M005 em edição fiscal
Execução apontada pelo engenheiro	40%	visita de 09/10/2026
Fiscal da FDE — último livro de ocorrências	41%	LO nº 14 de 29/09/2026

SERVIÇOS EXECUTADOS NA SEMANA

• Assentamento e rejuntamento de azulejo
--

MATERIAIS — SITUAÇÃO DOS PEDIDOS EM 05/10/2026

Situação na data de emissão deste relatório (05/10/2026 às 16:26): pedidos do Sienge (01/01/2026 a 02/10/2026, exportação de 02/10/2026 13:10), marcações de entrega do painel e solicitações sem pedido de compra (Sienge, 01/10/2026).

Nenhum pedido mudou de pendente para entregue nesta semana.

39 pedidos no Sienge · 38 entregues · 1 com item pendente, somando **R\$ 42.473,79** a receber.

1 pedido(s) sem entrega confirmada até 05/10/2026 — todos listados abaixo, do mais antigo para o mais novo.

Pedido	Fornecedor	Itens	Valor	Entrega
56182 09/09/2026	PERACINI & CIA LTDA pedido há 26 dias	323 - DIVISORIA SANITARIA DE GRANILITE E=3CM — 143,15 m2 13315 - BATENTE ALUMINIO — 128,70 m/min 13316 - REFORÇO METÁLICO FDE PARA FIXAÇÃO DAS DIVISÓRIAS — 66 pc	R\$ 42.474,50	PENDENTE marcado por Eng. Luis Júnior · 05/10/2026 11:20

Solicitações sem pedido de compra (1) — ≈ R\$ 677,70 estimado pelos pedidos do Sienge

Solicitação	Finalidade	Itens ainda sem pedido	Entrega
29722 15/07/2026	FINALIDADE: REVESTIMENTO solicitado há 82 dias	Niple 1/2" — 15 un · ≈ R\$ 98,85 ESPAÇADOR 2MM — 4 cx REJUNTE — 60 kg · R\$ 480,00 NIPLE 3/4" — 15 un · ≈ R\$ 98,85 ≈ R\$ 677,70 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES DA SEMANA

Pendências em aberto

- Execução do forro de gesso dos banheiros alunos masculino e feminino, equipe da obra informou que tinha material mas hoje fez uma solicitação da estrutura do forro

REGISTRO FOTOGRÁFICO DA SEMANA



05/10/2026



05/10/2026



05/10/2026



05/10/2026




05/10/2026



05/10/2026




05/10/2026

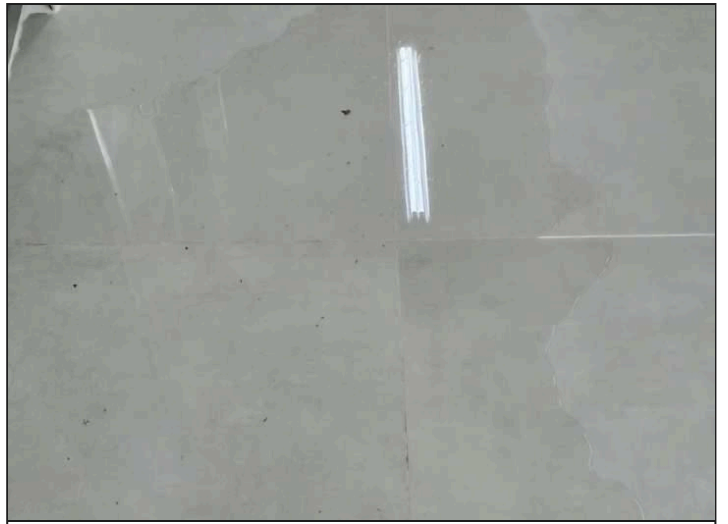

05/10/2026




05/10/2026

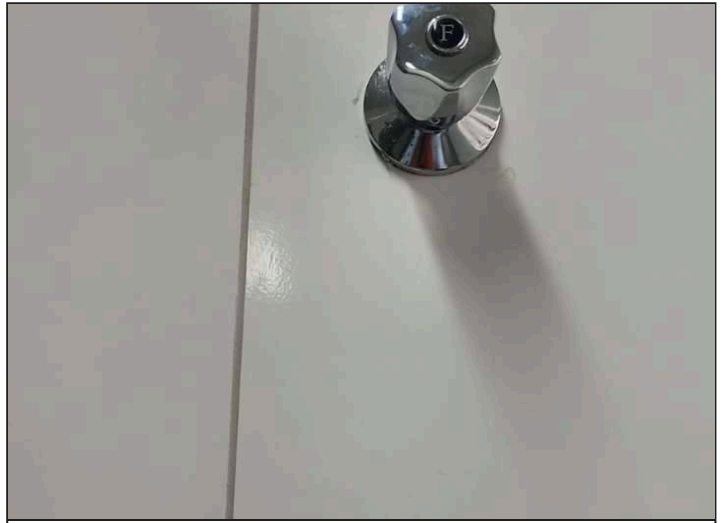

05/10/2026



05/10/2026

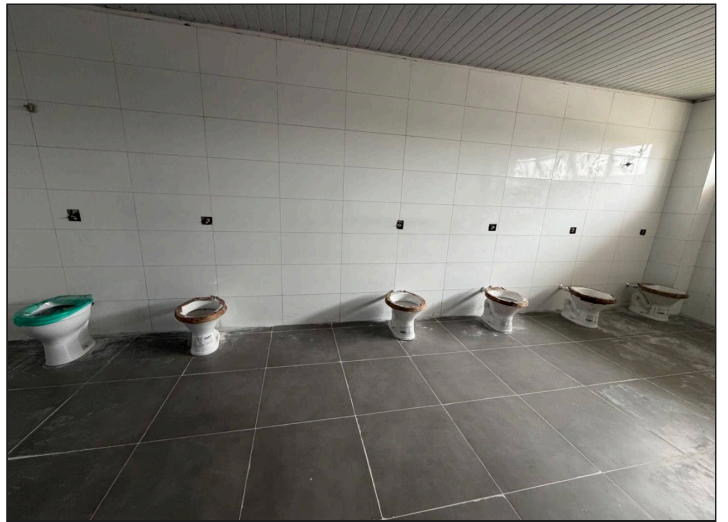

05/10/2026



05/10/2026



05/10/2026



05/10/2026



05/10/2026



05/10/2026



05/10/2026



05/10/2026



05/10/2026



05/10/2026



05/10/2026



05/10/2026



05/10/2026

Douglas Eng. responsável — contratada	RAFAEL Empreiteiro	FABIO Fiscal / FDE
--	-----------------------	-----------------------
