

ATA FDE CONTRATO ATA.FDE 41.234	RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA Modelo conforme o Livro de Ocorrências da FDE · documento de acompanhamento da contratada	Nº 1
		Data: 05/10/2026
		Visita: 12:23
		Preenchido por: Eng. Douglas
OBRA / UNIDADE DE ENSINO EE EE PROF DR EURICO DA SILVA BASTOS		CÓDIGO DO PRÉDIO 116221
LOCAL ITAPECERICA DA SERRA		PI (PORTAL) 2026/00778
ORDEM DE SERVIÇO —		CONTRATO FDE 70/00312/26-001-001
EMPREITEIRO LEONARDO ZANAO		ENG. RESPONSÁVEL / FISCAL FDE Douglas / RENATO

ITENS VERIFICADOS NA VISITA

1. Mão-de-obra / Número de funcionários Qtd. (1)	☐ Suficiente ☒ Insuficiente
2. Material em canteiro	☐ Suficiente ☒ Insuficiente
3. Equipamentos	☐ Suficiente ☒ Insuficiente
4. Tempo	☒ Seco ☐ Chuva
5. Falhas construtivas a serem corrigidas	☒ Sim ☐ Não
6. Placa de obra instalada	☐ Sim ☐ Não ☒ N/A
7. Andamento dos serviços (50) % atual aprovado 62% · fiscal FDE 43% (LO 10/09/2026)	☐ Não iniciada ☒ Em execução ☐ Obra paralisada ☐ Obra concluída ☐ Em rescisão
8. Ritmo da obra	☐ Normal ☒ Lento ☐ Parado
9. Organização e limpeza da obra	☐ Boa ☐ Regular ☒ Ruim
10. Previsão de término	—

AVANÇO DA OBRA

Indicador	%	Referência
Aprovado pela FDE (medições aprovadas)	62%	M001 a M004 aprovadas · M005 em aprovação gerente
Execução apontada pelo engenheiro	50%	visita de 05/10/2026
Fiscal da FDE — último livro de ocorrências	43%	LO nº 11 de 10/09/2026

SERVIÇOS EXECUTADOS

- Instalando pingadeira de concreto

MATERIAIS — PEDIDOS SEM ENTREGA ATÉ 05/10/2026

58 pedidos no Sienge · 57 entregues · 1 com item pendente, somando R\$ 3.157,69 a receber.

1 pedido(s) sem entrega confirmada até 05/10/2026 — todos listados abaixo, do mais antigo para o mais novo.

Pedido	Fornecedor	Itens	Valor	Entrega
57358 02/10/2026	ZANAO PRINT LTDA pedido há 3 dias	12440 - MAO DE OBRA — 1 un	R\$ 3.157,69	PENDENTE falta R\$ 3.157,69

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES


Observações - Itens a serem regularizar - Válvula HYDRA (nao conectado tubo de descida) - Azulejos trincado - Rejunte com falhas - Falta pintura tetos sanitado - Vazamento telhado - Falta instalar rufo Recomendações à contratada - Aumentar efetivo, e finalizar sant masculino

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Registro da visita

05/10/2026

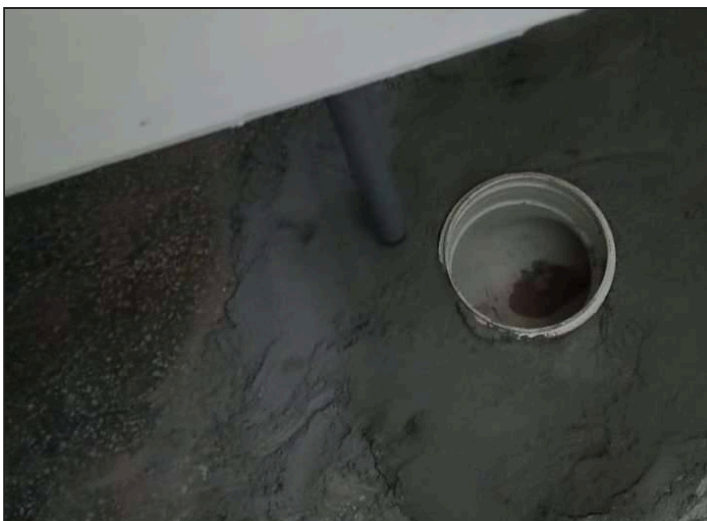

Registro da visita

05/10/2026




Registro da visita

05/10/2026



Registro da visita

05/10/2026

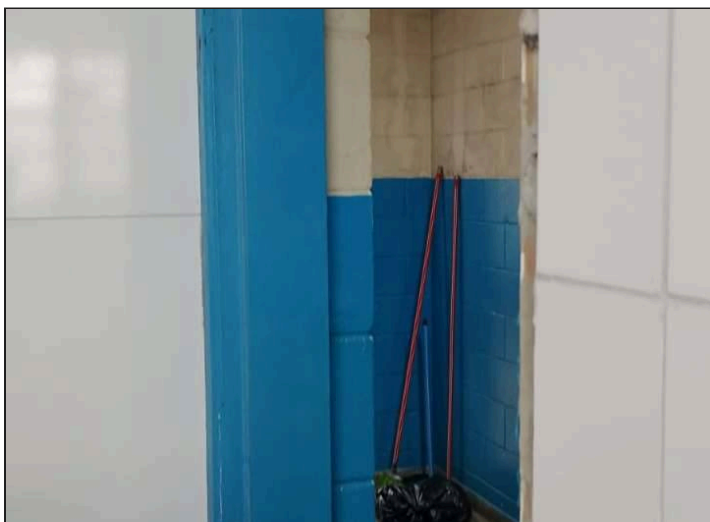

Registro da visita

05/10/2026



Registro da visita

05/10/2026



Registro da visita

05/10/2026



Registro da visita

05/10/2026



Registro da visita

05/10/2026



Registro da visita

05/10/2026

DOUGLAS Eng. responsável — contratada	LEONARDO ZANAO Empreiteiro	RENATO Fiscal / FDE
---	--	---
