

RELATÓRIO SEMANAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Consolidado das vistorias NR-18 da semana · Modelo único SST FDE rev01

Semana **41**

05/10/2026 a 09/10/2026

Obra: **214**

1 vistoria(s)

UNIDADE DE ENSINO 214 — EE PROF JOSÉ SILVEIRA DA MOTTA		MUNICÍPIO ITAPECERICA DA SERRA / SP	CONTRATO FDE 70/00203/26-001-001
EMPREITEIRO CRISTIAN GUIDO	CONTRATADA ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DOUGLAS	FISCAL FDE RENATO
PRAZO DECORRIDO NO FIM DA SEMANA início 15/04/2026 · término previsto 15/09/2026 · decorridos 177 de 153 dias (116%) · prazo vencido há 24 dias na sexta-feira			

VISTORIAS DA SEMANA

DATA	RESPONSÁVEL	FASE	CLASSIFICAÇÃO	MÉDIA	CONFORMIDADE	NC
05/10/2026	Fernando	Muro demolição	BOM	1,000	75%	0

BOM

situação na última vistoria (05/10/2026) · média ponderada **1,000**
CORREÇÃO IMEDIATA — item com nota 3 (RUIM)

ITENS NÃO CONFORMES NA VISTORIA

DATA	ITEM	O QUE FOI VERIFICADO	NR
05/10/2026	10.2.1	Fundações / tubulões Atenção no muro	NR-18.7

NÃO CONFORMIDADES DA SEMANA — REGISTRO FOTOGRÁFICO

Nenhuma não conformidade registrada na semana.

ACOMPANHAMENTO

DATA	EFETIVO	ATIVIDADES	ITENS DE SST OBSERVADOS	PENDÊNCIAS
05/10/2026	1	Retirada de entulho e demolição	Obra desorganizada	

Colaboradores lançados na vistoria mais completa da semana: 1.

Fernando
Responsável SST

DOUGLAS
Engenheiro responsável

CRISTIAN GUIDO
Empreiteiro

Gerado em 05/10/2026 11:35 · consolidado de 1 vistoria(s) do formulário do painel (214-muv5l5xj). Os relatórios de cada vistoria ficam na aba Segurança.

RELATÓRIO SEMANAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Consolidado das vistorias NR-18 da semana · Modelo único SST FDE rev01

Semana **41**

05/10/2026 a 09/10/2026

Obra: **228**

1 vistoria(s)

UNIDADE DE ENSINO 228 — NERCY AMELIA MARTELINI DAHER PROFESSORA		MUNICÍPIO PIRAPORA DO BOM JESUS / SP	CONTRATO FDE 70/00313/26-001-001
EMPREITEIRO ARAUJO	CONTRATADA B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL LEONARDO	FISCAL FDE RODRIGO
PRAZO DECORRIDO NO FIM DA SEMANA início 04/05/2026 · término previsto 04/02/2027 · decorridos 158 de 276 dias (57%) · restam 118 dias na sexta-feira			

VISTORIAS DA SEMANA

DATA	RESPONSÁVEL	FASE	CLASSIFICAÇÃO	MÉDIA	CONFORMIDADE	NC
05/10/2026	Reginaldo Eder	Pintura das paredes patio e retoques na estrutura do telhado, continuação do muro, forro da sala de leitura	ÓTIMO	0,840	79%	0

ÓTIMO

situação na última vistoria (05/10/2026) · média ponderada **0,840**

MANTER O PADRÃO

ITENS NÃO CONFORMES NA VISTORIA

Nenhum item não conforme nas vistorias da semana.

NÃO CONFORMIDADES DA SEMANA — REGISTRO FOTOGRÁFICO

Nenhuma não conformidade registrada na semana.

ACOMPANHAMENTO

DATA	EFETIVO	ATIVIDADES	ITENS DE SST OBSERVADOS	PENDÊNCIAS
05/10/2026	8	equipe divida em ; pintura, forro da sala e muro	EPI'S em geral, Escada, ferramentas elétricas e manuais, espaço de trabalho e organização,	

Reginaldo Eder
Responsável SST

LEONARDO
Engenheiro responsável

ARAUJO
Empreiteiro

Gerado em 05/10/2026 18:34 · consolidado de 1 vistoria(s) do formulário do painel (228-muvftk8f). Os relatórios de cada vistoria ficam na aba Segurança.

RELATÓRIO SEMANAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Consolidado das vistorias NR-18 da semana · Modelo único SST FDE rev01

Semana **41**

05/10/2026 a 09/10/2026

Obra: **230**

1 vistoria(s)

UNIDADE DE ENSINO 230 — EE MARIA ANTONIETA MARTINS		MUNICÍPIO EMBU DAS ARTES / SP	CONTRATO FDE 70/00367/26-001-001
EMPREITEIRO RAFAEL	CONTRATADA ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DOUGLAS	FISCAL FDE FABIO
PRAZO DECORRIDO NO FIM DA SEMANA início 30/04/2026 · término previsto 30/12/2026 · decorridos 162 de 244 dias (66%) · restam 82 dias na sexta-feira			

VISTORIAS DA SEMANA

DATA	RESPONSÁVEL	FASE	CLASSIFICAÇÃO	MÉDIA	CONFORMIDADE	NC
05/10/2026	Fernando	Foro	REGULAR / ATENÇÃO	1,912	52%	1

REGULAR / ATENÇÃO

situação na última vistoria (05/10/2026) · média ponderada **1,912**
AÇÃO IMEDIATA — item com nota 4 (PÉSSIMO)

ITENS NÃO CONFORMES NA VISTORIA

DATA	ITEM	O QUE FOI VERIFICADO	NR
05/10/2026	7.1.1	Instalações sanitárias — lavatórios ColaboradorJACO LEVOU A CHAVE DO WC , FORNECIDO PELA ESCOLA	NR-18.5 / NR-24
05/10/2026	7.1.2	Instalações sanitárias — vaso sanitário ColaboradorJACO LEVOU A CHAVE DO WC , FORNECIDO PELA ESCOLA	NR-18.5 / NR-24
05/10/2026	7.1.3	Instalações sanitárias — mictório ColaboradorJACO LEVOU A CHAVE DO WC , FORNECIDO PELA ESCOLA	NR-18.5 / NR-24
05/10/2026	7.2	Vestário para troca de roupa dos colaboradores ColaboradorJACO LEVOU A CHAVE DO WC , FORNECIDO PELA ESCOLA	NR-18.5.4 / NR-24.4
05/10/2026	7.4	Refeitório ColaboradorJACO LEVOU A CHAVE DO local FORNECIDO PELA ESCOLA	NR-18.5.3
05/10/2026	19.1	Movimentação e transporte de materiais Só um colaborador ,para taze o transporte de material	NR-18.17 / NR-11
05/10/2026	20.5	Treinamento NR-35 dos montadores / usuários Colaborador sem documentos	NR-35
05/10/2026	20.6	Análise de Risco (AR) da montagem Colaborador sem documentos	NR-35.4
05/10/2026	20.7	Permissão de Trabalho (PT) Colaborador sem documentos	NR-35.4.6
05/10/2026	22.1	EPIs adequados fornecidos, com CA válido e em uso efetivo Sem EPI , óculos de proteção	NR-06.6.1 / NR-06.7.1



05/10/2026 · Resíduos de obras

Item	9.1 — Demolições
Local	Pátio / telhado
Classificação	CRÍTICO
Ação corretiva	Retirar urgente
Prazo	05/10/2026
Responsável	Rafael
Status	Aberta



Colaboradores lançados na vistoria mais completa da semana: 1.

Fernando
Responsável SST

DOUGLAS
Engenheiro responsável

RAFAEL
Empreiteiro

ATA FDE CONTRATO ATA.FDE 41.234	RELATÓRIO SEMANAL DE ACOMPANHAMENTO Modelo conforme o Livro de Ocorrências da FDE · documento de acompanhamento da contratada	Semana 41
		05/10/2026 a 09/10/2026
		1 visita(s) registrada(s)
OBRA / UNIDADE DE ENSINO EE EE PROF DR EURICO DA SILVA BASTOS		CÓDIGO DO PRÉDIO 116221
LOCAL ITAPECERICA DA SERRA		PI (PORTAL) 2026/00778
ORDEM DE SERVIÇO —		CONTRATO FDE 70/00312/26-001-001
EMPREITEIRO LEONARDO ZANAO		ENG. RESPONSÁVEL / FISCAL FDE Douglas / RENATO

RESUMO DA SEMANA

Data	Dia	Efetivo	Tempo	Ritmo	% execução (eng.)
05/10/2026	seg	1	Seco	Lento	50%

1 visita(s) entre 05/10/2026 e 09/10/2026 Execução: **50%**. Previsão de término: .

AVANÇO DA OBRA

Indicador	%	Referência
Aprovado pela FDE (medições aprovadas)	62%	M001 a M004 aprovadas · M005 em aprovação gerente
Execução apontada pelo engenheiro	50%	visita de 09/10/2026
Fiscal da FDE — último livro de ocorrências	43%	LO nº 11 de 10/09/2026

SERVIÇOS EXECUTADOS NA SEMANA

Instalando pingadeira de concreto

MATERIAIS — SITUAÇÃO DOS PEDIDOS EM 05/10/2026

Situação na data de emissão deste relatório (05/10/2026 às 20:20): pedidos do Sienge (01/01/2025 a 05/10/2026, exportação de 05/10/2026 19:13), marcações de entrega do painel e solicitações sem pedido de compra (Sienge, 05/10/2026).

Nenhum pedido mudou de pendente para entregue nesta semana.

58 pedidos no Sienge · 57 entregues · 1 com item pendente, somando **R\$ 3.157,69** a receber.

1 pedido(s) sem entrega confirmada até 05/10/2026 — todos listados abaixo, do mais antigo para o mais novo.

Pedido	Fornecedor	Itens	Valor	Entrega
57358 02/10/2026	ZANAO PRINT LTDA pedido há 3 dias	12440 - MAO DE OBRA — 1 un	R\$ 3.157,69	PENDENTE falta R\$ 3.157,69

Solicitações sem pedido de compra (18) — ≈ R\$ 34.038,19 estimado pelos pedidos do Sienge

Solicitação	Finalidade	Itens ainda sem pedido	Entrega
27966 28/04/2026	FINALIDADE: MURO DIVISA *IMAGEM EM ANEXO* solicitado há 160 dias	VIGA BALDRAME CORTE E DOBRA — 50 m · R\$ 3.200,00 ≈ R\$ 3.200,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra

Solicitação	Finalidade	Itens ainda sem pedido	Entrega
27967 28/04/2026	FINALIDADE: MURO DIVISA *IMAGEM EM ANEXO* solicitado há 160 dias	PILAR CORTE E DOBRA COMP=2,40M — 25 un · R\$ 1.721,50 ≈ R\$ 1.721,50 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
27968 28/04/2026	FINALIDADE: MURO DE DIVISA *IMAGEM EM ANEXO* solicitado há 160 dias	BROCA CORTE E DOBRA COMP = 2,50M — 25 un · R\$ 4.791,25 ≈ R\$ 4.791,25 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
27969 28/04/2026	FINALIDADE: MURO DE DIVISA FD-16 solicitado há 160 dias	Areia média — 6 m³ · R\$ 1.460,10 BLOCO CONCRETO CANALETA 14X19X39CM — 20 un · R\$ 105,40 BRITA N°01 — 6 m³ · R\$ 1.050,00 ≈ R\$ 2.615,50 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28516 21/05/2026	FINALIDADE: GRANITO COZINHA solicitado há 137 dias	BA-10 GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM COMP=2,00M — 1 un Placa de granito (40x30cm, e=2cm), cinza andorinha COM FURO CENTRAL — 2 un CC-04 GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM 1,65M X 0,65M — 1 un · R\$ 965,00 BS-05 GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM COMP= 0,55M — 1 un · ≈ R\$ 2.115,00 ≈ R\$ 3.080,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28519 21/05/2026	FINALIDADE: ARMADURA QE-37 solicitado há 137 dias	AÇO CA-50 8,00MM — 9 br · R\$ 280,80 AÇO CA-50 6,30MM — 6 br · R\$ 224,34 AÇO CA-50 12,50MM — 14 br · R\$ 971,74 AÇO 3,4MM — 2 br · R\$ 21,00 ≈ R\$ 1.497,88 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28540 22/05/2026	FINALIDADE: COZINHA solicitado há 136 dias	CUBA DUPLA ACO INOX 304 CH22 1020X400X250MM — 1 un · R\$ 1.195,28 ≈ R\$ 1.195,28 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28544 22/05/2026	FINALIDADE: MURO DE DIVISA ETAPA 02 - AGUARDAR LIBERAÇÃO *IMAGEM EM ANEXO* solicitado há 136 dias	BROCA CORTE E DOBRA COMP = 2,50M — 25 un · R\$ 4.791,25 ≈ R\$ 4.791,25 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28545 22/05/2026	FINALIDADE: MURO DE DIVISA ETAPA 02 - AGUARDAR LIBERAÇÃO *IMAGEM EM ANEXO* solicitado há 136 dias	PILAR CORTE E DOBRA COMP=2,40M — 25 un · R\$ 1.721,50 ≈ R\$ 1.721,50 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28546 22/05/2026	FINALIDADE: MURO DIVISA ETAPA 02 - AGUARDAR LIBERAÇÃO *IMAGEM EM ANEXO* solicitado há 136 dias	VIGA BALDRAME CORTE E DOBRA — 50 m · R\$ 3.200,00 ≈ R\$ 3.200,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28556 22/05/2026	FINALIDADE: LINHAS DEMARCATÓRIAS DA QUADRA DE ESPORTES solicitado há 136 dias	FITA CREPE 18MM X 50M — 10 un · R\$ 150,00 PINCEL MÉDIO — 2 un · R\$ 15,50 Linha de pedreiro — 2 un · R\$ 16,74 Pincel pequeno — 2 un · R\$ 9,80 FITA CREPE GROSSA 48MM X 50M — 10 un · R\$ 105,20 TINTA CORAL PINTA PISO (LÁTEX) CONF. S14.07 BRANCO 3,6L — 2 gl · R\$ 178,00 TINTA CORAL PINTA PISO (LÁTEX) CONF. S14.07 VERDE 3,6L — 2 gl · R\$ 178,00 TINTA CORAL PINTA PISO (LÁTEX) CONF. S14.07 AMARELO 3,6L — 2 gl · R\$ 178,00 TINTA CORAL PINTA PISO (LÁTEX) CONF. S14.07 VERMELHO 3,6L — 1 gl · R\$ 89,00 SELADOR ACRÍLICO CORAL CONF. S14.20 — 1 lt · R\$ 175,00 ≈ R\$ 1.119,24 estimado ... e mais 1 itens	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra

Solicitação	Finalidade	Itens ainda sem pedido	Entrega
28557 22/05/2026	FINALIDADE: PINTURA INTERNA solicitado há 136 dias	Tinta piso vermelho 18l — 1 lt · R\$ 458,55 TINTA PISO VERDE QUADRA — 1 lt · R\$ 278,72 TINTA PISO AZUL 18L — 1 lt · R\$ 278,72 ≈ R\$ 1.015,99 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28558 22/05/2026	FINALIDADE: WC solicitado há 136 dias	Espelho EP-01 — 6 un · R\$ 930,00 ≈ R\$ 930,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
29202 22/06/2026	FINALIDADE: MURO DE DIVISA *PILAR CORTE E DOBRA ARMADO* solicitado há 105 dias	PILAR CORTE E DOBRA COMP=2,40M — 20 un · R\$ 1.377,20 ≈ R\$ 1.377,20 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
30324 10/08/2026	FINALIDADE: REFORMA COZINHA solicitado há 56 dias	Fechadura tipo livre / ocupado — 4 un · R\$ 200,00 Dobradiça — 6 jg · R\$ 60,00 FECHADURA ROSETA EXTERNA — 2 un · ≈ R\$ 216,00 ≈ R\$ 476,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
30349 10/08/2026	FINALIDADE: LIMPEZA DA OBRA solicitado há 56 dias	TROCA DE CAÇAMBA — 2 un · R\$ 960,00 ≈ R\$ 960,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
30590 19/08/2026	FINALIDADE: REMOÇÃO solicitado há 47 dias	REMOÇÃO CONTAINER — 1 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
30833 28/08/2026	FINALIDADE: BANHEIROS solicitado há 38 dias	Porta de madeira 0,82 x 2,10m — 1 un · R\$ 345,60 ≈ R\$ 345,60 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES DA SEMANA

Observações

- Itens a serem regularizar
- Válvula HYDRA (nao conectado tubo de descida)
- Azulejos trincado
- Rejunte com falhas
- Falta pintura tetos sanitado
- Vazamento telhado
- Falta instalar rufo

Recomendações à contratada

- Aumentar efetivo, e finalizar sant masculino

REGISTRO FOTOGRÁFICO DA SEMANA



Registro da visita

05/10/2026



Registro da visita

05/10/2026




Registro da visita

05/10/2026



Registro da visita

05/10/2026

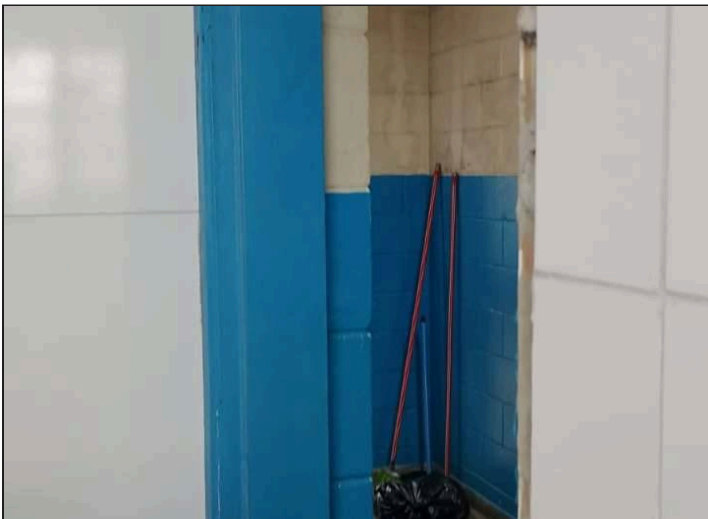

Registro da visita

05/10/2026



Registro da visita

05/10/2026



Registro da visita

05/10/2026



Registro da visita

05/10/2026



Registro da visita

05/10/2026



Registro da visita

05/10/2026

DOUGLAS Eng. responsável — contratada	LEONARDO ZANAO Empreiteiro	RENATO Fiscal / FDE
---	--	---

RELATÓRIO SEMANAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Consolidado das vistorias NR-18 da semana · Modelo único SST FDE rev01

Semana **41**

05/10/2026 a 09/10/2026

Obra: **274**

1 vistoria(s)

UNIDADE DE ENSINO 274 — ETEC EMBU		MUNICÍPIO EMBU DAS ARTES / SP	CONTRATO FDE 70/00445/26-001-001
EMPREITEIRO RAFAEL	CONTRATADA ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DOUGLAS	FISCAL FDE FABIO
PRAZO DECORRIDO NO FIM DA SEMANA início 13/05/2026 · término previsto 13/12/2026 · decorridos 149 de 214 dias (70%) · restam 65 dias na sexta-feira			

VISTORIAS DA SEMANA

DATA	RESPONSÁVEL	FASE	CLASSIFICAÇÃO	MÉDIA	CONFORMIDADE	NC
05/10/2026	Fernando	Revestimento	REGULAR / ATENÇÃO	1,656	59%	1

REGULAR / ATENÇÃO

situação na última vistoria (05/10/2026) · média ponderada **1,656**
AÇÃO IMEDIATA — item com nota 4 (PÉSSIMO)

ITENS NÃO CONFORMES NA VISTORIA

DATA	ITEM	O QUE FOI VERIFICADO	NR
05/10/2026	7.1.4	Instalações sanitárias — chuveiro Não tem chuveiro	NR-18.5 / NR-24
05/10/2026	7.2	Vestiário para troca de roupa dos colaboradores Não tem vestiário	NR-18.5.4 / NR-24.4
05/10/2026	7.4	Refeitório Sem refeitório no local	NR-18.5.3
05/10/2026	16.1	Escadas Falta escada para acesso ao andeaim	NR-18.15
05/10/2026	22.1	EPIs adequados fornecidos, com CA válido e em uso efetivo Colaborador não utiliza óculos de proteção	NR-06.6.1 / NR-06.7.1
05/10/2026	23.1	Armazenagem de materiais Imediato	NR-18.19
05/10/2026	23.3	Tapumes / isolamento da obra — barreira rígida, estável e contínua Já foi pedido o isolamento só canteio de obras	NR-18.13
05/10/2026	23.4	Interface com a comunidade escolar — controle efetivo de acesso Sem previa comunicação com a diretoria da escola	NR-18.13

NÃO CONFORMIDADES DA SEMANA — REGISTRO FOTOGRÁFICO



05/10/2026 · Risco de perfuração ocular

Item	22.1 — EPIs adequados fornecidos, com CA válido e em uso efetivo
Local	Vestiário
Classificação	ALTO
Ação corretiva	Uso de óculos de proteção constante
Prazo	05/10/2026
Responsável	Rafael
Status	Aberta

Colaboradores lançados na vistoria mais completa da semana: 1.

Fernando Responsável SST	DOUGLAS Engenheiro responsável	RAFAEL Empreiteiro
-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------

Gerado em 05/10/2026 16:00 · consolidado de 1 vistoria(s) do formulário do painel (274-muvc5nmi). Os relatórios de cada vistoria ficam na aba Segurança.

ATA FDE CONTRATO ATA.FDE 41.274	RELATÓRIO SEMANAL DE ACOMPANHAMENTO Modelo conforme o Livro de Ocorrências da FDE · documento de acompanhamento da contratada	Semana 41
		05/10/2026 a 09/10/2026
		1 visita(s) registrada(s)
OBRA / UNIDADE DE ENSINO ETEC EMBU	CÓDIGO DO PRÉDIO 1200296	
LOCAL EMBU DAS ARTES	PI (PORTAL) 2026/00851	
ORDEM DE SERVIÇO —	CONTRATO FDE 70/00445/26-001-001	
EMPREENHEIRO RAFAEL	ENG. RESPONSÁVEL / FISCAL FDE Douglas / FABIO	

RESUMO DA SEMANA

Data	Dia	Efetivo	Tempo	Ritmo	% execução (eng.)
05/10/2026	seg	1	Seco	Lento	40%

1 visita(s) entre 05/10/2026 e 09/10/2026 Execução: **40%**. Previsão de término: .

AVANÇO DA OBRA

Indicador	%	Referência
Aprovado pela FDE (medições aprovadas)	36,6%	M001 a M004 aprovadas · M005 em edição fiscal
Execução apontada pelo engenheiro	40%	visita de 09/10/2026
Fiscal da FDE — último livro de ocorrências	41%	LO nº 14 de 29/09/2026

SERVIÇOS EXECUTADOS NA SEMANA

Assentamento e rejuntamento de azulejo
--

MATERIAIS — SITUAÇÃO DOS PEDIDOS EM 05/10/2026

Situação na data de emissão deste relatório (05/10/2026 às 20:20): pedidos do Sienge (01/01/2025 a 05/10/2026, exportação de 05/10/2026 19:13), marcações de entrega do painel e solicitações sem pedido de compra (Sienge, 05/10/2026).

Nenhum pedido mudou de pendente para entregue nesta semana.

40 pedidos no Sienge · 38 entregues · 2 com item pendente, somando **R\$ 43.776,09** a receber.

2 pedido(s) sem entrega confirmada até 05/10/2026 — todos listados abaixo, do mais antigo para o mais novo.

Pedido	Fornecedor	Itens	Valor	Entrega
56182 09/09/2026	PERACINI & CIA LTDA pedido há 26 dias	323 - DIVISORIA SANITARIA DE GRANILITE E=3CM — 143,15 m2 13315 - BATENTE ALUMINIO — 128,70 m/min 13316 - REFORÇO METÁLICO FDE PARA FIXAÇÃO DAS DIVISÓRIAS — 66 pc	R\$ 42.474,50	PENDENTE marcado por Eng. Luis Júnior · 05/10/2026 11:20

Pedido	Fornecedor	Itens	Valor	Entrega
57433 05/10/2026	CIMEMPRIMO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pedido há 0 dias	44289 - TIRANTE 15CM — 35 un 44291 - PARAFUSO GN 45 — 5 cx 45077 - PARAFUSO 4,5 X 40 FLANGEADO COM BUCHA 6 (COM ANEL) — 500 un 45076 - CANTONEIRA L — 25 un 7493 - Regulador F530 — 35 un 17760 - Canaleta F530 — 40 un 45078 - PARAFUSO METAL/METAL — 1 cx 7494 - Parafuso GN25 — 1.000 un 18335 - FITA DRYWALL TELADA AZUL 5CMX90M — 5 pç 22476 - MASSA DRYWALL 20 KG — 1 sc 17696 - Bucha 6 — 1.000 un	R\$ 1.310,05	PENDENTE falta R\$ 1.302,30

Solicitações sem pedido de compra (1) — ≈ R\$ 677,70 estimado pelos pedidos do Sienge

Solicitação	Finalidade	Itens ainda sem pedido	Entrega
29722 15/07/2026	FINALIDADE: REVESTIMENTO solicitado há 82 dias	Niple 1/2" — 15 un · ≈ R\$ 98,85 ESPAÇADOR 2MM — 4 cx REJUNTE — 60 kg · R\$ 480,00 NIPLE 3/4" — 15 un · ≈ R\$ 98,85 ≈ R\$ 677,70 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra


ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES DA SEMANA

Pendências em aberto Execução do forro de gesso dos banheiros alunos masculino e feminino, equipe da obra informou que tinha material mas hoje fez uma solicitação da estrutura do forro


REGISTRO FOTOGRÁFICO DA SEMANA



Fachada a ser executada reparo do revestimento, pintura e reparo do brise metalico
05/10/2026

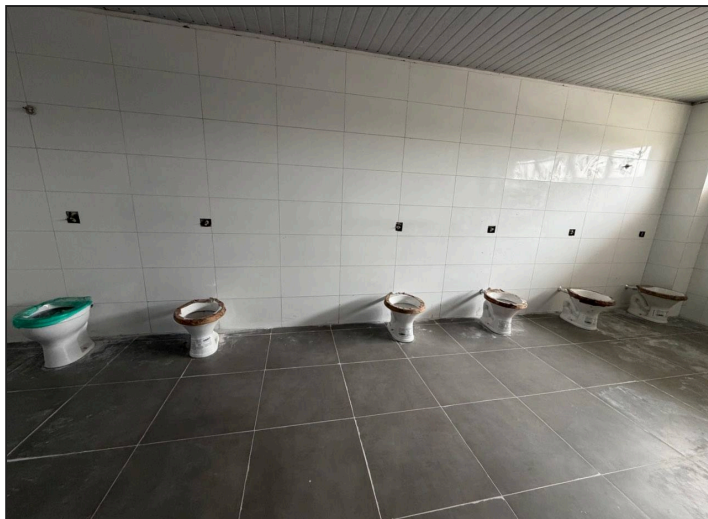

Bacia sanitária com espaçamento
05/10/2026

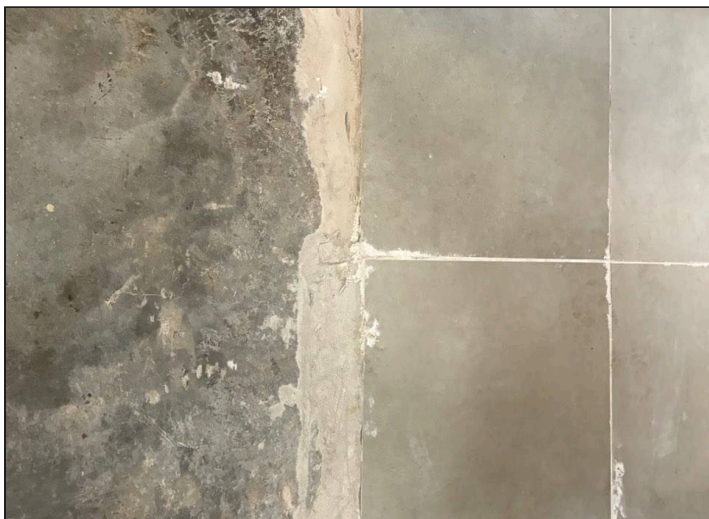

Acabamento ruim entre porcelanato e piso existente da escola
05/10/2026



Acabamento ruim entre porcelanato e piso existente da escola
05/10/2026



Acabamento entre azulejo e viga existente
05/10/2026



Não iniciado forro
05/10/2026




Válvulas sem os acabamentos

05/10/2026



Pontos de infiltração do telhado a serem corrigidos

05/10/2026

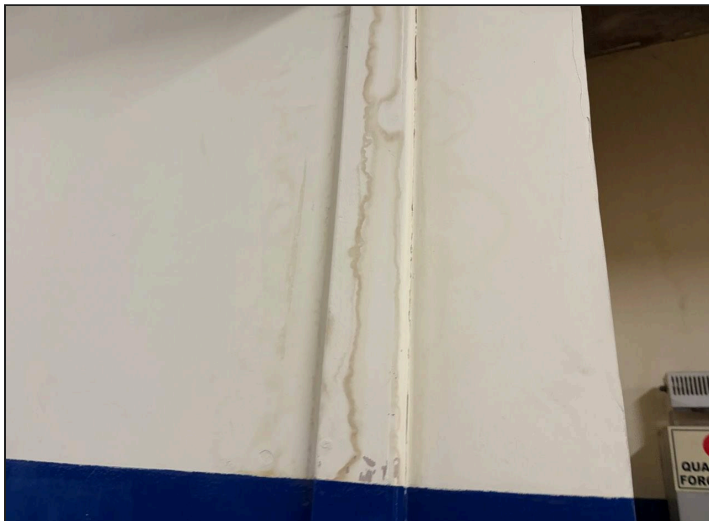

Pontos de infiltração do telhado a serem corrigidos

05/10/2026




Pontos de infiltração do telhado a serem corrigidos (Elevador)

05/10/2026



Pontos de infiltração do telhado a serem corrigidos

05/10/2026

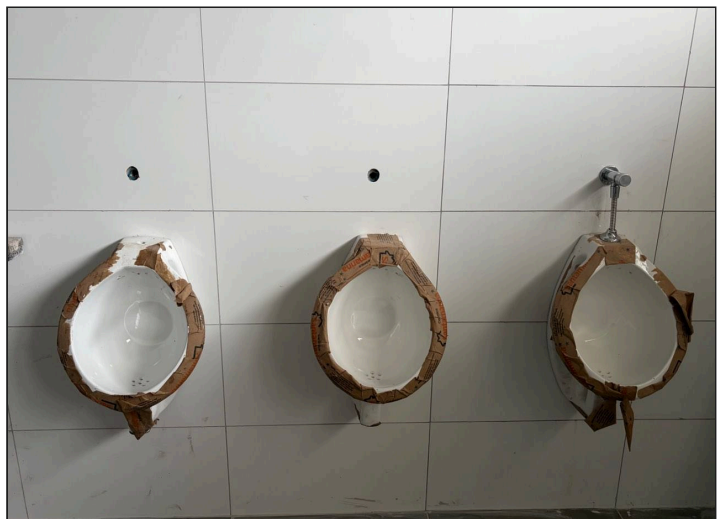

Mictórios não finalizados válvulas

05/10/2026



Azulejo banheiro não finalizado

05/10/2026



Muro onde possivelmente será executado alambrado

05/10/2026



Guarita, previsão de manutenção para acabar com infiltrações

05/10/2026

LUIS JÚNIOR
Eng. responsável — contratada

RAFAEL
Empreiteiro

FABIO
Fiscal / FDE

ATA FDE CONTRATO ATA.FDE 42.275	RELATÓRIO SEMANAL DE ACOMPANHAMENTO Modelo conforme o Livro de Ocorrências da FDE · documento de acompanhamento da contratada	Semana 41
		05/10/2026 a 09/10/2026
		1 visita(s) registrada(s)
OBRA / UNIDADE DE ENSINO EE/EMEF JD MARIA HELENA / PADRE ELIDIO		CÓDIGO DO PRÉDIO 102206
LOCAL BARUERI		PI (PORTAL) 2024/01752
ORDEM DE SERVIÇO —		CONTRATO FDE 70/00559/26-001-001
EMPREITEIRO RAFAEL		ENG. RESPONSÁVEL / FISCAL FDE LEONARDO / GUILHERME

RESUMO DA SEMANA

Data	Dia	Efetivo	Tempo	Ritmo	% execução (eng.)
05/10/2026	seg	0	Seco	Normal	24%

1 visita(s) entre 05/10/2026 e 09/10/2026 Execução: **24%**. Previsão de término: .

AVANÇO DA OBRA

Indicador	%	Referência
Aprovado pela FDE (medições aprovadas)	21,2%	M001 a M003 aprovadas · M004 em edição fiscal
Execução apontada pelo engenheiro	24%	visita de 09/10/2026
Fiscal da FDE — último livro de ocorrências	38%	LO nº 10 de 28/09/2026

SERVIÇOS EXECUTADOS NA SEMANA

No horário da vistoria não havia funcionário na unidade

MATERIAIS — SITUAÇÃO DOS PEDIDOS EM 05/10/2026

Situação na data de emissão deste relatório (05/10/2026 às 19:21): pedidos do Sienge (01/01/2025 a 05/10/2026, exportação de 05/10/2026 19:13), marcações de entrega do painel e solicitações sem pedido de compra (Sienge, 05/10/2026).

Nenhum pedido mudou de pendente para entregue nesta semana.

4 pedidos no Sienge · 4 entregues · 0 com item pendente, somando **R\$ 0,00** a receber.

Nenhum pedido sem entrega confirmada até 05/10/2026.

Solicitações sem pedido de compra (2) — ≈ **R\$ 37.049,19** estimado pelos pedidos do Sienge

Solicitação	Finalidade	Itens ainda sem pedido	Entrega
29150 18/06/2026	FINALIDADE: REVESTIMENTO solicitado há 109 dias	PISO PORCELANATO — 548,80 m2 · R\$ 22.336,16 AZULEJO BRANCO BRILHANTE — 150 m² · R\$ 5.079,00 ≈ R\$ 27.415,16 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra

Solicitação	Finalidade	Itens ainda sem pedido	Entrega
29369 01/07/2026	FINALIDADE: REVISÃO ELÉTRICA QUADROS solicitado há 96 dias	Cabo flex 2,5mm² preto — 1 rol · R\$ 239,00 Cabo flex 2,5mm² verde — 1 rol · R\$ 239,00 Cabo flex 1,5mm² azul — 1 rol · R\$ 167,00 Cabo flex 1,5mm² amarelo — 1 rol · R\$ 167,00 Fita isolante — 7 rol · R\$ 61,74 DISJUNTOR BIPOLAR 16A — 6 un · R\$ 208,92 Cabo flex 1,5mm² branco — 1 rol · R\$ 167,00 DISJUNTOR BIPOLAR 25A — 8 un · R\$ 186,64 Luva 3/4 galv — 80 un · R\$ 304,00 Cabo flex 2,5mm² vermelho — 1 rol · R\$ 251,00 ≈ R\$ 9.634,03 estimado <i>... e mais 38 itens</i>	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES DA SEMANA


Pendências em aberto • Instalação da porta de vidro no corredor, solicitado diversas vezes e até o momento não instalado • Material sem isolamento no corredor de acesso ao estacionamento • Material sem isolamento no refeitório, acesso para qualquer pessoa • Pisos sem junta de dilatação executada • Pisos com degrau entre ambientes • Sem soleiras, mostrando o piso sob piso executado

REGISTRO FOTOGRÁFICO DA SEMANA




Latas de tintas sem isolamento no refeitório

05/10/2026

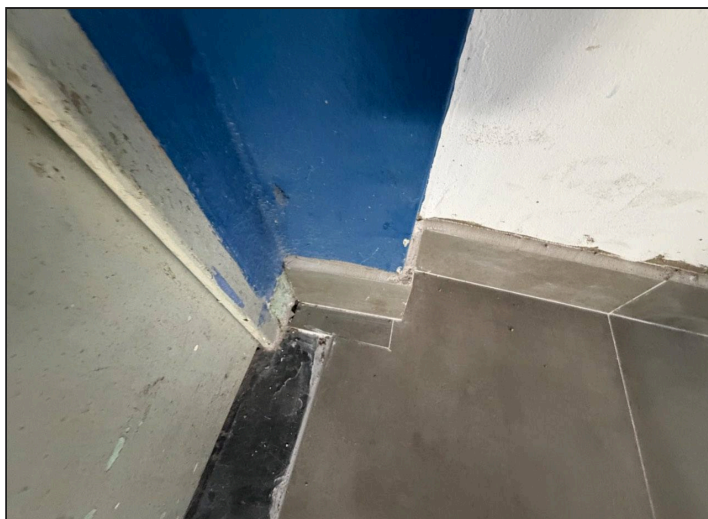


Acabamento do piso ficou ruim

05/10/2026

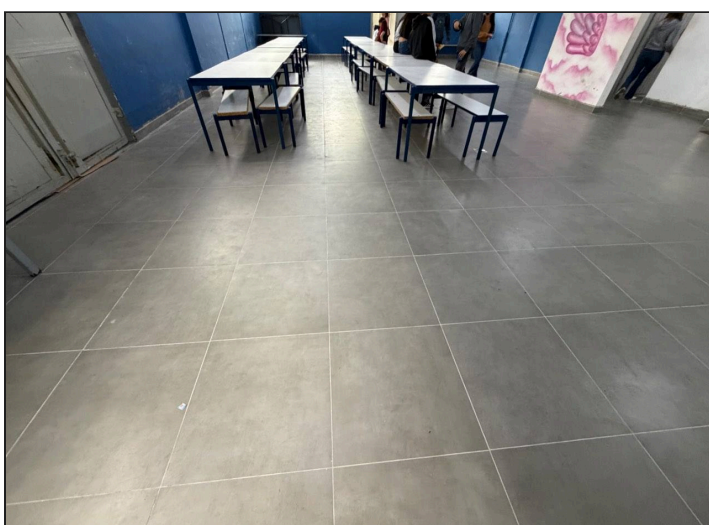


Piso refeitório sem junta de dilatação

05/10/2026

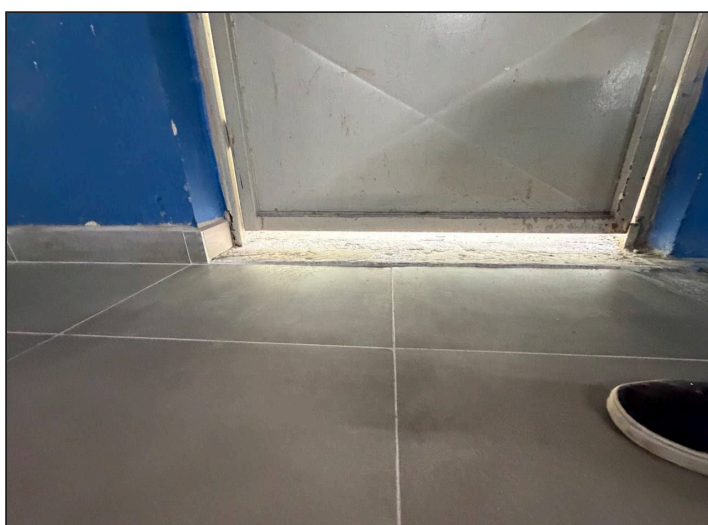


Degrau no acesso externo

05/10/2026

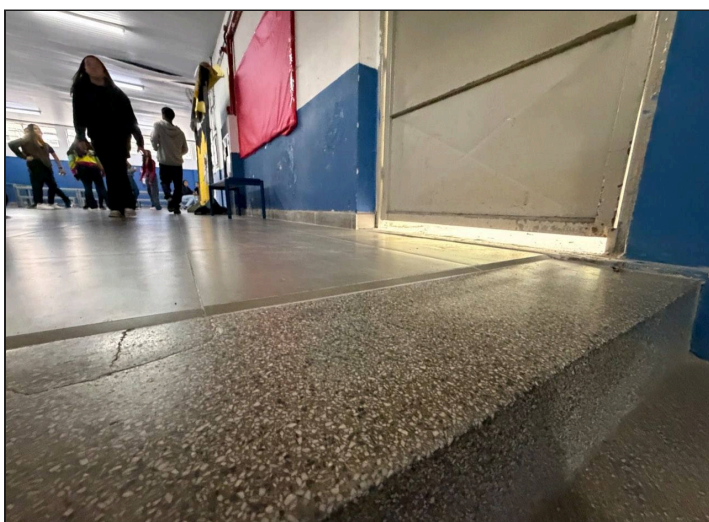

Registro da visita

05/10/2026

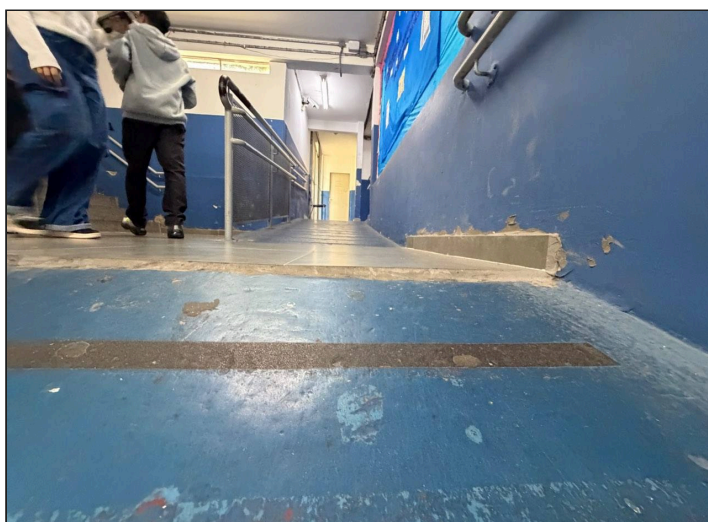

Registro da visita

05/10/2026



Não trocado soleira entre ambientes, degrau no piso 05/10/2026



Sem soleira, podendo danificar o piso 05/10/2026




Sem soleira, mostrando o piso sob piso 05/10/2026



Sem isolamento material no corredor acesso estacionamento 05/10/2026



Entulho no estacionamento 05/10/2026

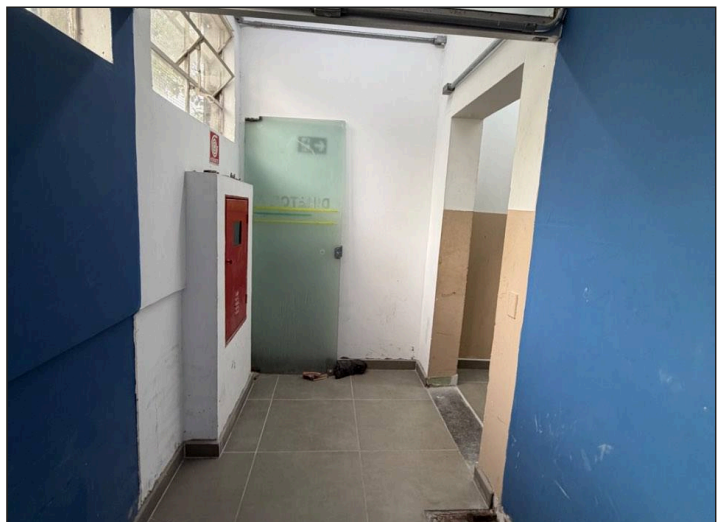

Porta removida ainda não foi instalada 05/10/2026



Danificado guarnição porta sala direção

05/10/2026

_____ LUIS JÚNIOR Eng. responsável — contratada	_____ RAFAEL Empreiteiro	_____ GUILHERME Fiscal / FDE
--	---	---

RELATÓRIO SEMANAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Consolidado das vistorias NR-18 da semana · Modelo único SST FDE rev01

Semana **41**

05/10/2026 a 09/10/2026

Obra: **278**

1 vistoria(s)

UNIDADE DE ENSINO 278 — EE GERTRUDES EDER		MUNICÍPIO ITAPECERICA DA SERRA / SP	CONTRATO FDE 70/00589/26-001-001
EMPREITEIRO LEONARDO ZANAO	CONTRATADA ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DOUGLAS	FISCAL FDE RENATO
PRAZO DECORRIDO NO FIM DA SEMANA início 11/06/2026 · término previsto 11/02/2027 · decorridos 120 de 245 dias (49%) · restam 125 dias na sexta-feira			

VISTORIAS DA SEMANA

DATA	RESPONSÁVEL	FASE	CLASSIFICAÇÃO	MÉDIA	CONFORMIDADE	NC
05/10/2026	Fernando	Pintura	REGULAR / ATENÇÃO	1,811	55%	0

REGULAR / ATENÇÃO

situação na última vistoria (05/10/2026) · média ponderada **1,811**
AÇÃO IMEDIATA — item com nota 4 (PÉSSIMO)

ITENS NÃO CONFORMES NA VISTORIA

DATA	ITEM	O QUE FOI VERIFICADO	NR
05/10/2026	7.1.1	Instalações sanitárias — lavatórios Utilizo o da zeladoria	NR-18.5 / NR-24
05/10/2026	7.1.2	Instalações sanitárias — vaso sanitário Vaso de descarga	NR-18.5 / NR-24
05/10/2026	7.1.3	Instalações sanitárias — mictório Não possui	NR-18.5 / NR-24
05/10/2026	7.1.4	Instalações sanitárias — chuveiro Não possui	NR-18.5 / NR-24
05/10/2026	7.2	Vestiário para troca de roupa dos colaboradores Não possui	NR-18.5.4 / NR-24.4
05/10/2026	7.4	Refeitório Mesa e cadeira da escola	NR-18.5.3
05/10/2026	7.5.1	Água potável — bebedouro disponível Precisa ter uma garrafa térmica	NR-24.6
05/10/2026	8.2	Pessoa treinada e autorizada (eletricista) Sem certificado de NR 10	NR-10.8
05/10/2026	23.2	Ordem e limpeza — resíduos, embalagens e circulações desobstruídas Não conforme com a NR 18	NR-18.19

NÃO CONFORMIDADES DA SEMANA — REGISTRO FOTOGRÁFICO

Nenhuma não conformidade registrada na semana.

Colaboradores lançados na vistoria mais completa da semana: 1.

Fernando
Responsável SST

DOUGLAS
Engenheiro responsável

LEONARDO ZANAO
Empreiteiro

RELATÓRIO SEMANAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Consolidado das vistorias NR-18 da semana · Modelo único SST FDE rev01

Semana **41**

05/10/2026 a 09/10/2026

Obra: **283**

1 vistoria(s)

UNIDADE DE ENSINO 283 — PARQUE PAYOL		MUNICÍPIO PIRAPORA DO BOM JESUS / SP	CONTRATO FDE 05/00177/26-001-001
EMPREITEIRO ARAUJO	CONTRATADA B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL LEONARDO	FISCAL FDE VINICIUS
PRAZO DECORRIDO NO FIM DA SEMANA início 02/07/2026 · término previsto 02/10/2026 · decorridos 99 de 92 dias (108%) · prazo vencido há 7 dias na sexta-feira			

VISTORIAS DA SEMANA

DATA	RESPONSÁVEL	FASE	CLASSIFICAÇÃO	MÉDIA	CONFORMIDADE	NC
05/10/2026	Reginaldo Eder	Completar a alvenaria e instalação de porta basculante	ÓTIMO	0,833	79%	0

ÓTIMO

situação na última vistoria (05/10/2026) · média ponderada **0,833**
MANTER O PADRÃO

ITENS NÃO CONFORMES NA VISTORIA

Nenhum item não conforme nas vistorias da semana.

NÃO CONFORMIDADES DA SEMANA — REGISTRO FOTOGRÁFICO

Nenhuma não conformidade registrada na semana.

ACOMPANHAMENTO

DATA	EFETIVO	ATIVIDADES	ITENS DE SST OBSERVADOS	PENDÊNCIAS
05/10/2026	5	termino da alvenaria, colocação de porta basculante	EPI's, organização e limpeza, extensões e seus conectores, escadas	nenhuma

Reginaldo Eder
Responsável SST

LEONARDO
Engenheiro responsável

ARAUJO
Empreiteiro

Gerado em 05/10/2026 18:34 · consolidado de 1 vistoria(s) do formulário do painel (283-muvg9qvvy). Os relatórios de cada vistoria ficam na aba Segurança.

ATA FDE CONTRATO ATA.FDE 42.283	RELATÓRIO SEMANAL DE ACOMPANHAMENTO Modelo conforme o Livro de Ocorrências da FDE · documento de acompanhamento da contratada	Semana 41
		05/10/2026 a 09/10/2026
		1 visita(s) registrada(s)
OBRA / UNIDADE DE ENSINO PARQUE PAYOL	CÓDIGO DO PRÉDIO 125103	
LOCAL PIRAPORA DO BOM JESUS	PI (PORTAL) 2025/04440	
ORDEM DE SERVIÇO —	CONTRATO FDE 05/00177/26-001-001	
EMPREITEIRO ARAUJO	ENG. RESPONSÁVEL / FISCAL FDE LEONARDO / VINICIUS	

RESUMO DA SEMANA

Data	Dia	Efetivo	Tempo	Ritmo	% execução (eng.)
05/10/2026	seg	5	Seco	Normal	77%

1 visita(s) entre 05/10/2026 e 09/10/2026 Execução: 77%. Previsão de término: .

AVANÇO DA OBRA

Indicador	%	Referência
Aprovado pela FDE (medições aprovadas)	1,8%	M001 aprovada · M002 em análise scm
Execução apontada pelo engenheiro	77%	visita de 09/10/2026
Fiscal da FDE — último livro de ocorrências	50%	LO nº 6 de 24/09/2026

SERVIÇOS EXECUTADOS NA SEMANA

- Execução de requadro para chumbamento e posterior instalação de balcão - Execução do chumbamento de janelas metálicas (ferro), incluindo fixação e alinhamento dos caixilhos
--

MATERIAIS — SITUAÇÃO DOS PEDIDOS EM 05/10/2026

Situação na data de emissão deste relatório (05/10/2026 às 20:20): pedidos do Sienge (01/01/2025 a 05/10/2026, exportação de 05/10/2026 19:13), marcações de entrega do painel e solicitações sem pedido de compra (Sienge, 05/10/2026).

Nenhum pedido mudou de pendente para entregue nesta semana.

6 pedidos no Sienge · 5 entregues · 1 com item pendente, somando R\$ 14.665,93 a receber.

1 pedido(s) sem entrega confirmada até 05/10/2026 — todos listados abaixo, do mais antigo para o mais novo.

Pedido	Fornecedor	Itens	Valor	Entrega
56008 04/09/2026	PERACINI & CIA LTDA pedido há 31 dias	44086 - PRATELEIRA DE GRANILITE DE (5,30 X 0,75 M) — 6 un 44091 - PRATELEIRA DE GRANILITE DE (1,40 X 0,60 M) — 3 un 44088 - PRATELEIRA DE GRANILITE DE (1,80 X 0,75 M) — 3 un 44087 - PRATELEIRA DE GRANILITE DE (5,00 X 0,75 M) — 2 un 44089 - PRATELEIRA DE GRANILITE DE (1,45 X 0,75 M) — 1 un 44084 - SUPORTE METÁLICO (55 X 35 CM) EM PERFIL "L" (38 X 38 X 3,2 MM) — 62 un 44092 - PRATELEIRA DE GRANILITE DE (1,20 X 0,60 M) — 1 un 44090 - SUPORTE METÁLICO (45 X 20 CM) EM PERFIL TREFILADO "T" (1 ¼" X 1 ¼" X 1/8") — 7 un	R\$ 14.665,60	PENDENTE marcado por Eng. Leonardo · 05/10/2026 11:11

Solicitações sem pedido de compra (5) — ≈ R\$ 807,66 estimado pelos pedidos do Sienge

Solicitação	Finalidade	Itens ainda sem pedido	Entrega
30356 11/08/2026	FINALIDADE: EXECUÇÃO E ADEQUAÇÃO DA COZINHA. *MEDIR IN LOCO ANTES DA FABRICAÇÃO/EXECUÇÃO.* solicitado há 55 dias	BS-05 BANCADA PARA COZINHA GRANITO POLIDO 20 MM 12,80 M — 1 un ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO 13,70 M — 1 un BA-10 BALCÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE GRANITO L = 350 CM — 1 un BA-11 BALCÃO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO L = 70 CM — 1 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
30357 11/08/2026	FINALIDADE: EXECUÇÃO E ADEQUAÇÃO DA COZINHA. *MEDIR IN LOCO ANTES DA FABRICAÇÃO/EXECUÇÃO.* solicitado há 55 dias	PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE L = 55 CM — 1 m PR-10 PRATELEIRA EM GRANILITE L = 70 CM — 12,70 m	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
30813 27/08/2026	FINALIDADE: COZINHA *IMAGENS EM ANEXO* solicitado há 39 dias	CHUMBADOR METÁLICO, TIPO "BOLT", Ø = 1/4" X 3" — 186 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
30814 27/08/2026	FINALIDADE: COZINHA *IMAGEM EM ANEXO* solicitado há 39 dias	Parafuso e bucha S8 Philips — 28 un · R\$ 8,96 ≈ R\$ 8,96 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
31450 24/09/2026	FINALIDADE: COZINHA solicitado há 11 dias	EX-01 Exaustor axial DN= 40cm — 1 un · R\$ 373,59 FT-02 Filtro para água — 3 un · R\$ 301,29 TORNEIRA ELETRICA - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465 — 1 un TORNEIRA DE USO RESTRITO DE 3/4" — 1 un · ≈ R\$ 123,82 ≈ R\$ 798,70 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES DA SEMANA
Recomendações à contratada - Envio de fotos no grupo da obra, registrando as pendências identificadas e a evolução dos serviços executados Pendências em aberto 01 - Retirada do balcão, com posterior requadro da alvenaria, deixando 5 cm de espaço para a instalação da pedra inferior do balcão e do passa-prato 02 - Instalação das janelas metálicas (ferro), com posicionamento, alinhamento e fixação dos caixilhos 03 - Assentamento de revestimento cerâmico (azulejos) e porcelanato, incluindo preparação e nivelamento das superfícies

REGISTRO FOTOGRÁFICO DA SEMANA




Pendência 01

05/10/2026




Pendência 01 e 03

05/10/2026

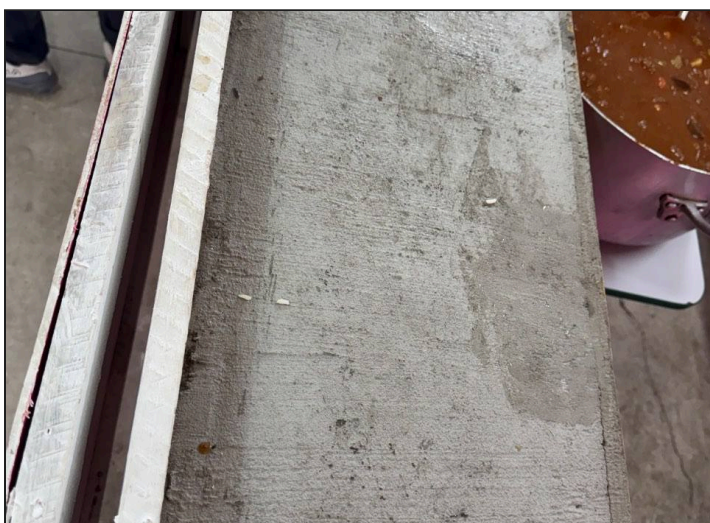


Registro da visita

05/10/2026

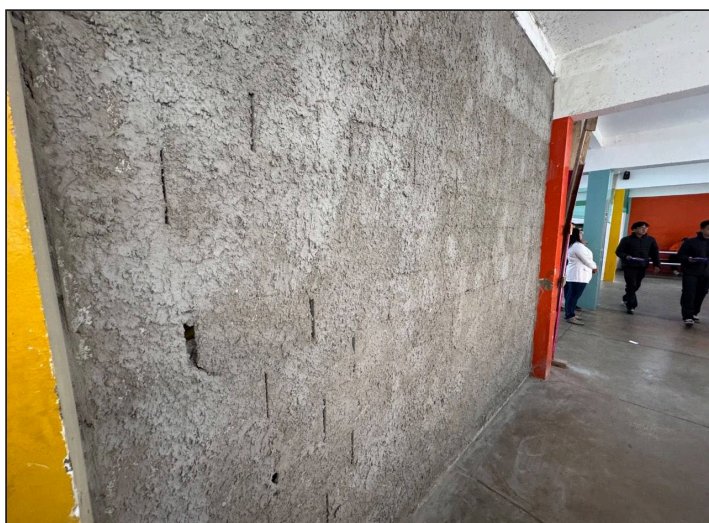

Registro da visita

05/10/2026

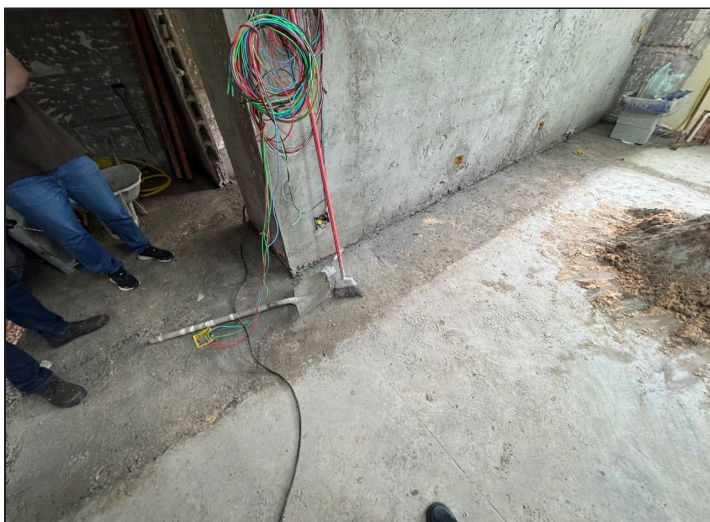

Registro da visita

05/10/2026



Registro da visita

05/10/2026



Registro da visita

05/10/2026



Registro da visita

05/10/2026



Pendência 02 e 03

05/10/2026

LEONARDO Eng. responsável — contratada	ARAUJO Empreiteiro	VINICIUS Fiscal / FDE
--	--	---

ATA FDE CONTRATO ATA.FDE 42.285	RELATÓRIO SEMANAL DE ACOMPANHAMENTO Modelo conforme o Livro de Ocorrências da FDE · documento de acompanhamento da contratada	Semana 41
		05/10/2026 a 09/10/2026
		1 visita(s) registrada(s)
OBRA / UNIDADE DE ENSINO CANDIDO RONDON MARECHAL		CÓDIGO DO PRÉDIO 117101
LOCAL ITAPEVI		PI (PORTAL) 2026/02302
ORDEM DE SERVIÇO —		CONTRATO FDE 05/00458/26-001-001
EMPREITEIRO LEONIZIO		ENG. RESPONSÁVEL / FISCAL FDE LEONARDO / VINICIUS

RESUMO DA SEMANA

Data	Dia	Efetivo	Tempo	Ritmo	% execução (eng.)
05/10/2026	seg	0	Chuva	Normal	99%

1 visita(s) entre 05/10/2026 e 09/10/2026 1 dia(s) de chuva. Execução: 99%. Previsão de término: .

AVANÇO DA OBRA

Indicador	%	Referência
Aprovado pela FDE (medições aprovadas)	7,6%	M001 aprovada · M002 em análise scm
Execução apontada pelo engenheiro	99%	visita de 09/10/2026
Fiscal da FDE — último livro de ocorrências	90%	LO nº 6 de 24/09/2026

SERVIÇOS EXECUTADOS NA SEMANA

- CONCLUSÃO DA OBRA (falta alguns detalhes) - Agendado para entrega com o Fiscal na Quinta-feira
--

MATERIAIS — SITUAÇÃO DOS PEDIDOS EM 05/10/2026

Situação na data de emissão deste relatório (05/10/2026 às 13:55): pedidos do Sienge (01/01/2026 a 02/10/2026, exportação de 02/10/2026 13:10), marcações de entrega do painel e solicitações sem pedido de compra (Sienge, 01/10/2026).

Nenhum pedido mudou de pendente para entregue nesta semana.

3 pedidos no Sienge · 3 entregues · 0 com item pendente, somando R\$ 0,00 a receber.

Nenhum pedido sem entrega confirmada até 05/10/2026.

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES DA SEMANA

Pendências em aberto 01 - Retoque de pintura na janela- (Pátio) 02 - Acabamento (piso de concreto)

REGISTRO FOTOGRÁFICO DA SEMANA



Registro da visita

05/10/2026



Registro da visita

05/10/2026



Registro da visita

05/10/2026




Pendência 02

05/10/2026




Registro da visita

05/10/2026

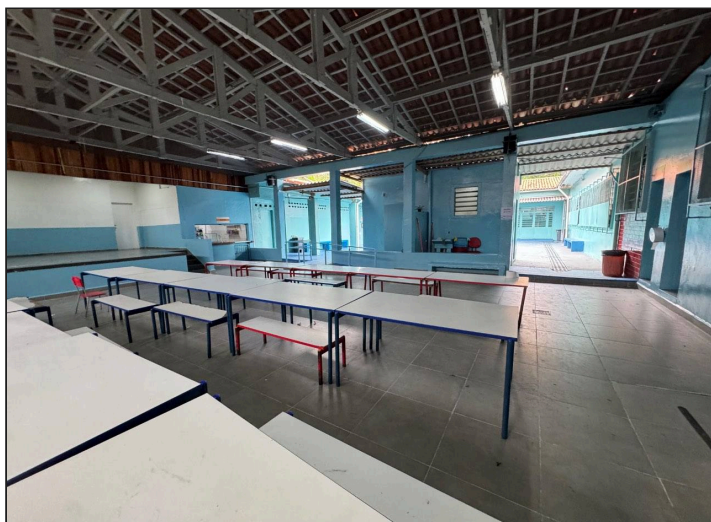

Registro da visita

05/10/2026

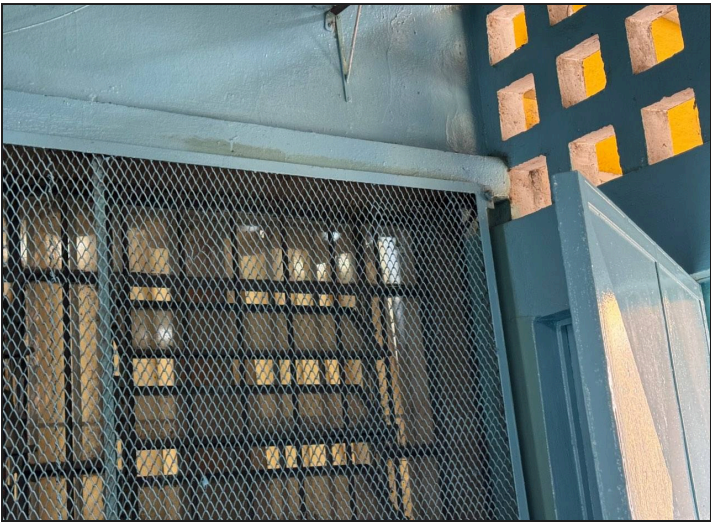

Pendência 01

05/10/2026



Registro da visita

05/10/2026



Registro da visita

05/10/2026

LEONARDO Eng. responsável — contratada	LEONIZIO Empreiteiro	VINICIUS Fiscal / FDE
--	--	---

ATA FDE CONTRATO ATA.FDE 41.286	RELATÓRIO SEMANAL DE ACOMPANHAMENTO Modelo conforme o Livro de Ocorrências da FDE · documento de acompanhamento da contratada	Semana 41
		05/10/2026 a 09/10/2026
		1 visita(s) registrada(s)
OBRA / UNIDADE DE ENSINO EE MARIA CATHARINA COMINO	CÓDIGO DO PRÉDIO 136112	
LOCAL TABOÃO DA SERRA	PI (PORTAL) 2026/01150	
ORDEM DE SERVIÇO —	CONTRATO FDE 05/00188/26-001-001	
EMPREITEIRO LUCAS EMPREITEIRO	ENG. RESPONSÁVEL / FISCAL FDE Douglas / FABIO	

RESUMO DA SEMANA

Data	Dia	Efetivo	Tempo	Ritmo	% execução (eng.)
05/10/2026	seg	0	Seco	Parado	25%

1 visita(s) entre 05/10/2026 e 09/10/2026 Execução: **25%**. Previsão de término: .

AVANÇO DA OBRA

Indicador	%	Referência
Aprovado pela FDE (medições aprovadas)	13%	M001 a M002 aprovadas · M003 em edição fiscal
Execução apontada pelo engenheiro	25%	visita de 09/10/2026
Fiscal da FDE — último livro de ocorrências	23%	LO nº 9 de 30/09/2026

SERVIÇOS EXECUTADOS NA SEMANA

- Pintura estrutura quadra - Pintura interna - Elétrica

MATERIAIS — SITUAÇÃO DOS PEDIDOS EM 05/10/2026

Situação na data de emissão deste relatório (05/10/2026 às 18:31): pedidos do Sienge (01/01/2026 a 02/10/2026, exportação de 02/10/2026 13:10), marcações de entrega do painel e solicitações sem pedido de compra (Sienge, 01/10/2026).

Nenhum pedido mudou de pendente para entregue nesta semana.

17 pedidos no Sienge · 17 entregues · 0 com item pendente, somando **R\$ 0,00** a receber.

Nenhum pedido sem entrega confirmada até 05/10/2026.

Solicitações sem pedido de compra (10) — ≈ **R\$ 62.193,75** estimado pelos pedidos do Sienge

Solicitação	Finalidade	Itens ainda sem pedido	Entrega
29572 13/07/2026	FINALIDADE: AGUAS PLUVIAIS solicitado há 84 dias	Luva 100mm — 10 un · ≈ R\$ 48,20 TUBO PVC 100MM — 10 br · R\$ 788,50 CURVA 45 X 100MM — 10 un ≈ R\$ 836,70 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
29573 13/07/2026	FINALIDADE: AGUAS PLUVIAIS solicitado há 84 dias	Tubo pvc ocre 200mm — 10 br · ≈ R\$ 5.683,30 TC-11 35CM — 100 m · ≈ R\$ 10.166,00 ≈ R\$ 15.849,30 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
29575 13/07/2026	FINALIDADE: TAPUME FDE ISOLAMENTO TALUDE solicitado há 84 dias	ADESIVO LOGO DO FDE — 3 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra

Solicitação	Finalidade	Itens ainda sem pedido	Entrega
29578 13/07/2026	FINALIDADE: COMPONENTE ESPORTIVO *TABELA EM CHAPA DE COMPENSADO COM COLAGEM FENÓLICA, E = 20 MM E REQUADRO COM PERFIL METÁLICO GALVANIZADO "U" OU "L"; ARO COM DIÂMETRO INTERNO DE 450 MM EM BARRA REDONDA GALVANIZADA DE 16 MM < Ø < 20 MM; REDE EM MALHA DE NYLON PRESA AO ARO EM 12 PONTOS, COMPRIMENTO ENTRE 400 A 450 MM; SUPORTE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, E = 3/16"* solicitado há 84 dias	TABELA DE BASQUETE COM ARO E CESTO — 2 un · R\$ 2.160,00 QE-02 Poste para rede de voleibol — 1 un · R\$ 1.440,00 QE-03 Trave de futebol de salão — 2 un · R\$ 2.357,00 TRELIÇA: CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS "L" EM AÇO ASTM A-36: 1 1/2" X 1/8" (38 X 3,2 MM); 1 1/4" X 1/8" (32 X 3,2 MM) E 2 1/2" X 3/8" (64 X 9,5 MM) — 2 un ≈ R\$ 5.957,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
29580 13/07/2026	FINALIDADE: FORMA QE-37 solicitado há 84 dias	FORMA DE PAPELAO D=30CM ALT=4,0M — 2 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
30182 04/08/2026	FINALIDADE: COBERTURA METÁLICA BLOCO 01 solicitado há 62 dias	Eletrodo 3,25mm — 5 kg · R\$ 147,15 PARAFUSO SEXTAVADO AUTOBROCANTE COM ARRUELA 5,5X38MM — 1.000 un · R\$ 500,00 VIGA UE 127X50X17MM #2,65MM — 110 br · R\$ 23.485,00 DISCO DE CORTE INOX 180X1,6X22MM (7"X1/16"X7/8") — 50 un · R\$ 380,00 ≈ R\$ 24.512,15 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
30724 25/08/2026	FINALIDADE: CANALETA EM TORNO DA QUADRA *ARQUIVO EM ANEXO* solicitado há 41 dias	TAMPA DE CONCRETO PADRÃO FDE 59,5 CM X 24,5 CM TC-10 — 80 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
30944 02/09/2026	FINALIDADE: REVESTIMENTO solicitado há 33 dias	CAÇAMBA — 1 un · R\$ 480,00 ≈ R\$ 480,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
31087 09/09/2026	FINALIDADE: LIMPEZA DE OBRA solicitado há 26 dias	CAÇAMBA — 1 un · R\$ 480,00 ≈ R\$ 480,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
31184 16/09/2026	FINALIDADE: PINTURA E ELÉTRICA solicitado há 19 dias	Rolo de Espuma 9cm — 10 un · R\$ 60,80 Cabo flex 4mm² preto — 100 m · R\$ 399,00 Cabo flex 4mm² azul — 100 m · R\$ 399,00 Terminal pino 2,5mm — 1 pct Cabo flex 2,5mm² preto — 100 m · R\$ 239,00 cabo flex 2,5mm azul — 100 m · R\$ 252,00 TINTA ACRILICA CONCRETO 18L — 15 lt · ≈ R\$ 5.325,00 Rolo lã de carneiro 23cm — 3 un · ≈ R\$ 73,50 Disjuntor bipolar 60A — 1 un · R\$ 69,90 DISJUNTOR UNIPOLAR 20A — 8 un · R\$ 70,40 ≈ R\$ 14.078,60 estimado ... e mais 4 itens	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES DA SEMANA

Observações

- Sala dos professores, luminaria sem funcionar
- Sala coordenadora 1pav, pintura sem realizar
- Cobertura parada
- Piso pátio sem finalizar a mais de 40 dias

Recomendações à contratada

- Aumentar efetivo, finalizar adequação hidráulica incêndio, e finalizar piso pátio

Pendências em aberto


- Tampa de concreto canaleta

REGISTRO FOTOGRÁFICO DA SEMANA



Registro da visita

05/10/2026

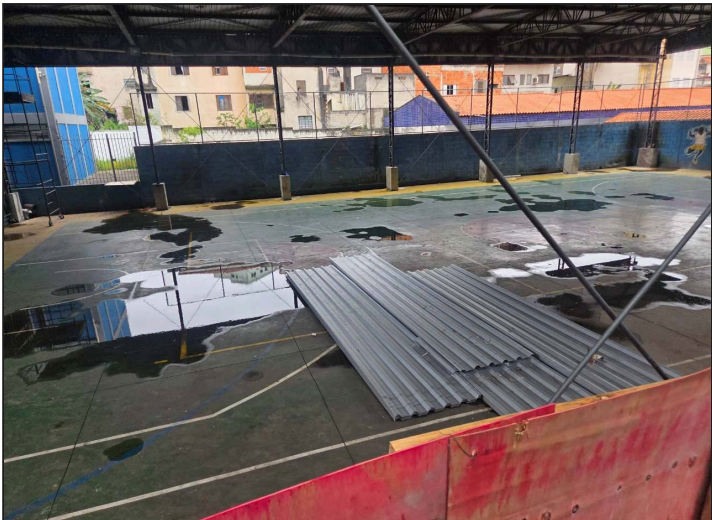

Registro da visita

05/10/2026

Douglas Eng. responsável — contratada	LUCAS EMPREITEIRO Empreiteiro	FABIO Fiscal / FDE
---	---	--

ATA FDE CONTRATO ATA.FDE 41.287	RELATÓRIO SEMANAL DE ACOMPANHAMENTO Modelo conforme o Livro de Ocorrências da FDE · documento de acompanhamento da contratada	Semana 41
		05/10/2026 a 09/10/2026
		1 visita(s) registrada(s)
OBRA / UNIDADE DE ENSINO EETPROF LAERT ALMEIDA SÃO BERNARDO		CÓDIGO DO PRÉDIO 136207
LOCAL TABOÃO DA SERRA		PI (PORTAL) 2026/01149
ORDEM DE SERVIÇO —		CONTRATO FDE 05/00008/26-001-001
EMPREITEIRO PEDRO		ENG. RESPONSÁVEL / FISCAL FDE Douglas / FABIO

RESUMO DA SEMANA

Data	Dia	Efetivo	Tempo	Ritmo	% execução (eng.)
05/10/2026	seg	6	Seco	Lento	20%

1 visita(s) entre 05/10/2026 e 09/10/2026 Execução: **20%**. Previsão de término: .

AVANÇO DA OBRA

Indicador	%	Referência
Aprovado pela FDE (medições aprovadas)	10,5%	M001 a M002 aprovadas · M003 em edição fiscal
Execução apontada pelo engenheiro	20%	visita de 09/10/2026
Fiscal da FDE — último livro de ocorrências	20%	LO nº 9 de 30/09/2026

SERVIÇOS EXECUTADOS NA SEMANA

- Muro - Sanitário - Elétrica

MATERIAIS — SITUAÇÃO DOS PEDIDOS EM 05/10/2026

Situação na data de emissão deste relatório (05/10/2026 às 18:30): pedidos do Sienge (01/01/2026 a 02/10/2026, exportação de 02/10/2026 13:10), marcações de entrega do painel e solicitações sem pedido de compra (Sienge, 01/10/2026).

Nenhum pedido mudou de pendente para entregue nesta semana.

31 pedidos no Sienge · 30 entregues · 1 com item pendente, somando **R\$ 3.091,40** a receber.

1 pedido(s) sem entrega confirmada até 05/10/2026 — todos listados abaixo, do mais antigo para o mais novo.

Pedido	Fornecedor	Itens	Valor	Entrega
56759 22/09/2026	KPR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA pedido há 13 dias	143 - CIMENTO — 40 sc 5673 - Areia média — 6 m³	R\$ 3.091,40	PENDENTE marcado por Eng. Douglas · 05/10/2026 13:03

Solicitações sem pedido de compra (21) — ≈ R\$ 43.885,16 estimado pelos pedidos do Sienge

Solicitação	Finalidade	Itens ainda sem pedido	Entrega
29585 13/07/2026	FINALIDADE: LINHAS DEMARCATÓRIAS DA QUADRA DE ESPORTES solicitado há 84 dias	Linha de pedreiro — 2 un · R\$ 16,74 ≈ R\$ 16,74 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra

Solicitação	Finalidade	Itens ainda sem pedido	Entrega
29586 13/07/2026	FINALIDADE: COMPONENTE ESPORTIVO solicitado há 84 dias	QE-02 Poste para rede de voleibol — 1 un · R\$ 1.440,00 QE-03 Trave de futebol de salão — 2 un · R\$ 2.357,00 ≈ R\$ 3.797,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
29588 13/07/2026	FINALIDADE: TAPUME FDE ISOLAMENTO TALUDE solicitado há 84 dias	PREGO 18X27 — 3 kg · R\$ 60,00 Broxa retangular — 2 un · R\$ 29,28 Madeirite 6mm Rosa — 40 fl · R\$ 1.360,00 TINTA BRANCA LÁTEX BASE ÁGUA 18L — 1 lt · R\$ 207,00 PONTALETE 6X6 3 M PINUS — 30 un · R\$ 480,00 SARRAFO 10 CM 3M — 40 un · R\$ 400,00 BISNAGA CORANTE AZUL ESCURO — 3 un · R\$ 27,24 ADESIVO LOGO DO FDE — 3 un ≈ R\$ 2.563,52 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
29589 13/07/2026	FINALIDADE: PISO DE CONCRETO solicitado há 84 dias	Arame recozido n.18 — 20 kg · R\$ 420,00 TELA Q-92 3X2M — 45 un · R\$ 3.096,00 ≈ R\$ 3.516,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
29596 13/07/2026	FINALIDADE: MURO DE DIVISA solicitado há 84 dias	Aço 6,3 mm — 40 br · R\$ 1.337,20 ≈ R\$ 1.337,20 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
29598 13/07/2026	FINALIDADE: MURO DE DIVISA solicitado há 84 dias	CIMALHA PRÉ-MOLDADA — 100 m · ≈ R\$ 3.960,00 ≈ R\$ 3.960,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
29600 13/07/2026	FINALIDADE: TAPUME FDE ISOLAMENTO TALUDE solicitado há 84 dias	ADESIVO LOGO DO FDE — 3 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
29601 13/07/2026	FINALIDADE: AGUAS PLUVIAIS solicitado há 84 dias	CANAleta DE CONCRETO 1/2 CANA DN 60CM — 100 m TC-05 TAMPA DE CONCRETO 35CM — 100 m	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
30337 10/08/2026	FINALIDADE: DESCIDA PLUVIAL solicitado há 56 dias	Tubo de cola para PVC — 2 l Cotovelo 45° x 100mm — 20 un LIXA FERRO 150 — 100 un · R\$ 400,00 TUBO PVC 100MM — 15 br · R\$ 1.182,75 ≈ R\$ 1.582,75 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
30589 19/08/2026	FINALIDADE: TAPUME E MURO solicitado há 47 dias	Cimento CP-II 50kg — 50 sc SARRAFO 10 CM 3M — 15 un · R\$ 150,00 AREIA MÉDIA LAVADA — 6 m³ · ≈ R\$ 1.460,10 MADEIRITE PLASTIFICADO ROSA 1,10 X 2,20M — 10 fl ≈ R\$ 1.610,10 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
30653 21/08/2026	FINALIDADE: TAPUME solicitado há 45 dias	THINNER 18l — 3 un · R\$ 943,35 SARRAFO 10 CM 3M — 40 un · R\$ 400,00 COMPENSADO RESINADO FENÓLICO (MADEIRITE ROSA), 2,20 X 1,10 M — 35 fl PONTALETE DE MADEIRA 5 X 5 CM X 3M — 40 un ≈ R\$ 1.343,35 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
30654 21/08/2026	FINALIDADE: MURO E PINTURA solicitado há 45 dias	Tinta látex Branco 18L — 6 lt · R\$ 2.010,00 CIMENTO CPII — 50 sc · R\$ 2.223,00 AREIA MÉDIA LAVADA — 6 m³ · ≈ R\$ 1.460,10 ≈ R\$ 5.693,10 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
30661 21/08/2026	FINALIDADE: OBRA GERAL solicitado há 45 dias	Rejunte branco — 25 kg · R\$ 200,00 Rejunte cinza platina — 15 kg · R\$ 120,60 ≈ R\$ 320,60 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
31118 11/09/2026	FINALIDADE: BANCADA SANITARIOS *ARQUIVO EM ANEXO* solicitado há 24 dias	BANCADA CONFORME PADRAO FDE LT06, PARA 3 CUBAS — 2 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
31119 11/09/2026	FINALIDADE: SANITARIOS solicitado há 24 dias	SOLEIRA CORUMBA 0,96 X 0,25 — 1 un SOLEIRA CORUMBA 0,96 X 0,29 — 1 un SOLEIRA CORUMBA 0,97 X 0,27 — 1 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra

Solicitação	Finalidade	Itens ainda sem pedido	Entrega
31120 11/09/2026	FINALIDADE: QUADRA solicitado há 24 dias	LONA PLASTICA PRETA 200 MICRAS — 600 m² TELA SOLDADA Q92, 2,00 X 3,00 M — 95 un ESPAÇADOR PLÁSTICO TIPO CADEIRINHA PARA TELA SOLDADA — 550 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
31121 11/09/2026	FINALIDADE: SANT *FECHADURA LIVRE/OCUPADO CROMADA, LINHA SILVANA, FERROLHO 530* solicitado há 24 dias	Fechadura tipo livre / ocupado — 7 un · R\$ 350,00 Dobradiça — 10 jg · R\$ 100,00 FECHADURA ROSETA EXTERNA — 3 un PORTA PARA PINTURA 0,62 X 1,65M — 6 un PORTA PARA PINTURA 0,92 X 1,65M — 1 un PORTA PARA PINTURA 0,92 X 2,10M — 3 un FLANGE PARA TORNEIRA AUTOMÁTICA ANTIVANDALISMO — 6 un ≈ R\$ 450,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
31289 18/09/2026	FINALIDADE: PINTURA solicitado há 17 dias	Aguarrás — 36 l · R\$ 574,20 TINTA MARFIM LÁTEX 18L — 10 lt · ≈ R\$ 3.350,00 TINTA LÁTEX VERDE KIWI 18L — 10 un · R\$ 3.650,00 VERDE NILO ESMALTE SINTÉTICO 3,6L — 2 gl · ≈ R\$ 217,50 TINTA LÁTEX SUPER BRANCO — 10 lt · ≈ R\$ 3.350,00 TINTA LÁTEX VERDE SELVA — 10 lt · ≈ R\$ 2.900,00 ESMALTE SINTÉTICO CREME — 12 gl ESMALTE SINTÉTICO PLATINA — 12 gl ESMALTE SINTÉTICO ROMANCE — 2 gl ≈ R\$ 14.041,70 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
31455 24/09/2026	FINALIDADE: MURO solicitado há 11 dias	Areia média — 6 m³ · R\$ 1.460,10 Cimento CP-II 50kg — 40 sc ≈ R\$ 1.460,10 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
31457 24/09/2026	FINALIDADE: ELÉTRICA solicitado há 11 dias	Cabo flex 2,5mm² preto — 200 m · R\$ 504,00 TAMPA CEGA PARA CONDULETE 3/4 GALVANIZADO — 400 un · R\$ 1.600,00 ≈ R\$ 2.104,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
31461 24/09/2026	FINALIDADE: ALAMBRADO *ELETRODO REVESTIDO E6013 2,5MM (FINO) PARA SOLDA DE AÇO GALVANIZADO* solicitado há 11 dias	ARAME GALVANIZADO N.12 — 20 kg Eletrodo 2,5mm — 5 kg · R\$ 89,00 ≈ R\$ 89,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES DA SEMANA

Pendências em aberto


- Finalizar sanitário masculino
- Areia e thinner

REGISTRO FOTOGRÁFICO DA SEMANA




Registro da visita

05/10/2026

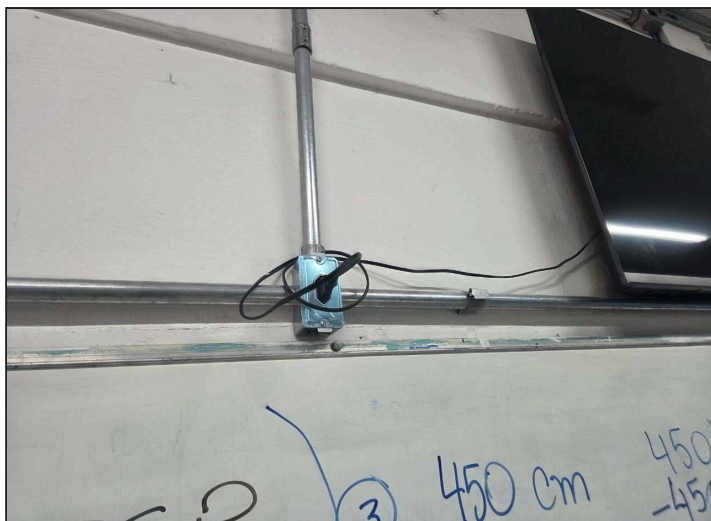

Registro da visita

05/10/2026

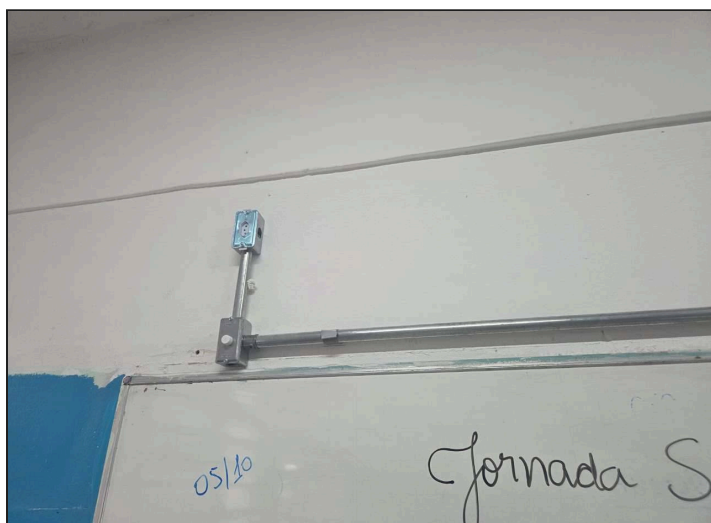


Registro da visita

05/10/2026




Registro da visita

05/10/2026

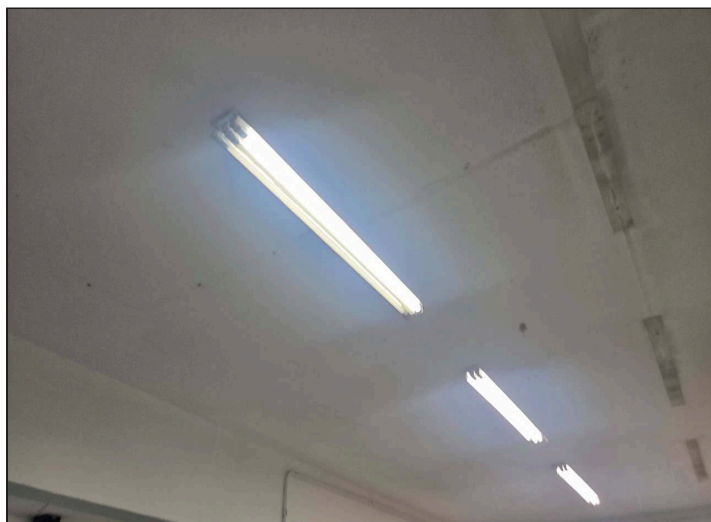

Registro da visita

05/10/2026

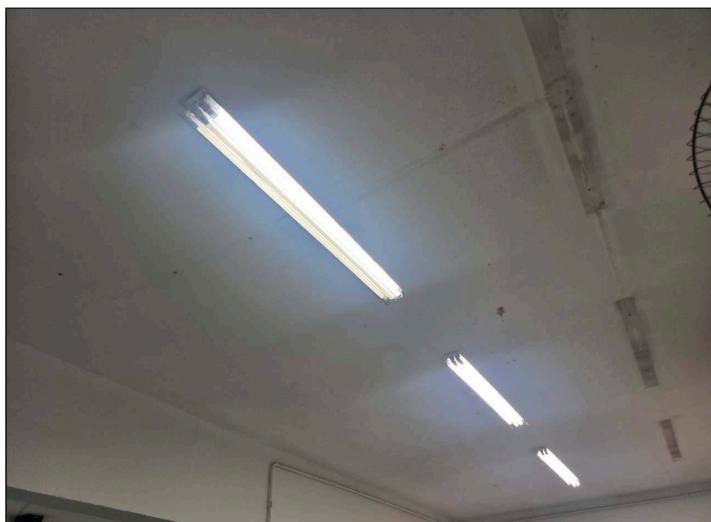


Registro da visita

05/10/2026




Registro da visita

05/10/2026

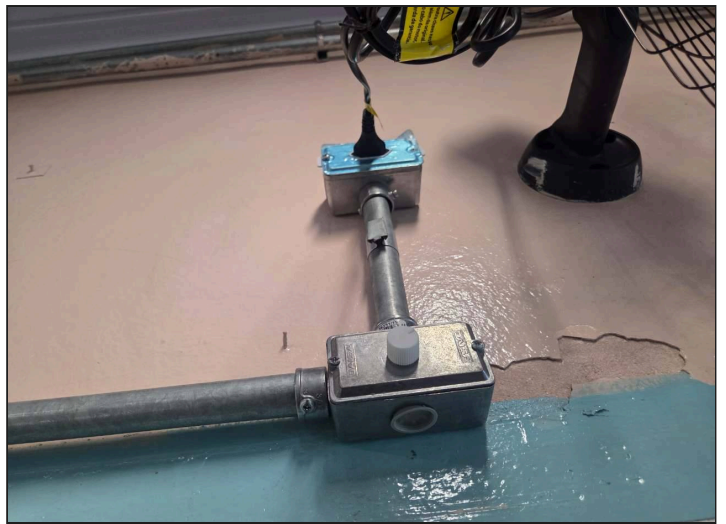

Registro da visita

05/10/2026

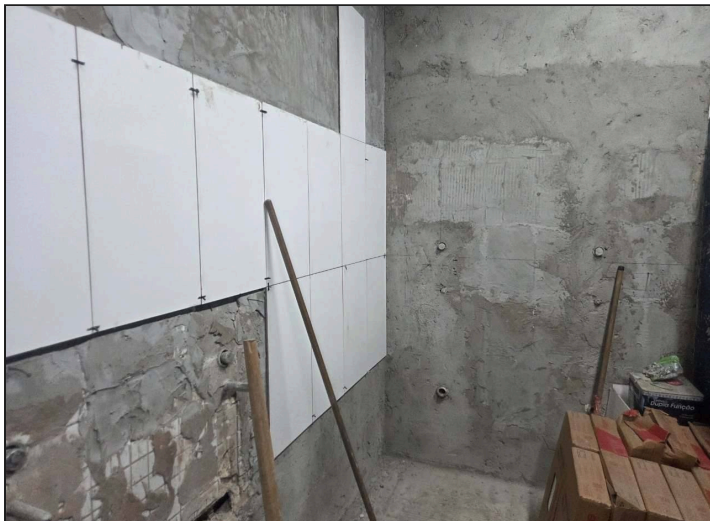

Registro da visita

05/10/2026



Registro da visita

05/10/2026



Registro da visita

05/10/2026



Registro da visita

05/10/2026



Registro da visita

05/10/2026



Registro da visita

05/10/2026



Registro da visita

05/10/2026

Douglas Eng. responsável — contratada	PEDRO Empreiteiro	FABIO Fiscal / FDE
--	--	---

ATA FDE CONTRATO ATA.FDE 41.288	RELATÓRIO SEMANAL DE ACOMPANHAMENTO Modelo conforme o Livro de Ocorrências da FDE · documento de acompanhamento da contratada	Semana 41
		05/10/2026 a 09/10/2026
		1 visita(s) registrada(s)
OBRA / UNIDADE DE ENSINO EE EDUARDO VAZ		CÓDIGO DO PRÉDIO 109111
LOCAL EMBU DAS ARTES		PI (PORTAL) 2025/04667
ORDEM DE SERVIÇO —		CONTRATO FDE 05/00007/26-001-001
EMPREITEIRO ANTONIO CABELO		ENG. RESPONSÁVEL / FISCAL FDE Douglas / FABIO

RESUMO DA SEMANA

Data	Dia	Efetivo	Tempo	Ritmo	% execução (eng.)
05/10/2026	seg	1	Seco	Lento	25%

1 visita(s) entre 05/10/2026 e 09/10/2026 Execução: **25%**. Previsão de término: .

AVANÇO DA OBRA

Indicador	%	Referência
Aprovado pela FDE (medições aprovadas)	9%	M001 a M002 aprovadas · M003 em edição fiscal
Execução apontada pelo engenheiro	25%	visita de 09/10/2026
Fiscal da FDE — último livro de ocorrências	20%	LO nº 9 de 29/09/2026

SERVIÇOS EXECUTADOS NA SEMANA

- Execução da limpeza da obra - Remoção de telhas e madeiramento
--

MATERIAIS — SITUAÇÃO DOS PEDIDOS EM 05/10/2026

Situação na data de emissão deste relatório (05/10/2026 às 19:21): pedidos do Sienge (01/01/2025 a 05/10/2026, exportação de 05/10/2026 19:13), marcações de entrega do painel e solicitações sem pedido de compra (Sienge, 05/10/2026).

Nenhum pedido mudou de pendente para entregue nesta semana.

14 pedidos no Sienge · 14 entregues · 0 com item pendente, somando **R\$ 0,00** a receber.

Nenhum pedido sem entrega confirmada até 05/10/2026.

Solicitações sem pedido de compra (9) — ≈ R\$ 37.743,95 estimado pelos pedidos do Sienge

Solicitação	Finalidade	Itens ainda sem pedido	Entrega
29584 13/07/2026	FINALIDADE: FORRO SALA DE AULA solicitado há 84 dias	Balde (20kg) Massa Corrida — 20 un · R\$ 1.047,40 PERFIL F 530 - CANALETA — 427 pç · R\$ 5.525,38 PENDURAL F 530 — 1.000 un · R\$ 1.220,00 UNIÃO F 530 — 380 un · R\$ 372,40 PARAFUSO PPA 25MM — 1.000 un · R\$ 20,00 PARAFUSO PFM 13MM — 2.000 un · R\$ 80,00 CHAPA DRYWALL ST BR 12,5MM 1200 X 1800 — 400 un · R\$ 16.464,00 TIRANTE RÍGIDO - NO. 10 (REB = 1,00 M) — 1.000 un · R\$ 1.550,00 FITA PARA JUNTA — 10 rol · R\$ 196,30 TABICA OU CANTONEIRA 25 X 30 X 3.000 - (*) — 247 un · ≈ R\$ 3.509,87 ≈ R\$ 29.985,35 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
29935 23/07/2026	FINALIDADE: ESTRUTURA METÁLICA E INSUMOS PARA COBERTURA DA UNIDADE ESCOLAR *IMAGEM EM ANEXO* solicitado há 74 dias	ELETRODO 6013 2,5 — 40 kg · R\$ 748,00 Disco de corte 4" — 50 un · R\$ 160,00 Disco de desbaste 4" — 20 un · R\$ 140,00 DISCO DE CORTE 9" — 50 un · R\$ 2.000,00 VIGA U 150X60X20 X 2,65MM — 430 un VIGA U SIMPLES 100X40MM — 200 un ≈ R\$ 3.048,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
30796 27/08/2026	FINALIDADE: TAPUME solicitado há 39 dias	TINTA LÁTEX PVA/ACRÍLICA, COR AZUL SERENO 18L — 1 lt · ≈ R\$ 365,00 TINTA LÁTEX PVA/ACRÍLICA, COR BRANCO 18L — 1 lt · ≈ R\$ 426,00 ≈ R\$ 791,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
31183 16/09/2026	FINALIDADE: LIMPEZA DE OBRA solicitado há 19 dias	CAÇAMBA — 2 un · R\$ 960,00 ≈ R\$ 960,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
31220 16/09/2026	FINALIDADE: CALAFETAÇÃO DOS PARAFUSOS solicitado há 19 dias	Cola PU40 branco — 30 tb	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
31223 16/09/2026	FINALIDADE: LIMPEZA DE OBRA solicitado há 19 dias	CAÇAMBA — 2 un · R\$ 960,00 ≈ R\$ 960,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
31231 16/09/2026	FINALIDADE: TELHADO solicitado há 19 dias	Roda para andaime — 8 pç · R\$ 182,64 Peças Andaime — 24 un · R\$ 406,56 TRAVA DIAGONAL — 4 un · R\$ 20,00 Plataforma 1,50m para andaime — 12 un · R\$ 248,40 Sapata para andaime — 8 un · R\$ 160,00 ESCADA — 1 un · R\$ 22,00 ≈ R\$ 1.039,60 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
31334 21/09/2026	FINALIDADE: ELETRICA *LUMINÁRIA CALHA COMERCIAL C/ REFLETOR EM ALUMÍNIO ALTO RENDIMENTO DE SOBREPOR PARA LÂMPADA LED T8 2X18W FDE - IL-45* solicitado há 14 dias	SOQUETE PARA LAMP. FLUORESCENTE ENCAIXE RAPIDO — 240 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
31528 28/09/2026	FINALIDADE: LIMPEZA solicitado há 7 dias	TROCA DE CAÇAMBA — 2 un · R\$ 960,00 ≈ R\$ 960,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES DA SEMANA

Recomendações à contratada

- Agilizar a limpeza da obra e melhorar isolamento dos materiais e locais de trabalho

Pendências em aberto

- Isolamento material

REGISTRO FOTOGRÁFICO DA SEMANA



Falta limpeza e remoção do material

05/10/2026



Falta limpeza e remoção do material

05/10/2026




Falta limpeza e remoção do material

05/10/2026



Falta limpeza e remoção do material

05/10/2026

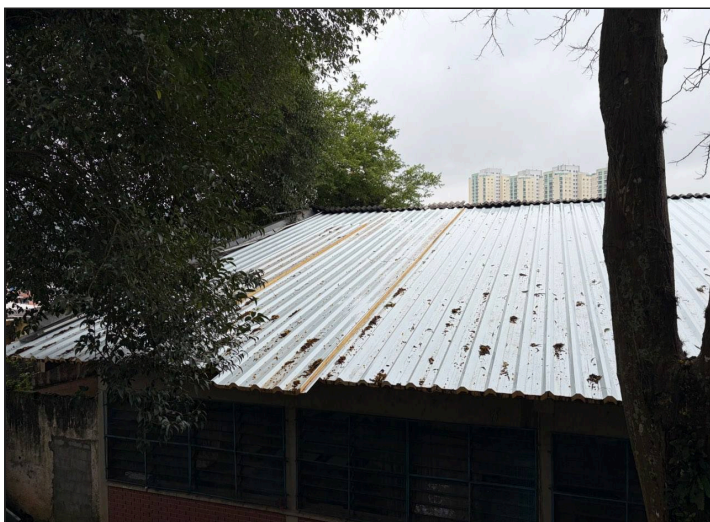

Telha em cima podendo voar

05/10/2026



Falta limpeza e remoção do material

05/10/2026



Falta limpeza e remoção do material

05/10/2026



Falta limpeza e remoção do material

05/10/2026



Falta limpeza e remoção do material

05/10/2026




Falta isolamento do material

05/10/2026




Falta isolamento do material

05/10/2026

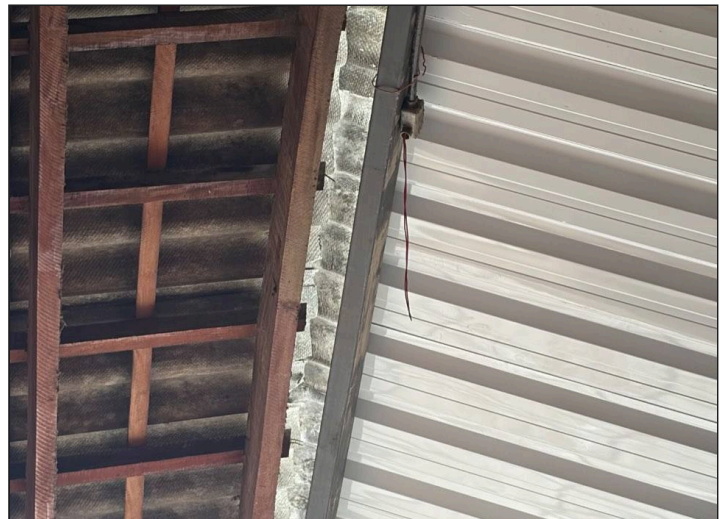


Tubulação e cabos pendurados

05/10/2026

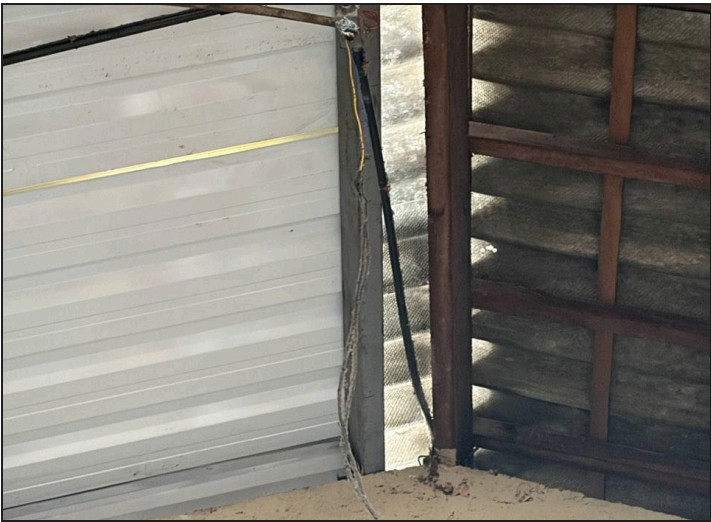


Vão entre telhas instaladas

05/10/2026

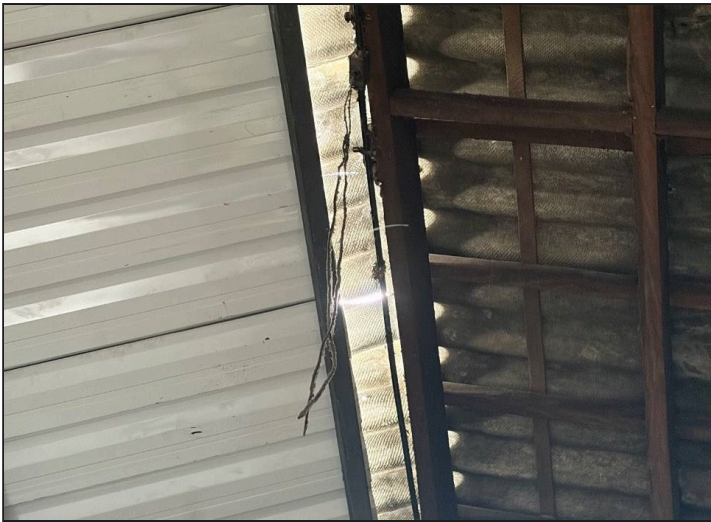

Tubulação e fios penduras

05/10/2026

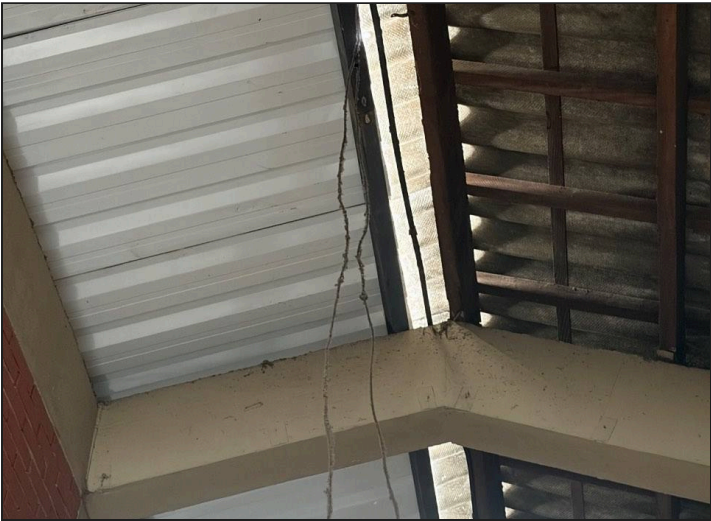

Tubulação e fios pendurados

05/10/2026

_____ LUIS JÚNIOR Eng. responsável — contratada	_____ ANTONIO CABELO Empreiteiro	_____ FABIO Fiscal / FDE
--	---	---

ATA FDE CONTRATO ATA.FDE 41.289	RELATÓRIO SEMANAL DE ACOMPANHAMENTO Modelo conforme o Livro de Ocorrências da FDE · documento de acompanhamento da contratada	Semana 41
		05/10/2026 a 09/10/2026
		1 visita(s) registrada(s)
OBRA / UNIDADE DE ENSINO EE HENRIQUE COSTA	CÓDIGO DO PRÉDIO 109152	
LOCAL EMBU DAS ARTES	PI (PORTAL) 2026/00754	
ORDEM DE SERVIÇO —	CONTRATO FDE 05/00006/26-001-001	
EMPREITEIRO RENILDO	ENG. RESPONSÁVEL / FISCAL FDE Douglas / FABIO	

RESUMO DA SEMANA

Data	Dia	Efetivo	Tempo	Ritmo	% execução (eng.)
05/10/2026	seg	4	Seco	Normal	20%

1 visita(s) entre 05/10/2026 e 09/10/2026 Execução: **20%**. Previsão de término: .

AVANÇO DA OBRA

Indicador	%	Referência
Aprovado pela FDE (medições aprovadas)	0,2%	M001 aprovada · M002 em aprovação gerente
Execução apontada pelo engenheiro	20%	visita de 09/10/2026
Fiscal da FDE — último livro de ocorrências	10%	LO nº 9 de 30/09/2026

SERVIÇOS EXECUTADOS NA SEMANA

- Pintura de salas de aula - Sant masculino chumbando hidráulica - Início revestimento
--

MATERIAIS — SITUAÇÃO DOS PEDIDOS EM 05/10/2026

Situação na data de emissão deste relatório (05/10/2026 às 20:20): pedidos do Sienge (01/01/2025 a 05/10/2026, exportação de 05/10/2026 19:13), marcações de entrega do painel e solicitações sem pedido de compra (Sienge, 05/10/2026).

Nenhum pedido mudou de pendente para entregue nesta semana.

20 pedidos no Sienge · 16 entregues · 4 com item pendente, somando **R\$ 118.848,56** a receber.

4 pedido(s) sem entrega confirmada até 05/10/2026 — todos listados abaixo, do mais antigo para o mais novo.

Pedido	Fornecedor	Itens	Valor	Entrega
55020 19/08/2026	PROVERACO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA pedido há 47 dias	42401 - CUMEEIRA - PINTADA 1 FACE TELHADO SANDUICHE — 32 m 42939 - TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=50MM (PIR) TRAPEZ H=40MM NAS DUAS FACES E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES - 8,40m — 58 un 42940 - TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=50MM (PIR) TRAPEZ H=40MM NAS DUAS FACES E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES - 2,44m — 32 un 42941 - TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=50MM (PIR) TRAPEZ H=40MM NAS DUAS FACES E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES - 2,44m — 32 un	R\$ 102.647,00	PENDENTE marcado por Eng. Douglas · 05/10/2026 11:57
57179 30/09/2026	HJS COMERCIO DE FERROS E MATERIAIS PARA SERRALHERIA EIRELI pedido há 5 dias	28182 - Tinta alumínio — 1 lt 33487 - Fundo galvanizado — 1 gl 44592 - TAMPA PLÁSTICA PARA TUBO REDONDO 2" — 20 pç 44589 - TUBO GALVANIZADO A FOGO D=1 1/4" E=2MM (TRAVAMENTO HORIZONTAL SUPERIOR/INFERIOR + ESCORAMENTOS) — 80 m 44588 - BARRA CHATA GALV 1" X 3/16" — 2 pç 44591 - PARAFUSO 3/8"X1" C/ PORCA E ARRUELA GALVANIZADO — 4 cj 44587 - TUBO GALVANIZADO A FOGO Ø2" E=2MM (MONTANTE), H=2,00M — 18 pç 44593 - ELETRODO REVESTIDO E6013 1,6MM — 2 kg	R\$ 3.883,80	PENDENTE marcado por Eng. Douglas · 05/10/2026 11:57
57180 30/09/2026	ARTEL COMERCIO DE FERROS TUBOS E TELAS EIRELI pedido há 5 dias	44590 - TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 10, MALHA QUADRANGULAR 2" DIMENSÃO 38M X 1,50M — 57 m² 14113 - Arame galvanizado 12mm — 1 rol	R\$ 2.317,80	PENDENTE marcado por Eng. Douglas · 05/10/2026 11:57
57387 05/10/2026	RL DA COSTA CONSTRUÇOES E REFORMAS EM GERAL pedido há 0 dias	12440 - MAO DE OBRA — 1 un	R\$ 10.000,00	PENDENTE falta R\$ 10.000,00

Solicitações sem pedido de compra (16) — ≈ R\$ 23.033,08 estimado pelos pedidos do Sienge

Solicitação	Finalidade	Itens ainda sem pedido	Entrega
29807 17/07/2026	FINALIDADE: MURO DE DIVISA solicitado há 80 dias	CIMALHA PRÉ-MOLDADA — 30 m · ≈ R\$ 1.188,00 ≈ R\$ 1.188,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
29812 17/07/2026	FINALIDADE: MURO DOS FUNDOS solicitado há 80 dias	Broxa retangular — 1 un · R\$ 14,64 BISNAGA DE CORANTE AZUL ESCURO — 2 un · R\$ 23,48 ADESIVO LOGO DO FDE — 3 un ≈ R\$ 38,12 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
29814 17/07/2026	FINALIDADE: MURO DE DIVISA solicitado há 80 dias	CANAleta DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO 30CM — 30 m TAMPA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PARA AS CANALETAS 30CM — 60 m	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
29815 17/07/2026	FINALIDADE: ILUMINAÇÃO solicitado há 80 dias	LUMINÁRIA SOBREPOR LED TUBULAR VIDRO 2X18W — 20 un · R\$ 1.793,40 LUMINÁRIA SOBREPOR LED TUBULAR VIDRO 1X18W — 10 un · ≈ R\$ 606,30 LAMPADAS T8 18W — 60 un ≈ R\$ 2.399,70 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra

Solicitação	Finalidade	Itens ainda sem pedido	Entrega
29816 17/07/2026	FINALIDADE: ELÉTRICA GERAL solicitado há 80 dias	Cabo flex 2,5mm² preto — 2 rol · R\$ 478,00 Cabo flex 2,5mm² verde — 1 rol · R\$ 239,00 CONDULETES 3/4 — 20 un · R\$ 198,00 UNIDUTE CÔNICO 3/4 — 10 un · R\$ 33,60 Eletroduto Galvanizado 3/4 — 10 br · R\$ 153,90 TOMADA 2P+T 10A COMPLETA — 10 un · R\$ 50,90 cabo flex 2,5mm azul — 1 rolo · R\$ 251,00 Abraçadeira tipo D com cunha — 30 un · R\$ 20,40 Unidute reto 3/4 — 20 pç · R\$ 45,00 Luminária IL-45 — 36 un · R\$ 3.228,12 ≈ R\$ 5.072,02 estimado <i>... e mais 2 itens</i>	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
29981 27/07/2026	FINALIDADE: CONTAINER solicitado há 70 dias	LOCAÇÃO DE CONTAINER 6 X 3M — 1 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
30755 26/08/2026	FINALIDADE: LIMPEZA solicitado há 40 dias	RETIRADA DE CAÇAMBA — 1 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
31039 08/09/2026	FINALIDADE: SANITÁRIO *PORTAS PADRÃO IMBUÍDA - P/ PINTURA* solicitado há 27 dias	Fechadura tipo livre / ocupado — 19 un · R\$ 950,00 BACIA SANITÁRIA BRANCA CONVENCIONAL — 19 un · ≈ R\$ 3.288,71 BACIA SANITÁRIA P/ DEFICIENTE — 2 un · ≈ R\$ 481,10 ASSENTO SANITÁRIO BRANCO — 17 un · R\$ 696,49 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL P/ DEFICIENTE — 2 un · ≈ R\$ 81,94 MICTÓRIO DECA DE LOUÇA BRANCA C/ SIFÃO INTEGRADO MODELO M 715 OU SIMILAR — 3 un LAVATÓRIO BRANCO C/ COLUNA P/ DEFICIENTE — 2 un PORTA SÓLIDA 0,62 X 1,65M — 17 un PORTA SÓLIDA 0,92 X 1,65M — 2 un PORTA SÓLIDA 0,92 X 2,10M — 4 un ≈ R\$ 5.498,24 estimado <i>... e mais 2 itens</i>	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
31040 08/09/2026	FINALIDADE: SANITÁRIOS *ARQUIVOS EM ANEXO* solicitado há 27 dias	BANCADA LT-07 3M CONFORME CROQUI E PADRÃO FDE — 2 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
31043 08/09/2026	FINALIDADE: ELÉTRICA *LUMINÁRIA CALHA COMERCIAL C/ REFLETOR EM ALUMÍNIO ALTO RENDIMENTO DE SOBREPOR PARA LÂMPADA LED T8 2X18W FDE - IL-45* *LUMINÁRIA COM DIFUSOR EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE P/ COZINHAS EM CHAPA DE AÇO, C/ PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, EM ALUMÍNIO ANODIZADO 2X32W - REF. INTRAL: CAD-870/2X32W COM SOQUETES DE ENGATE RÁPIDO -FDE IL-42* solicitado há 27 dias	SOQUETE PARA LAMP. FLUORESCENTE ENCAIXE RÁPIDO — 412 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
31072 09/09/2026	FINALIDADE: PINTURA GERAL solicitado há 26 dias	TRINCHA P/ ESMALTE 2" — 10 un · R\$ 126,80 ≈ R\$ 126,80 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
31195 16/09/2026	FINALIDADE: SANITÁRIO solicitado há 19 dias	SOLEIRA CORUMBÁ 0,19 X 1,00M — 6 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra

Solicitação	Finalidade	Itens ainda sem pedido	Entrega
31196 16/09/2026	FINALIDADE: LIMPEZA DE OBRAS solicitado há 19 dias	CAÇAMBA — 1 un · R\$ 480,00 ≈ R\$ 480,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
31403 23/09/2026	FINALIDADE: PINTURA solicitado há 12 dias	TINTA ESMALTE SINTÉTICO AZUL CELESTE 3,6L — 24 gl · ≈ R\$ 2.610,00 VERDE NILO ESMALTE SINTÉTICO 3,6L — 24 gl · ≈ R\$ 2.610,00 ≈ R\$ 5.220,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
31439 24/09/2026	FINALIDADE: LIMPEZA solicitado há 11 dias	CAÇAMBA — 1 un · R\$ 480,00 ≈ R\$ 480,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
31698 05/10/2026	FINALIDADE: PINTURA solicitado há 0 dias	FITA CREPE 25MM X 50M — 15 un · R\$ 83,70 TRINCHA 1.1/2 — 10 un · R\$ 99,00 Tinta branca 18l — 5 lt · R\$ 2.347,50 PAPELÃO ONDULADO PARA PROTEÇÃO DE PISO 1,00 X 50M — 2 rol ≈ R\$ 2.530,20 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES DA SEMANA


Recomendações à contratada - Aumentar efetivo pintura Pendências em aberto - PINGADEIRAS DE CONCRETO MURO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DA SEMANA




Registro da visita

05/10/2026

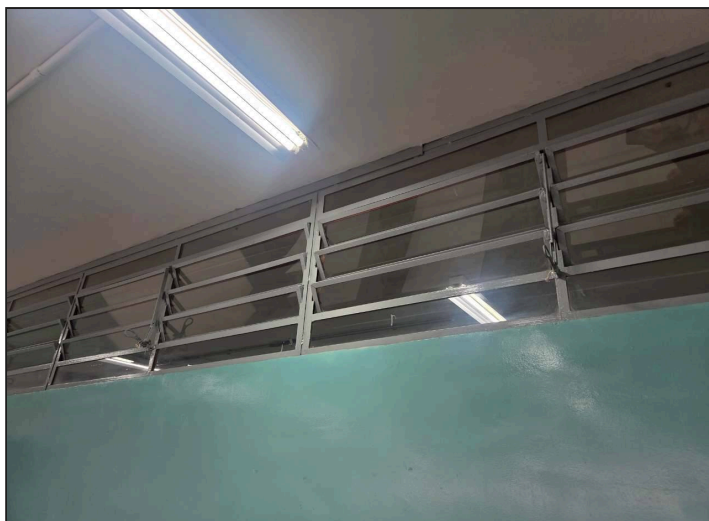


Registro da visita

05/10/2026

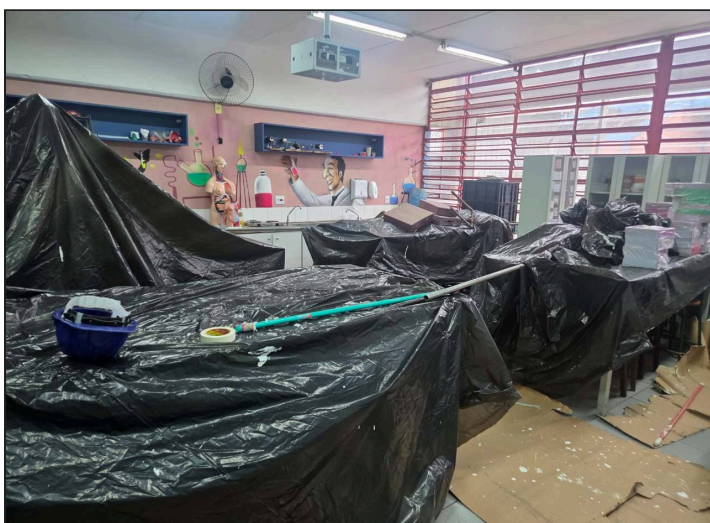


Registro da visita

05/10/2026

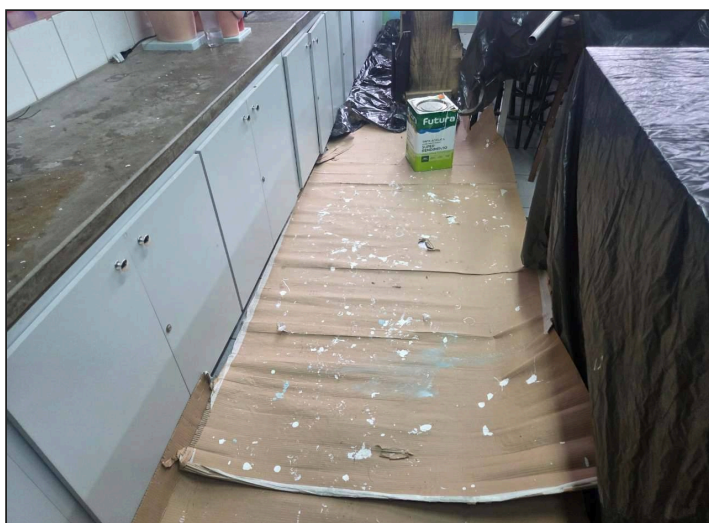

Registro da visita

05/10/2026

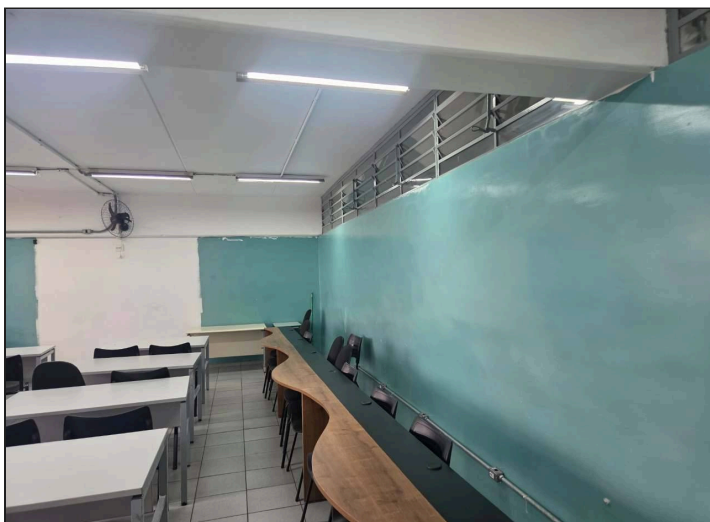

Registro da visita

05/10/2026




Registro da visita

05/10/2026




Registro da visita

05/10/2026

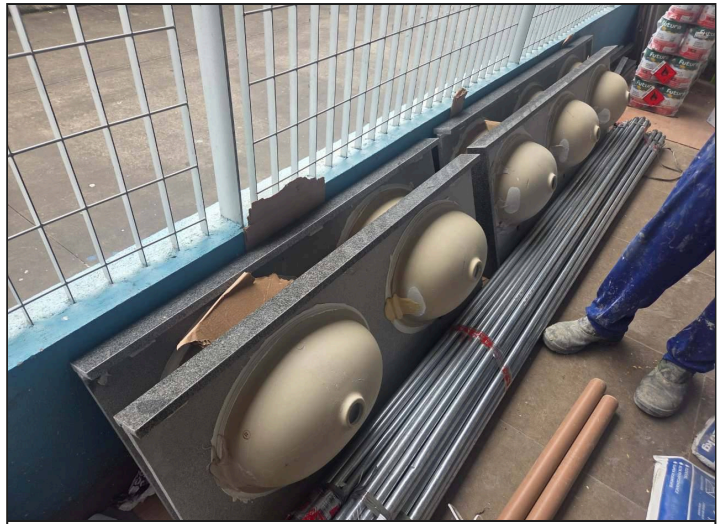

Registro da visita

05/10/2026

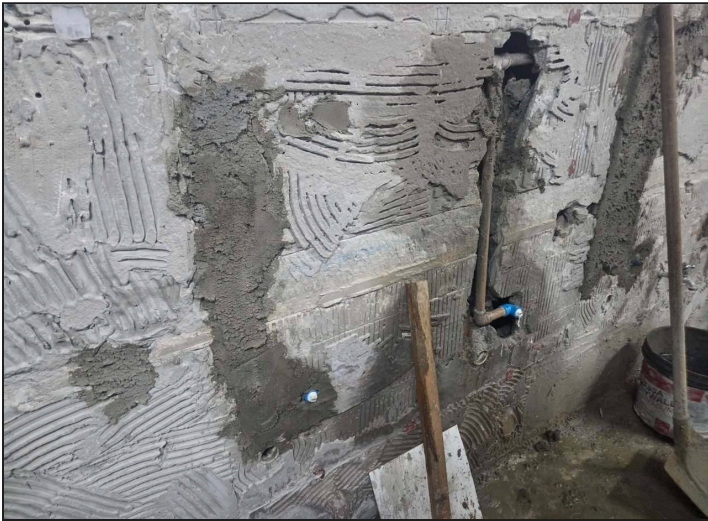


Registro da visita

05/10/2026



Registro da visita

05/10/2026

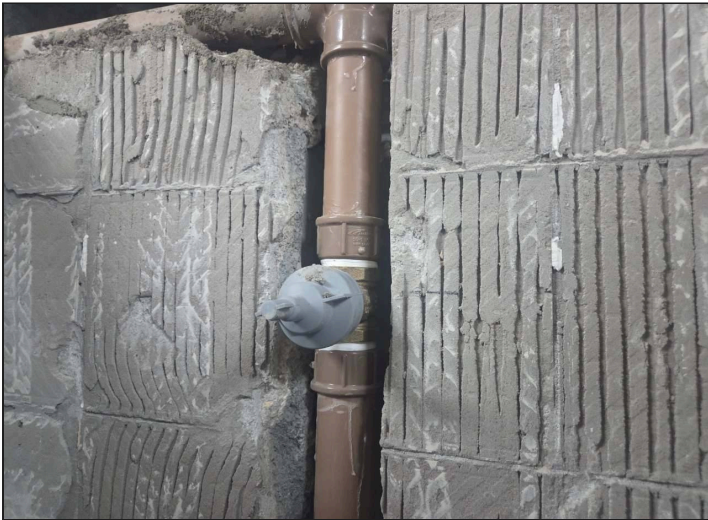

Registro da visita

05/10/2026



Registro da visita

05/10/2026




Registro da visita

05/10/2026



Registro da visita

05/10/2026

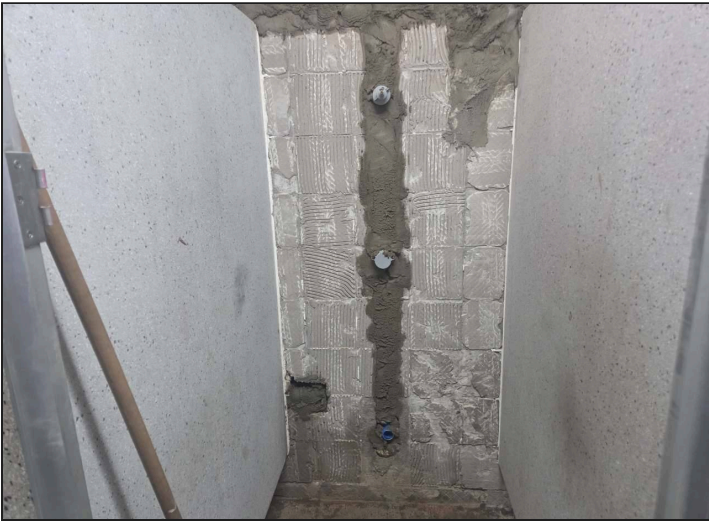

Registro da visita

05/10/2026

DOUGLAS Eng. responsável — contratada	RENILDO Empreiteiro	FABIO Fiscal / FDE
---	---	--

ATA FDE CONTRATO ATA.FDE 41.301	RELATÓRIO SEMANAL DE ACOMPANHAMENTO Modelo conforme o Livro de Ocorrências da FDE · documento de acompanhamento da contratada	Semana 41
		05/10/2026 a 09/10/2026
		1 visita(s) registrada(s)
OBRA / UNIDADE DE ENSINO EE EDUARDO VAZ	CÓDIGO DO PRÉDIO 109111	
LOCAL EMBU DAS ARTES	PI (PORTAL) 2026/02482	
ORDEM DE SERVIÇO —	CONTRATO FDE 05/00853/26-001-001	
EMPREITEIRO ANTONIO CABELO	ENG. RESPONSÁVEL / FISCAL FDE Douglas / FABIO	

RESUMO DA SEMANA

Data	Dia	Efetivo	Tempo	Ritmo	% execução (eng.)
05/10/2026	seg	1	Seco	Parado	5%

1 visita(s) entre 05/10/2026 e 09/10/2026 Execução: 5%. Previsão de término: .

AVANÇO DA OBRA

Indicador	%	Referência
Aprovado pela FDE (medições aprovadas)	0%	M001 aprovada · M002 em análise scm
Execução apontada pelo engenheiro	5%	visita de 09/10/2026
Fiscal da FDE — último livro de ocorrências	10%	LO nº 5 de 29/09/2026

SERVIÇOS EXECUTADOS NA SEMANA

- Serviços parados - Efetivo tinha apenas uma funcionários organizando e limpando

MATERIAIS — SITUAÇÃO DOS PEDIDOS EM 05/10/2026

Situação na data de emissão deste relatório (05/10/2026 às 19:22): pedidos do Sienge (01/01/2025 a 05/10/2026, exportação de 05/10/2026 19:13), marcações de entrega do painel e solicitações sem pedido de compra (Sienge, 05/10/2026).

Nenhum pedido mudou de pendente para entregue nesta semana.

7 pedidos no Sienge · 5 entregues · 2 com item pendente, somando R\$ 18.225,36 a receber.

2 pedido(s) sem entrega confirmada até 05/10/2026 — todos listados abaixo, do mais antigo para o mais novo.

Pedido	Fornecedor	Itens	Valor	Entrega
57366 02/10/2026	CONSTRUTORA MOURA E MORAES LTDA pedido há 3 dias	12440 - MAO DE OBRA — 1 un	R\$ 5.000,00	PENDENTE falta R\$ 5.000,00

Pedido	Fornecedor	Itens	Valor	Entrega
57396 05/10/2026	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA pedido há 0 dias	17828 - Cabo flex 2,5mm² preto — 400 m 6562 - CONDULETES 3/4 — 50 un 6362 - Cabo flex 4mm² preto — 400 m 43091 - SEALTUBO 3/4 PRATA — 1 m 9557 - UNIDUTE RETO 1" — 10 un 43087 - TOMADA PARA CONDULETE PRONTO BRANCO — 39 un 9556 - UNIDUTE CÔNICO 1" — 10 un 20748 - Interruptor Bipolar 20A — 1 un 43088 - TOMADA PARA CONDULETE PRONTO VERMELHO — 10 un 17829 - cabo flex 2,5mm azul — 200 m 13681 - CABO 16MM AZUL — 200 m 13680 - CABO 16MM PRETO — 200 m 7353 - UNIDUTE CÔNICO 3/4 — 100 un 15873 - Cabo flex 4mm² azul — 200 m ... e mais 4 itens	R\$ 13.225,36	PENDENTE falta R\$ 13.225,36

Solicitações sem pedido de compra (18) — ≈ R\$ 50.113,13 estimado pelos pedidos do Sienge

Solicitação	Finalidade	Itens ainda sem pedido	Entrega
30280 07/08/2026	FINALIDADE: LABORATÓRIO DE FARMACIA *ORÇAMENTO EM ANEXO* solicitado há 59 dias	CIMENTO — 20 sc · R\$ 838,00 Areia fina — 3 m³ · R\$ 728,46 Pincel 1" — 2 un · R\$ 15,80 PINCEL 2" — 2 un · R\$ 15,50 Aguarrás 5l — 3 gl · R\$ 255,00 Cabo flex 4mm² preto — 200 m · R\$ 870,00 CONDULETES 3/4 — 50 un · R\$ 495,00 UNIDUTE CÔNICO 3/4 — 100 un · R\$ 336,00 UNIDUTE RETO 3/4" — 50 un · R\$ 199,00 UNIDUTE CÔNICO 1" — 10 un · R\$ 46,90 ≈ R\$ 11.332,15 estimado ... e mais 19 itens	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
30285 07/08/2026	FINALIDADE: LABORATÓRIO FARMACIA - CUBAS E ACESSIBILIDADE *IMAGEM EM ANEXO* solicitado há 59 dias	CUBA SIMPLES ACO INOX 304 CH.20 500X400X250MM — 4 un · R\$ 2.236,20 BR-11 BARRA DE APOIO COM FIXAÇÃO LATERAL LAVATORIO COLETIVO — 1 un · R\$ 330,45 ≈ R\$ 2.566,65 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
30286 07/08/2026	FINALIDADE: LABORATÓRIO FARMACIA - INSUMO PARA PISO VINILICO *IMAGEM EM ANEXO* *AGUARDAR AUTORIZACAO DE COMPRA* solicitado há 59 dias	COLA PARA PISO VINILICO 18KG — 1 un · R\$ 535,30 COLA PARA PISO VINILICO 4KG — 1 un · R\$ 198,72 AUTONIVELANTE 20KG — 8 un · R\$ 891,52 ≈ R\$ 1.625,54 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
30287 07/08/2026	FINALIDADE: LABORATÓRIO FARMACIA - PISO VINILICO *IMAGEM EM ANEXO* solicitado há 59 dias	RODAPÉ CURVO 5CM — 36 m · R\$ 215,64 MANTA VINILICA L= 2,00M E=2MM — 80 m² · R\$ 11.559,20 ≈ R\$ 11.774,84 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
30288 07/08/2026	FINALIDADE: LABORATÓRIO FARMACIA *IMAGEM EM ANEXO* solicitado há 59 dias	Extintor manual de PÓ QUIMICO SECO capacidade 12Kg — 1 un · R\$ 265,00 ≈ R\$ 265,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
30289 07/08/2026	FINALIDADE: LABORATÓRIO FARMACIA - ESQUADRIA DE ALUMINIO *IMAGEM EM ANEXO* solicitado há 59 dias	CAIXILHO DE ALUMINIO FIXO BRANCO 60X60CM — 4 un · R\$ 1.160,00 ≈ R\$ 1.160,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra

Solicitação	Finalidade	Itens ainda sem pedido	Entrega
30290 07/08/2026	FINALIDADE: LABORATÓRIO FARMACIA - METAIS E ACESSÓRIOS *IMAGEM EM ANEXO* solicitado há 59 dias	SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1 1/2X2" — 4 un · R\$ 613,76 TORNEIRA MEC/CER 1/4 VOLTA TIPO MESA CROMADO 1/2" — 4 un · R\$ 757,04 VALVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2" — 4 un · R\$ 80,48 CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE CERÂMICA ESMALTADA IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA — 2 un · R\$ 187,66 TORNEIRA DE ACIONAMENTO MANUAL E CICLO DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO, EIXO DE ENTRADA D'ÁGUA NA VERTICAL (MESA) — 2 un · R\$ 369,72 SIFÃO TIPO COPO D= 1" X 1 ½" — 2 un · R\$ 233,60 VÁLVULA DE ESCOAMENTO - D = 1" — 2 un · R\$ 68,64 ≈ R\$ 2.310,90 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
30291 07/08/2026	FINALIDADE: LABORATÓRIO FARMACIA solicitado há 59 dias	ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO TIPO AC-I — 25 sc · R\$ 417,50 ARGAMASSA PRE FABRICADA PARA REJUNTAMENTO — 10 kg · R\$ 100,70 AZULEJO RETIFICADO LISO BRANCO BRILHANTE — 60 m2 · R\$ 3.102,60 ≈ R\$ 3.620,80 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
30292 07/08/2026	FINALIDADE: LABORATÓRIO FARMACIA solicitado há 59 dias	BLOCO DE CONCRETO TIPO CANALETA 14X19X39 — 30 un · R\$ 130,50 BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM - 6MPa — 80 un · ≈ R\$ 357,60 MEIO BLOCO DE CONCRETO 14X19X19 - 6MPa — 80 un · ≈ R\$ 239,20 ≈ R\$ 727,30 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
30293 07/08/2026	FINALIDADE: LABORATÓRIO FARMACIA solicitado há 59 dias	ESPELHO DE 6MM DE ESPESSURA, LAPIDADO E ADESIVADO AO SUBSTRATO 1,35X0,75M — 1 un · R\$ 690,00 ≈ R\$ 690,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
30294 07/08/2026	FINALIDADE: LABORATÓRIO FARMACIA solicitado há 59 dias	Cuba de embutir, oval, de cerâmica esmaltada impermeável, na cor branca — 2 un · R\$ 187,66 TORNEIRA DE ACIONAMENTO MANUAL E CICLO DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO, EIXO DE ENTRADA D'ÁGUA NA VERTICAL (MESA) — 2 un · R\$ 329,08 SIFÃO TIPO COPO D= 1" X 1 ½" — 2 un · R\$ 233,60 VÁLVULA DE ESCOAMENTO - D = 1" — 2 un · R\$ 68,64 ≈ R\$ 818,98 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
30295 07/08/2026	FINALIDADE: LABORATÓRIO FARMACIA solicitado há 59 dias	PF-16 — 2 pç · R\$ 4.160,00 ≈ R\$ 4.160,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
30296 07/08/2026	FINALIDADE: LABORATÓRIO FARMACIA solicitado há 59 dias	BE-14 — 1 un BE-12 — 4 un BE-17 — 4 un BE-15 — 17 m LT-07 COMPLETO — 1,35 m	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
30297 07/08/2026	FINALIDADE: LABORATÓRIO FARMACIA solicitado há 59 dias	CANTONEIRA DE ALUMINIO BRANCA — 6 br	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
30932 02/09/2026	FINALIDADE: ELÉTRICA LABORATORIO *ARQUIVO EM ANEXO* solicitado há 33 dias	Areia fina — 3 m³ · R\$ 728,46 Cimento 50kg — 20 sc · R\$ 778,00 Pincel 1" — 2 un · R\$ 15,80 PINCEL 2" — 2 un · R\$ 15,50 Rolo 23cm — 2 un · R\$ 66,82 Aguarrás 5l — 3 gl · R\$ 255,00 Fita crepe 2" — 2 rol · R\$ 20,48 Fita crepe 1" — 2 rol · ≈ R\$ 18,00 LUMINARIA — 12 un · R\$ 1.076,04 TINTA LATEX BRANCA 18L — 1 lt · R\$ 335,00 ≈ R\$ 7.159,24 estimado ... e mais 5 itens	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra

Solicitação	Finalidade	Itens ainda sem pedido	Entrega
30943 02/09/2026	FINALIDADE: LABORATÓRIO solicitado há 33 dias	CAÇAMBA — 1 un · R\$ 480,00 ≈ R\$ 480,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
30945 02/09/2026	FINALIDADE: ISOLAMENTO DE ÁREA PARA INICIAR TELHADO solicitado há 33 dias	PREGO 18X27 — 2 kg · R\$ 40,00 Sarrafo 5cm C=3,00m — 20 pç · R\$ 140,00 Prego 15x15 — 1 kg · R\$ 20,00 Sarrafo 10cm — 30 pc · R\$ 648,00 MADEIRIT ROSA 22MM — 30 un PONTLETE QUADRADO — 20 un ≈ R\$ 848,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
31397 23/09/2026	FINALIDADE: FINALIZAR CONTRAPISO/BANCADA E REBOCO solicitado há 12 dias	CIMENTO — 5 sc · R\$ 209,50 Areia fina — 0,50 m³ · R\$ 121,41 Areia grossa — 1 m³ · R\$ 242,82 ≈ R\$ 573,73 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES DA SEMANA
Pendências em aberto Aguardando entrega de material já comprado - elétrico e hidráulico

REGISTRO FOTOGRÁFICO DA SEMANA



Entregue apenas luminária da elétrica

05/10/2026



Demolição de revestimento

05/10/2026




Portas de ferro entregue

05/10/2026



Demolição e contrapiso parado

05/10/2026

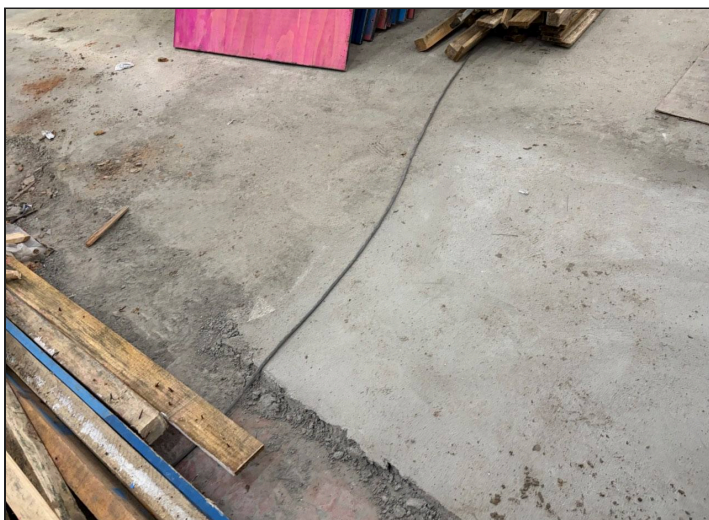

Contrapiso parado

05/10/2026



Porta de acesso mas sem identificação da obra

05/10/2026



Demolição e piso parada

05/10/2026



Desorganização na obra

05/10/2026

_____ LUIS JÚNIOR Eng. responsável — contratada	_____ ANTONIO CABELO Empreiteiro	_____ FABIO Fiscal / FDE
--	---	---
