

ATA FDE CONTRATO ATA.FDE 42.228	RELATÓRIO SEMANAL DE ACOMPANHAMENTO Modelo conforme o Livro de Ocorrências da FDE · documento de acompanhamento da contratada	Semana 40
		28/09/2026 a 02/10/2026
		1 visita(s) registrada(s)
OBRA / UNIDADE DE ENSINO NERCY AMELIA MARTELINI DAHER PROFESSORA		CÓDIGO DO PRÉDIO 125102
LOCAL PIRAPORA DO BOM JESUS		PI (PORTAL) 2023/02722
ORDEM DE SERVIÇO —		CONTRATO FDE 70/00313/26-001-001
EMPREITEIRO ARAUJO		ENG. RESPONSÁVEL / FISCAL FDE LEONARDO / RODRIGO

RESUMO DA SEMANA

Data	Dia	Efetivo	Tempo	Ritmo	% execução (eng.)
01/10/2026	qui	6	Chuva	Normal	—

1 visita(s) entre 28/09/2026 e 02/10/2026 1 dia(s) de chuva. Previsão de término: **29/01/2027**.

AVANÇO DA OBRA

Indicador	%	Referência
Aprovado pela FDE (medições aprovadas)	65%	M001 a M004 aprovadas · M005 em análise fiscal
Execução apontada pelo engenheiro	—	não informado na visita
Fiscal da FDE — último livro de ocorrências	57%	LO nº 13 de 18/09/2026

SERVIÇOS EXECUTADOS NA SEMANA

- EXECUÇÃO DE FORRO DE GESSO NA SALA DE LEITURA - ADEQUAÇÃO DA RAMPA DE ACESSO ÀS SALAS - EXECUÇÃO DE LIMPEZA DA OBRA - INSTALAÇÃO DE PORTAS NAS SALAS
--

MATERIAIS — SITUAÇÃO DOS PEDIDOS EM 02/10/2026

Situação na data de emissão deste relatório (02/10/2026 às 19:21): pedidos do Sienge (01/01/2026 a 02/10/2026, exportação de 02/10/2026 13:10), marcações de entrega do painel e solicitações sem pedido de compra (Sienge, 01/10/2026).

Nenhum pedido mudou de pendente para entregue nesta semana.

20 pedidos no Sienge · 0 entregues · **20 sem baixa** · 0 marcado(s) como pendente pelo engenheiro.

20 pedido(s) sem baixa no Sienge. Neste centro de custo o Sienge não registra a entrega dos pedidos, então "pendente" no relatório do Sienge não quer dizer que o material não chegou. Vale a marcação do engenheiro na aba *Pedidos do Sienge* do painel.

20 pedido(s) sem entrega confirmada até 02/10/2026 — todos listados abaixo, do mais antigo para o mais novo.

Pedido	Fornecedor	Itens	Valor	Entrega
49594 24/04/2026	ELIANE REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA pedido há 161 dias	13450 - PISO PORCELANATO — 450 m2	R\$ 17.202,09	SEM BAIXA

Pedido	Fornecedor	Itens	Valor	Entrega
50301 13/05/2026	HPACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI pedido há 142 dias	40305 - PILAR CORTE E DOBRA (ARMADO) C=2,40M — 30 un 40304 - VIGA BALDRAME CORTE E DOBRA ARMADO — 75 m 40303 - BROCA CORTE E DOBRA (ARMADO) C=2,50M — 30 un	R\$ 8.517,96	SEM BAIXA
50453 15/05/2026	PROVERACO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA pedido há 140 dias	40498 - TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=50MM (PIR) TRAPEZ H=40MM NAS DUAS FACES E= 0,50MM C= 5,8M — 170 un	R\$ 154.716,00	SEM BAIXA
50454 16/05/2026	J e A VELOSO COMERCIO DE ESQUADRIAS E EMPREITEIRA LTDA pedido há 139 dias	40311 - PT-29 — 1 un 40312 - PT-41 — 1 un 40313 - TI-01 — 4 un	R\$ 9.476,34	SEM BAIXA
50609 20/05/2026	GGN MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA pedido há 135 dias	35675 - PONTALETE 6X6 3 M PINUS — 30 pç 298 - TIJOLO COMUM MACICO — 200 un 555 - PREGO 18X27 — 3 kg 34819 - TINTA BRANCA LÁTEX BASE ÁGUA 18L — 1 lt 35676 - SARRAFO 10 CM 3M — 40 un 35673 - MADEIRITE 6MM ROSA — 40 fl 13476 - CIMENTO CPII — 20 sc 20286 - Neutrol — 1 lt 25854 - Broxa retangular — 2 un 34820 - BISNAGA DE CORANTE AZUL ESCURO — 3 un 5784 - Argamassa AC-II — 100 sc	R\$ 7.170,44	SEM BAIXA
50828 25/05/2026	ARTEL COMERCIO DE FERROS TUBOS E TELAS EIRELI pedido há 130 dias	40775 - Arame galvanizado (fi o 14=2,11mm) — 5 kg 40772 - Tela de arame galvanizado (fio 10=3,4mm) em malha quadrangular com espaçamento de 2 ² _{cc} h=2,40m — 59 m 40771 - Tela de arame galvanizado (fio 10=3,4mm) em malha quadrangular com espaçamento de 2 ² _{cc} h=4,00m — 42 m	R\$ 12.418,04	SEM BAIXA
50829 25/05/2026	HJS COMERCIO DE FERROS E MATERIAIS PARA SERRALHERIA EIRELI pedido há 130 dias	10677 - Barra chata galvanizada a fogo E=3/16" — 2 br 40776 - Parafuso cabeça sextava com porca e arruela 3/8 ² _{cc} x1 ² _{cc} — 30 un 40773 - Tubo de aço galvanizado a fogo (Ø=2 ² _{cc} e=2mm) — 26 br 40774 - Tubo de aço galvanizado a fogo (Ø=1 1/4 ² _{cc} e=2mm) — 37 br	R\$ 10.589,30	SEM BAIXA
50830 25/05/2026	UDIACO COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA pedido há 130 dias	5670 - AÇO CA-50 6,30MM — 6 br 17563 - Aço 6,3 mm — 24 br 5669 - AÇO CA-50 8,00MM — 9 br 5691 - AÇO CA-50 12,50MM — 14 br 7792 - TELA POP Q92 — 10 un	R\$ 2.548,69	SEM BAIXA
50831 25/05/2026	JANDIBLOC INDUSTRIA E COMERCIO DE BLOCOS EIRELI pedido há 130 dias	311 - BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14X19X39CM - 3MPa — 500 un 9441 - MEIO BLOCO DE CONCRETO 14X19X19CM - 3MPa — 500 un 309 - BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM - 3MPa — 2.000 un	R\$ 10.600,00	SEM BAIXA
51099 29/05/2026	ELIANE REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA pedido há 126 dias	20440 - AZULEJO BRANCO BRILHANTE — 121,90 m²	R\$ 3.913,89	SEM BAIXA
51209 01/06/2026	LEANDRO GONZALEZ ELETRICA pedido há 123 dias	40865 - CORDOALHA AÇO GALV. 3/8" — 250 m	R\$ 2.647,50	SEM BAIXA

Pedido	Fornecedor	Itens	Valor	Entrega
51650 12/06/2026	COMERCIAL GOLDONI PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA pedido há 112 dias	40873 - ELETRODO SOLDA (E7018 - 3,25MM) 5KG — 5 cx 6948 - Disco de corte 4 1/2" — 20 un 19358 - Disco de desbaste 4" 1/2 — 20 un 40868 - PERFIL U 3" 6M (TESOURAS) — 84 un 40867 - PERFIL U 3" 6M (TERÇAS) — 67 un 40869 - PERFIL U 3" 6M (TRELIÇAS) — 57 un 7499 - CANTONEIRA 1" X 1/8" — 144 br	R\$ 33.238,04	SEM BAIXA
52015 22/06/2026	COSTA LION LTDA pedido há 102 dias	41693 - TELHA ONDULADA CRF 2,13M X 1,10M X 6MM — 108 un	R\$ 7.803,80	SEM BAIXA
53206 17/07/2026	BRUNO RAMOS DA SILVA 47203075826 pedido há 77 dias	12440 - MAO DE OBRA — 1 un	R\$ 36.800,00	SEM BAIXA
53296 20/07/2026	BRUNO RAMOS DA SILVA 47203075826 pedido há 74 dias	12440 - MAO DE OBRA — 1 un	R\$ 6.451,50	SEM BAIXA
53686 27/07/2026	TORRES CABRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI pedido há 67 dias	5784 - Argamassa AC-II — 60 sc	R\$ 1.614,00	SEM BAIXA
54084 03/08/2026	EVERSON CARLOS NOGUEIRA DE SOUZA 34422490826 pedido há 60 dias	20333 - VIGA "U" DE 3" - 6,00M — 45 br	R\$ 6.175,00	SEM BAIXA
54776 14/08/2026	PROVERACO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA pedido há 49 dias	16307 - CUMEEIRA — 89 pç	R\$ 5.011,00	SEM BAIXA
54796 14/08/2026	CIMEMPRIMO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pedido há 49 dias	43030 - REGULADOR F530 DRYWALL — 500 un 43029 - CANTONEIRA DE AÇO GALVANIZADO DRYWALL — 60 un 43031 - PREGO COM CABEÇA POLIDA 12 X 12CM — 5 pct 43035 - BALDE DE MASSA PRONTA PARA DRYWALL 25KG — 3 un 43014 - PLACA DE DRYWALL 1,20CM X 1,80CM — 170 un 7494 - Parafuso GN25 — 1.000 un 10569 - Fita telada para drywall — 4 rol 43032 - ARAME FIO 10 GALVANIZADO P/ FORRO DRYWALL 5 KG (70 METROS) — 2 un 43033 - PARAFUSO PONTA DRYWALL (CAPETINHA) 4,2X13MM — 500 un 43028 - PERFIL MONTANTE F530 DE DRYWALL — 150 un	R\$ 11.785,79	SEM BAIXA
55568 28/08/2026	CIMEMPRIMO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pedido há 35 dias	18470 - Placa de gesso RU 1,20x1,80 verde — 5 un 43938 - PERFIL NIVELADOR F530 — 70 un 43942 - ARAME FIO 10 GALVANIZADO PARA GESSO DRYWALL 1 KG — 5 rol 7494 - Parafuso GN25 — 1.500 un 10569 - Fita telada para drywall — 2 rol 10570 - Massa junta para drywall 25kg — 2 un 43939 - PLACA DE DRYWALL — 50 un 43940 - PARAFUSO PONTA AGULHA METAL-METAL — 100 un 43941 - REGULADOR DE PERFIL F530 — 100 un	R\$ 4.046,51	SEM BAIXA

Solicitações sem pedido de compra (23)

Solicitação	Finalidade	Itens ainda sem pedido	Entrega
28210 11/05/2026	FINALIDADE: TAPUME FDE ISOLAMENTO TALUDE solicitado há 144 dias	ADESIVO LOGOTIPO FDE — 3 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28212 11/05/2026	FINALIDADE: MURO DE DIVISA FD-16 solicitado há 144 dias	Areia média — 6 m³ BRITA N°01 — 6 m³	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28213 11/05/2026	FINALIDADE: WC ALUNOS MASC E FEM solicitado há 144 dias	PM-74 COMPLETA — 8 un PM-71 COMPLETA — 2 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28214 11/05/2026	FINALIDADE: WC ALUNOS MASC E FEM solicitado há 144 dias	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DN= 25MM — 2 br TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DN= 50MM — 2 br Tubo PVC SN 100mm — 1 br PAPELEIRA DE LOUÇA BRANCA DE 15X15CM — 7 un CAIXA SIFONADA PVC DN100X100X50MM COM GRELHA PVC — 2 un RALO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM COM GRELHA PVC — 2 un BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA COM ASSENTO — 7 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28215 11/05/2026	FINALIDADE: WC ALUNOS MASC E FEM solicitado há 144 dias	Areia média — 3 m³ BRITA N°01 — 3 m³	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28218 11/05/2026	FINALIDADE: FORRO SALA DE AULA solicitado há 144 dias	MASSA DRYWALL 20 KG — 10 sc Perfil Canaleta F530 — 227 un PENDURAL F 530 — 500 un UNIÃO F 530 — 180 un PARAFUSO PPA 25MM — 500 un PARAFUSO PFM 13MM — 800 un CHAPA DRYWALL ST BR 12,5MM 1200 X 1800 — 200 un TIRANTE RÍGIDO - NO. 10 (REB = 1,00 M) — 500 un FITA PARA JUNTA — 4 rol TABICA OU CANTONEIRA 25 X 30 X 3.000 — 147 pç	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28325 14/05/2026	FINALIDADE: COBERTURA solicitado há 141 dias	PARAFUSO AUTO-PERF C/ CONJ VEDACAO P/ TELHA DE ACO — 1.000 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28391 15/05/2026	FINALIDADE: MURO DE DIVISA solicitado há 140 dias	CIMALHA (PINGADEIRA) PRÉ MOLDADA — 75 m	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28483 19/05/2026	FINALIDADE: QE-02 E QE-03 * DE 2KIT COMPLETO DA BASQUETE* *Tabela em chapa de compensado com colagem fenólica, e=20mm e requadro com perfil metálico galvanizado $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8}$ ou $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$ Aro com diâmetro interno de 450mm em barra redonda galvanizada de 16mm<Ø<20mm; Rede em malha de nylon presa ao aro em 12 pontos, com- primento entre 400 a 450mm; Suporte em chapa de aço galvanizado, e=3/16" * solicitado há 136 dias	QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL — 1 un QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO — 2 un Trelça Cantoneiras de abas iguais $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8}$ em aço ASTM A-36: 1 1/2" x 1/8" (38x3,2mm) — 1 un Trelça Cantoneiras de abas iguais $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$ em aço ASTM A-36: 1 1/4" x 1/8" (32x3,2mm) — 1 un Trelça Cantoneiras de abas iguais "L" em aço ASTM A-36 1/2" x 3/8" (64x9,5mm) — 2 un Tabela/Cesto: Tabela em chapa de compensado com colagem fenólica, e=20mm e requadro com perfil metálico galvanizado $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8}$ ou $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$ Aro com diâmetro interno de 450mm em barra redonda galvanizada de 16mm<Ø<20mm; Rede em malha de nylon presa ao aro em 12 pontos, com- primento entre 400 a 450mm; — 2 un Suporte em chapa de aço galvanizado, e=3/16" — 1 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28484 19/05/2026	FINALIDADE: QE-37 solicitado há 136 dias	Aço CA-60 3,40mm — 2 br	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra

Solicitação	Finalidade	Itens ainda sem pedido	Entrega
28607 22/05/2026	FINALIDADE: WC ALUNOS LT-06 solicitado há 133 dias	Torneira de acionamento manual e com ciclo de fechamento automático, com desenho projetado para instalação reforçada e proteção contra o vandalismo, conforme ficha H6.14 — 8 un VÁLVULA DE ESCOAMENTO - Ø=1 — 8 un SIFÃO TIPO COPO - Ø=1"X 1 ½" — 8 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28608 22/05/2026	FINALIDADE: WC ALUNOS LT-06 solicitado há 133 dias	Cuba de embutir, oval, de cerâmica esmaltada impermeável, na cor branca — 8 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28609 22/05/2026	FINALIDADE: WC ALUNOS LT-06 solicitado há 133 dias	TAMPO COM FRONTÃO E PRATELEIRA DE GRANITO POLIDO, L=55CM, E=2CM, CINZA ANDORINHA OU CINZA CORUMBÁ, COMP=2,40M — 2 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28610 22/05/2026	FINALIDADE: WC ALUNOS solicitado há 133 dias	Espelho EP-01 — 8 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28623 25/05/2026	FINALIDADE: INCENDIO E RESERVATORIO *TODAS AS BARRAS COM 6M* solicitado há 130 dias	Tubo de aço galvanizado 1 1/4" — 4 br TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2" — 4 br TUBO AÇO GALVANIZADO 1" — 1 br Tubo de aço galvanizado 3" — 18 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28624 25/05/2026	FINALIDADE: ESTRUTURAS DE AÇO (FERRAGEM TELHADO) solicitado há 130 dias	CALHA COM ABA 5X8X15 — 195 m SUPORTE U PARA CALHA BEIRAL TIPO 5X8X15 — 195 un BOCAL SAIDA P/CALHA COCHO 100MM GALV. — 8 un PRIMER ANTICORROSIVO (GALV. A FRIIO) 3,6L — 10 gl	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28625 25/05/2026	FINALIDADE: PINTURA solicitado há 130 dias	Tinta piso branco 3,6 l — 2 gl TINTA PISO AZUL 18L — 2 lt Tinta piso Amarelo 18L — 2 lt SELADOR ACRILICO 3,6L — 4 un MASSA CORRIDA P/PAREDE 18KG — 8 lt TINTA ACRILICA PREMIUM BRANCO NEVE 18L — 8 lt TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE PRETO 3,6L — 2 gl TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE CINZA ESCURO 18L — 1 lt	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28771 29/05/2026	FINALIDADE: PINTURA solicitado há 126 dias	Tinta látex Branco 18L — 7 lt Tinta Látex Acrílico Branco 18l — 7 lt Tinta látex Acrílica Marfim 18l — 7 lt TINTA ACRÍLICA - ÁGUAS RASAS — 7 lt	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28772 29/05/2026	FINALIDADE: PINTURA solicitado há 126 dias	SALVA PISO — 4 rol BOBINA DE LONA PRETA 4X20 — 2 un FITA CREPE 10CM LARGURA — 10 un FITA CREPE 20CM LARGURA — 20 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
29486 07/07/2026	FINALIDADE: PROTEÇÃO MATERIAL E TELHADO solicitado há 87 dias	Lona plástica preta — 400 m²	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
29583 13/07/2026	FINALIDADE: FORMA QE-37 solicitado há 81 dias	FORMA DE PAPELAO D=30CM ALT=4,0M — 2 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
30206 05/08/2026	FINALIDADE: FORRO DE DRYWALL - SALAS solicitado há 58 dias	FITA PARA GESSO E DRYWALL 55 MM X 75 MM — 1 un GESSO MULTIUSO 40KG — 1 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
30746 25/08/2026	FINALIDADE: SALA DE LEITURA E CANTINA DO PAVILHÃO 2 solicitado há 38 dias	PLACA DE DRYWALL — 5 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES DA SEMANA

Observações

- ADEQUAÇÕES E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA PREPARAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR PARA AS ELEIÇÕES


Recomendações à contratada

- REGULARIZAÇÃO DAS PENDÊNCIAS 01, 02, 03, 05, 06 E 07 ATÉ O DIA 02/10/2026, CONFORME COMBINADO. APÓS A REGULARIZAÇÃO, ENVIAR FOTOS NO GRUPO PARA REGISTRO

Pendências em aberto

- 1- PROBLEMA NO ENCANAMENTO DO RESERVATÓRIO, OCASIONANDO FALTA DE ÁGUA NA UNIDADE ESCOLAR. ENCANADOR ACIONADO, COM ATENDIMENTO PROGRAMADO PARA AMANHÃ, CONFORME INFORMAÇÃO DO EMPREITEIRO
- 2- EXECUÇÃO DE ACABAMENTOS (INSTALAÇÃO DE SIFÕES E CANTONEIRAS) E LIMPEZA GROSSA NOS BANHEIROS PARA LIBERAÇÃO DA UNIDADE PARA AS ELEIÇÕES
- 3- INSTALAÇÃO DE PORTAS NAS SALAS E LIMPEZA DA OBRA
- 4- VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE GÁS
- 5- ADEQUAÇÃO DA RAMPA DE ACESSO ÀS SALAS DE AULA
- 6- LIMPEZA DA OBRA PARA AS ELEIÇÕES
- 7- AJUSTE E REPOSICIONAMENTO DA LONA EXISTENTE NAS CADEIRAS DA QUADRA


REGISTRO FOTOGRÁFICO DA SEMANA

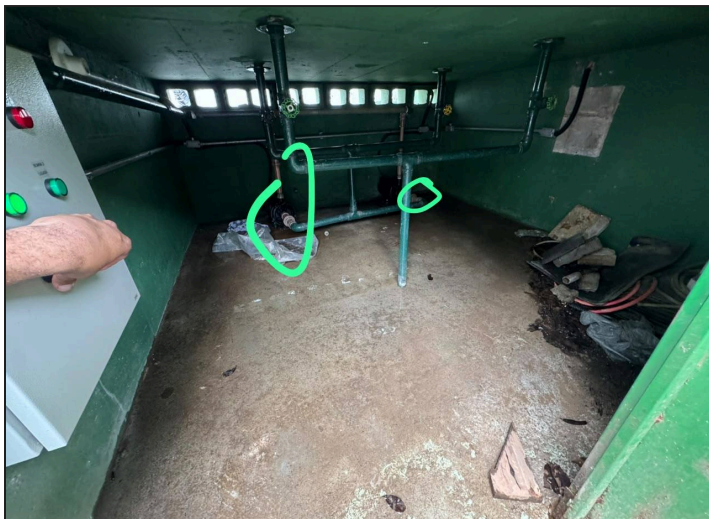

01/10/2026




01/10/2026

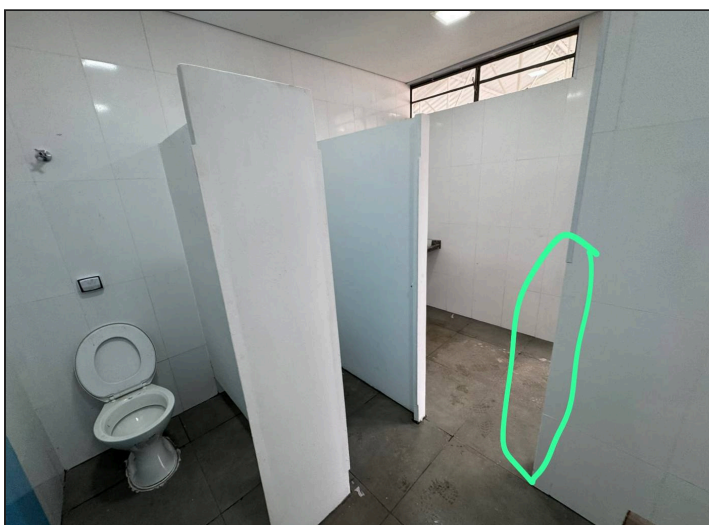

01/10/2026




01/10/2026

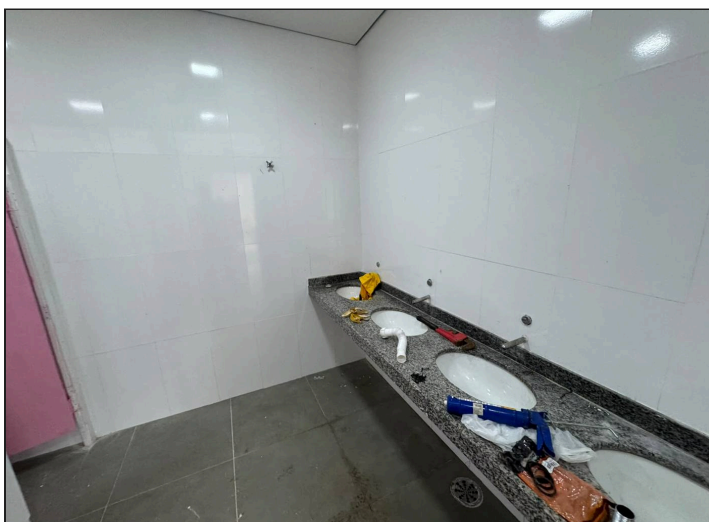

01/10/2026



01/10/2026

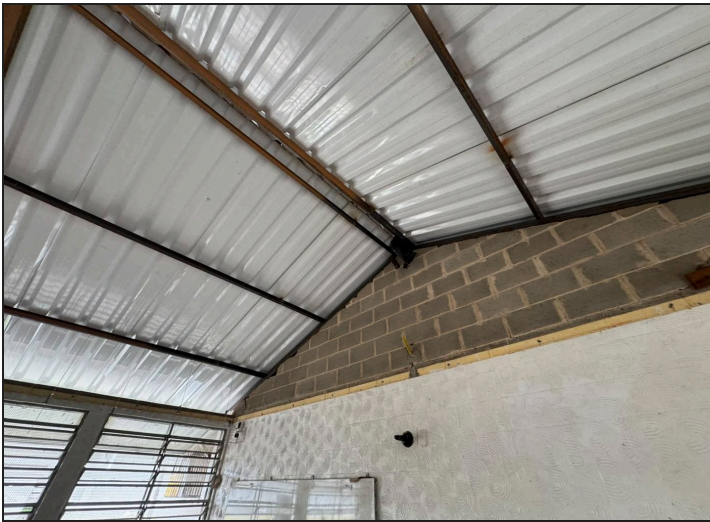

01/10/2026



01/10/2026



01/10/2026



01/10/2026



01/10/2026

LEONARDO Eng. responsável — contratada	ARAUJO Empreiteiro	RODRIGO Fiscal / FDE
--	----------------------------------	------------------------------------
