

|                                                                       |                                                                                                                                                     |                           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <div>ATA FDE</div> <div>CONTRATO<br/>ATA.FDE 41.268</div>             | <div>RELATÓRIO SEMANAL DE ACOMPANHAMENTO</div> <div>Modelo conforme o Livro de Ocorrências da FDE · documento de acompanhamento da contratada</div> | Semana 40                 |
|                                                                       |                                                                                                                                                     | 28/09/2026 a 02/10/2026   |
|                                                                       |                                                                                                                                                     | 1 visita(s) registrada(s) |
| <div>OBRA / UNIDADE DE ENSINO</div> <div>EE INSTITUTO IMACULADA</div> | <div>CÓDIGO DO PRÉDIO</div> <div>116302</div>                                                                                                       |                           |
| <div>LOCAL</div> <div>ITAPECERICA DA SERRA</div>                      | <div>PI (PORTAL)</div> <div>2026/01340</div>                                                                                                        |                           |
| <div>ORDEM DE SERVIÇO</div> <div>—</div>                              | <div>CONTRATO FDE</div> <div>70/00588/26-001-001</div>                                                                                              |                           |
| <div>EMPREITEIRO</div> <div>RONALDO BRITTES</div>                     | <div>ENG. RESPONSÁVEL / FISCAL FDE</div> <div>Douglas / FABIO</div>                                                                                 |                           |

RESUMO DA SEMANA

| Data       | Dia | Efetivo | Tempo | Ritmo | % execução (eng.) |
|------------|-----|---------|-------|-------|-------------------|
| 30/09/2026 | qua | 2       | Seco  | Lento | —                 |

1 visita(s) entre 28/09/2026 e 02/10/2026 Previsão de término: 28/10/2026.

AVANÇO DA OBRA

| Indicador                                   | %     | Referência                                    |
|---------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|
| Aprovado pela FDE (medições aprovadas)      | 58,1% | M001 a M003 aprovadas · M004 em edição fiscal |
| Execução apontada pelo engenheiro           | —     | não informado na visita                       |
| Fiscal da FDE — último livro de ocorrências | 40%   | LO nº 12 de 30/09/2026                        |

SERVIÇOS EXECUTADOS NA SEMANA

|                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Instalação do caixilhos</li><li>Remoções caixilhos lado corredor</li><li>Pintura laboratório</li></ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

MATERIAIS — SITUAÇÃO DOS PEDIDOS EM 02/10/2026

Situação na data de emissão deste relatório (02/10/2026 às 19:21): pedidos do Sienge (01/01/2026 a 02/10/2026, exportação de 02/10/2026 13:10), marcações de entrega do painel e solicitações sem pedido de compra (Sienge, 01/10/2026).

Nenhum pedido mudou de pendente para entregue nesta semana.

27 pedidos no Sienge · 27 entregues · 0 com item pendente, somando R\$ 0,00 a receber.

0 pedido(s) sem entrega confirmada até 02/10/2026 — todos listados abaixo, do mais antigo para o mais novo.

Nada pendente no período.

Solicitações sem pedido de compra (3)

| Solicitação         | Finalidade                                                         | Itens ainda sem pedido                                                                      | Entrega                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 29323<br>26/06/2026 | FINALIDADE: MATERIAL PARA FORRO EM DRYWALL solicitado há 98 dias   | CONECTOR (CLIPES/TRAVAS PARA PERFIL) — 400 un<br>LIXA PARA DRYWALL — 20 fl                  | NÃO ENTREGUE<br>sem pedido de compra |
| 29325<br>26/06/2026 | FINALIDADE: TAPUME *PONTALETE 6X6 3 M PINUS* solicitado há 98 dias | Broxa retangular — 2 un<br>BISNAGA CORANTE AZUL ESCURO — 3 un<br>ADESIVO LOGO DO FDE — 3 un | NÃO ENTREGUE<br>sem pedido de compra |

| Solicitação         | Finalidade                                                       | Itens ainda sem pedido                                                                                                                                                                               | Entrega                                     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 29503<br>07/07/2026 | FINALIDADE:<br>COMPLEMENTO<br>COBERTURA<br>solicitado há 87 dias | Eletrodo 3,25mm — 7 kg<br>PARAFUSO AUTOBROCANTE 12 X 3/4" — 200 un<br>PARAFUSO AUTO-PERF C/ CONJ VEDACAO P/ TELHA DE ACO 1/4X3" — 700 un<br>DISCO DE CORTE INOX 180X1,6X22MM (7"X1/16"X7/8") — 50 un | <b>NÃO ENTREGUE</b><br>sem pedido de compra |

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES DA SEMANA

|                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Recomendações à contratada</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Finalizar instalação dos caixilhos</li></ul> <p><b>Pendências em aberto</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Quadra, material forro</li></ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## REGISTRO FOTOGRÁFICO DA SEMANA



30/09/2026



30/09/2026



30/09/2026



30/09/2026



30/09/2026




30/09/2026



30/09/2026



30/09/2026

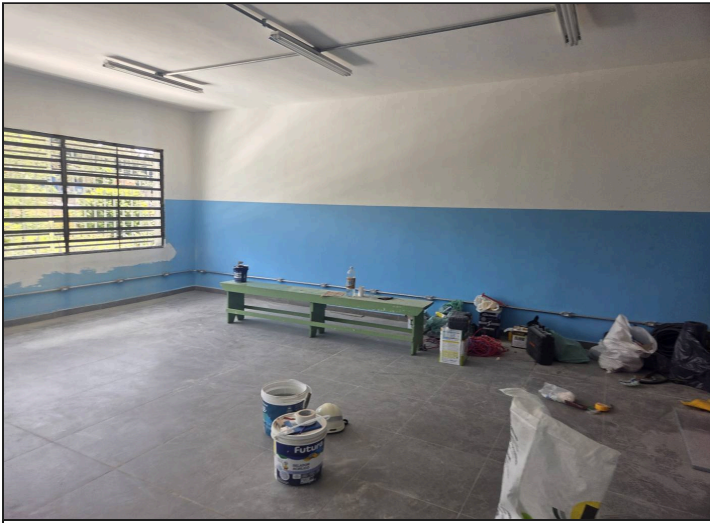

30/09/2026



30/09/2026

|                                                            |                                                  |                                         |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <p>_____<br/>Douglas<br/>Eng. responsável — contratada</p> | <p>_____<br/>RONALDO BRITTES<br/>Empreiteiro</p> | <p>_____<br/>FABIO<br/>Fiscal / FDE</p> |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
