

ATA FDE CONTRATO ATA.FDE 42.282	RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA Modelo conforme o Livro de Ocorrências da FDE · documento de acompanhamento da contratada	Nº 1
		Data: 07/10/2026
		Visita: 14:30
		Preenchido por: Eng. Luis Júnior
OBRA / UNIDADE DE ENSINO EE/CEL FRANCISCO MATARAZZO SOBRINHO (OSASCO/SP)		CÓDIGO DO PRÉDIO 124152
LOCAL OSASCO		PI (PORTAL) 2026/01256
ORDEM DE SERVIÇO —		CONTRATO FDE 05/00186/26-001-001
EMPREITEIRO RAFAEL		ENG. RESPONSÁVEL / FISCAL FDE Luis / DANILO

ITENS VERIFICADOS NA VISITA

1. Mão-de-obra / Número de funcionários Qtd. (3)	☐ Suficiente ☒ Insuficiente
2. Material em canteiro	☐ Suficiente ☒ Insuficiente
3. Equipamentos	☒ Suficiente ☐ Insuficiente
4. Tempo	☒ Seco ☐ Chuva
5. Falhas construtivas a serem corrigidas	☐ Sim ☒ Não
6. Placa de obra instalada	☐ Sim ☐ Não ☒ N/A
7. Andamento dos serviços (15) % atual aprovado 15,4% · fiscal FDE 17% (LO 29/09/2026)	☐ Não iniciada ☒ Em execução ☐ Obra paralisada ☐ Obra concluída ☐ Em rescisão
8. Ritmo da obra	☐ Normal ☒ Lento ☐ Parado
9. Organização e limpeza da obra	☐ Boa ☒ Regular ☐ Ruim
10. Previsão de término	—

AVANÇO DA OBRA

Indicador	%	Referência
Aprovado pela FDE (medições aprovadas)	15,4%	M001 a M002 aprovadas
Execução apontada pelo engenheiro	15%	visita de 07/10/2026
Fiscal da FDE — último livro de ocorrências	17%	LO nº 6 de 29/09/2026

SERVIÇOS EXECUTADOS

- Rejuntamento da bacia sanitária
- Instalação de bancada de granito

MATERIAIS — PEDIDOS SEM ENTREGA ATÉ 07/10/2026

1 pedidos no Sienge · 1 entregues · 0 com item pendente, somando R\$ 0,00 a receber.

Nenhum pedido sem entrega confirmada até 07/10/2026.

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES


Recomendações à contratada

- Uso de Epi e isolamento local de trabalho

Pendências em aberto

- Execução do forro drywall e pedido do material
- Execução da pintura
- Instalação das divisorias e portas de madeira
- Instalação do lavatório de granito
- Tubulação reservatorio

REGISTRO FOTOGRÁFICO

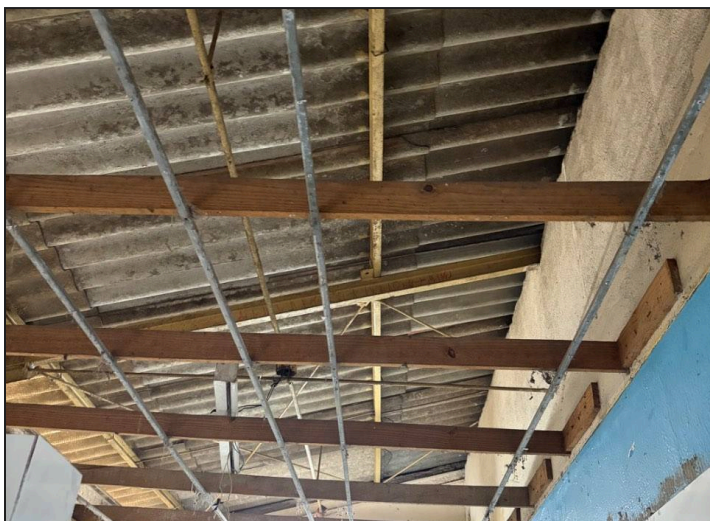

Forro wc alunos masc

07/10/2026




Ralo quebrado

07/10/2026




Acabamento azulejo parede

07/10/2026

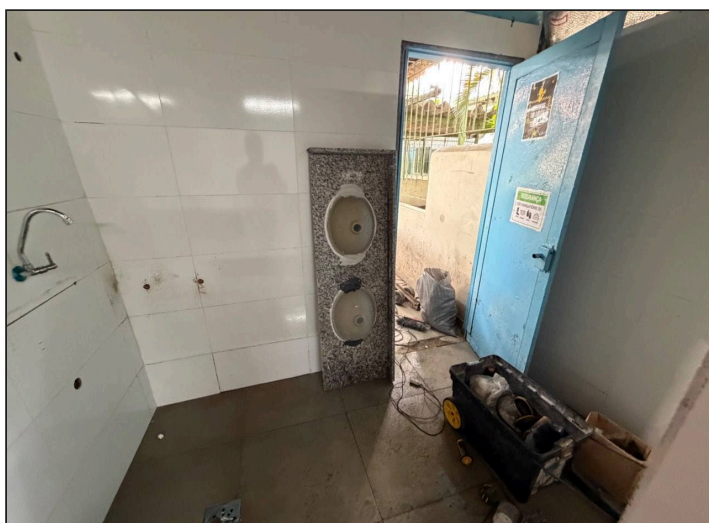


Bancada de granito in loco

07/10/2026

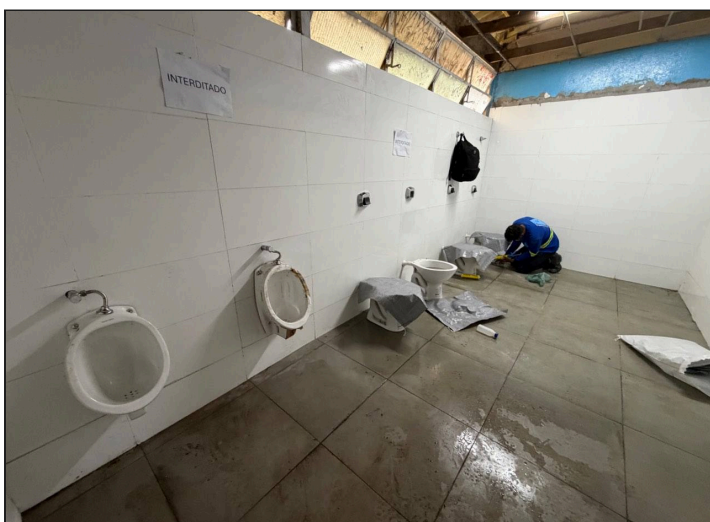

Rejuntamento bacia sanitária

07/10/2026

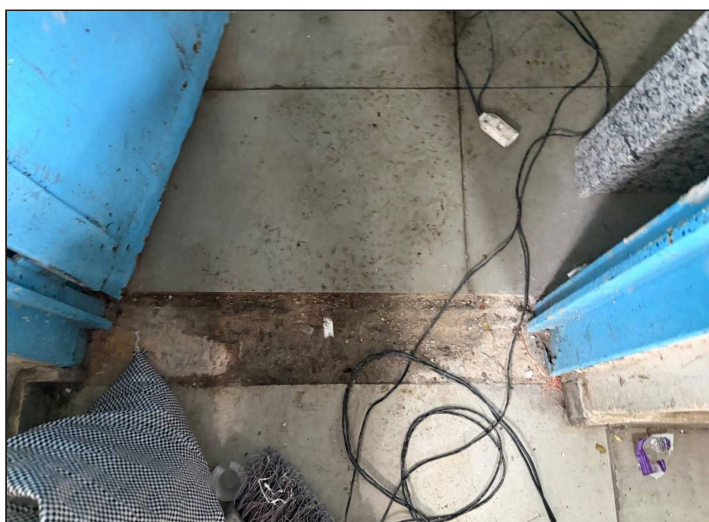

Falta instalar soleira

07/10/2026



Organização ferramentas e isolamento	07/10/2026	Piso externo	07/10/2026
--------------------------------------	------------	--------------	------------

_____ LUIS JÚNIOR Eng. responsável — contratada	_____ RAFAEL Empreiteiro	_____ DANILO Fiscal / FDE
---	--------------------------------	---------------------------------
