

ATA FDE CONTRATO ATA.FDE 42.282	RELATÓRIO SEMANAL DE ACOMPANHAMENTO Modelo conforme o Livro de Ocorrências da FDE · documento de acompanhamento da contratada	Semana 41
		05/10/2026 a 09/10/2026
		1 visita(s) registrada(s)
OBRA / UNIDADE DE ENSINO EE/CEL FRANCISCO MATARAZZO SOBRINHO (OSASCO/SP)		CÓDIGO DO PRÉDIO 124152
LOCAL OSASCO		PI (PORTAL) 2026/01256
ORDEM DE SERVIÇO —		CONTRATO FDE 05/00186/26-001-001
EMPREITEIRO RAFAEL		ENG. RESPONSÁVEL / FISCAL FDE Luis / DANILO

RESUMO DA SEMANA

Data	Dia	Efetivo	Tempo	Ritmo	% execução (eng.)
07/10/2026	qua	3	Seco	Lento	15%

1 visita(s) entre 05/10/2026 e 09/10/2026 Execução: **15%**. Previsão de término: .

AVANÇO DA OBRA

Indicador	%	Referência
Aprovado pela FDE (medições aprovadas)	15,4%	M001 a M002 aprovadas
Execução apontada pelo engenheiro	15%	visita de 09/10/2026
Fiscal da FDE — último livro de ocorrências	17%	LO nº 6 de 29/09/2026

SERVIÇOS EXECUTADOS NA SEMANA

- Rejuntamento da bacia sanitária - Instalação de bancada de granito
--

MATERIAIS — SITUAÇÃO DOS PEDIDOS EM 07/10/2026

Situação na data de emissão deste relatório (07/10/2026 às 18:10): pedidos do Sienge (01/01/2025 a 07/10/2026, exportação de 07/10/2026 01:40), marcações de entrega do painel e solicitações sem pedido de compra.

Nenhum pedido mudou de pendente para entregue nesta semana.


1 pedidos no Sienge · 1 entregues · 0 com item pendente, somando **R\$ 0,00** a receber.

Nenhum pedido sem entrega confirmada até 07/10/2026.

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES DA SEMANA

Recomendações à contratada - Uso de Epi e isolamento local de trabalho Pendências em aberto - Execução do forro drywall e pedido do material - Execução da pintura - Instalação das divisórias e portas de madeira - Instalação do lavatório de granito - Tubulação reservatorio
--

REGISTRO FOTOGRÁFICO DA SEMANA

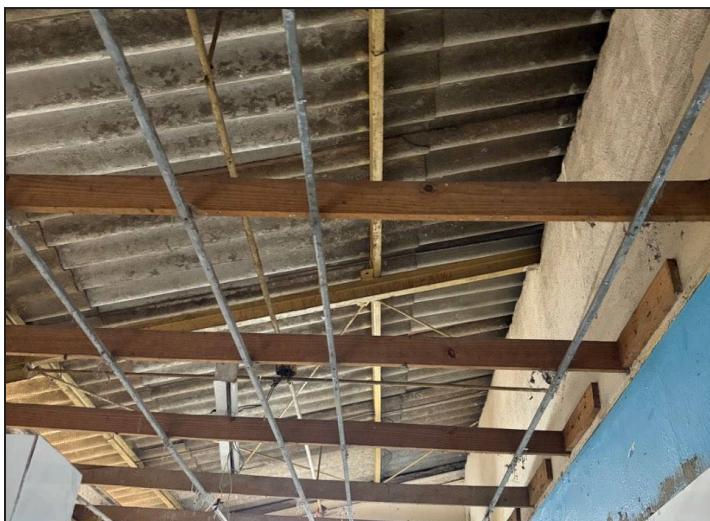

Forro wc alunos masc

07/10/2026




Ralo quebrado

07/10/2026




Acabamento azulejo parede

07/10/2026

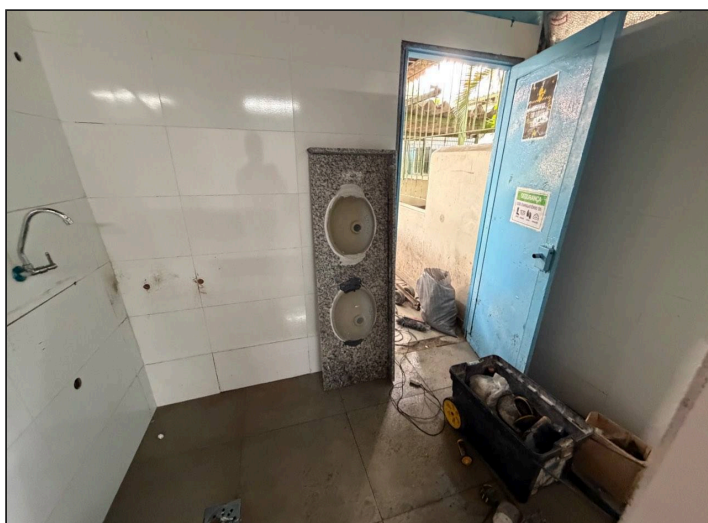


Bancada de granito in loco

07/10/2026

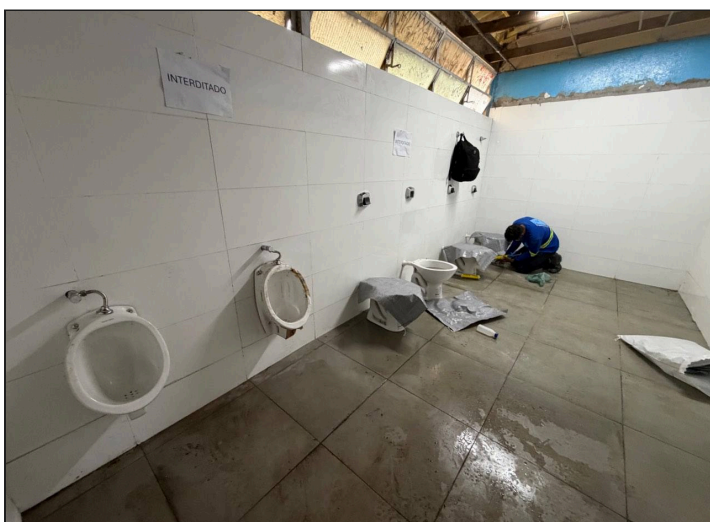

Rejuntamento bacia sanitária

07/10/2026

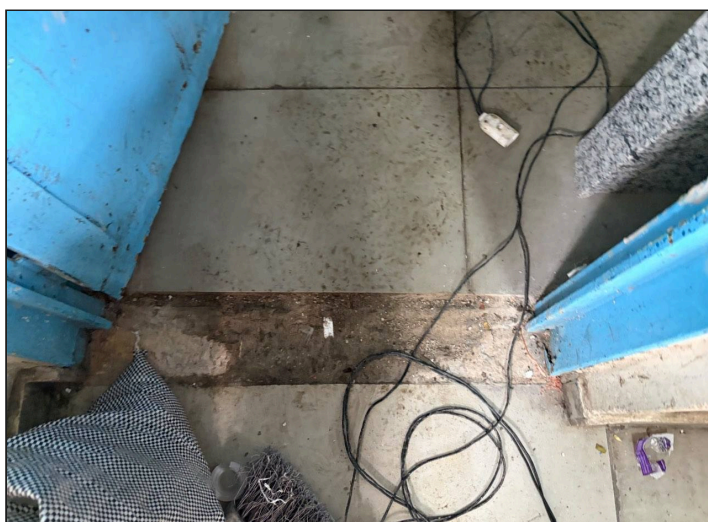

Falta instalar soleira

07/10/2026



Organização ferramentas e isolamento	07/10/2026	Piso externo	07/10/2026
--------------------------------------	------------	--------------	------------

_____ LUIS JÚNIOR Eng. responsável — contratada	_____ RAFAEL Empreiteiro	_____ DANILO Fiscal / FDE
--	---	--
