

ATA FDE CONTRATO ATA.FDE 42.218	RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA Modelo conforme o Livro de Ocorrências da FDE · documento de acompanhamento da contratada	Nº 1
		Data: 07/10/2026
		Visita: 10:02
		Preenchido por: Eng. Luis Júnior
OBRA / UNIDADE DE ENSINO EE CEL ANTONIO PAIVA DE SAMPAIO		CÓDIGO DO PRÉDIO 124138
LOCAL OSASCO		PI (PORTAL) 2026/00426
ORDEM DE SERVIÇO —		CONTRATO FDE 70/00255/26-001-001
EMPREITEIRO RAFAEL		ENG. RESPONSÁVEL / FISCAL FDE Luis / DANILO

ITENS VERIFICADOS NA VISITA

1. Mão-de-obra / Número de funcionários Qtd. (6)	☒ Suficiente ☐ Insuficiente
2. Material em canteiro	☐ Suficiente ☒ Insuficiente
3. Equipamentos	☐ Suficiente ☒ Insuficiente
4. Tempo	☒ Seco ☐ Chuva
5. Falhas construtivas a serem corrigidas	☒ Sim ☐ Não
6. Placa de obra instalada	☐ Sim ☐ Não ☒ N/A
7. Andamento dos serviços (85) % atual aprovado 59,8% · fiscal FDE 78% (LO 29/09/2026)	☐ Não iniciada ☒ Em execução ☐ Obra paralisada ☐ Obra concluída ☐ Em rescisão
8. Ritmo da obra	☒ Normal ☐ Lento ☐ Parado
9. Organização e limpeza da obra	☐ Boa ☒ Regular ☐ Ruim
10. Previsão de término	—

AVANÇO DA OBRA

Indicador	%	Referência
Aprovado pela FDE (medições aprovadas)	59,8%	M001 a M005 aprovadas · M006 em edição fiscal
Execução apontada pelo engenheiro	85%	visita de 07/10/2026
Fiscal da FDE — último livro de ocorrências	78%	LO nº 14 de 29/09/2026

SERVIÇOS EXECUTADOS

- Limpeza com jato de água fria piso externo de concreto
- Pintura mureta da quadra
- Será iniciado montagem de forro na sala

MATERIAIS — PEDIDOS SEM ENTREGA ATÉ 07/10/2026

8 pedidos no Sienge · 8 entregas · 0 com item pendente, somando R\$ 0,00 a receber.

Nenhum pedido sem entrega confirmada até 07/10/2026.

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES

Observações

- Piso da quadra de esporte está sujo de tinta e massa, danificando a pintura atual

Recomendações à contratada

- Cuidado com a pintura do piso da quadra para não ser necessário repintura de alguns trechos
- Necessário uso de Epi e calça/uniforme, funcionário com vestimenta inapropriado

Pendências em aberto

- Execução de forro pendente em banheiro e salas de aula
- Pintura do forro executado pendente em alguns ambientes

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Registro da visita

07/10/2026




Caçamba para remoção de entulho

07/10/2026




Resíduo de massa do forro no portão acesso administrativo

07/10/2026

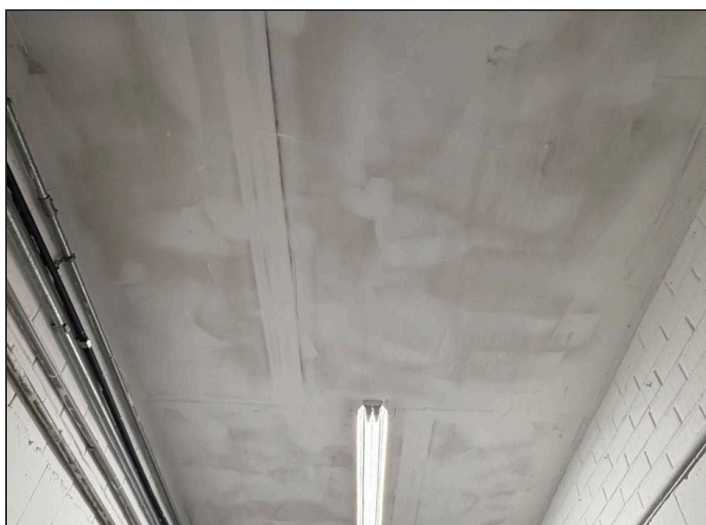


Corredor administrativo - pintura não finalizada

07/10/2026

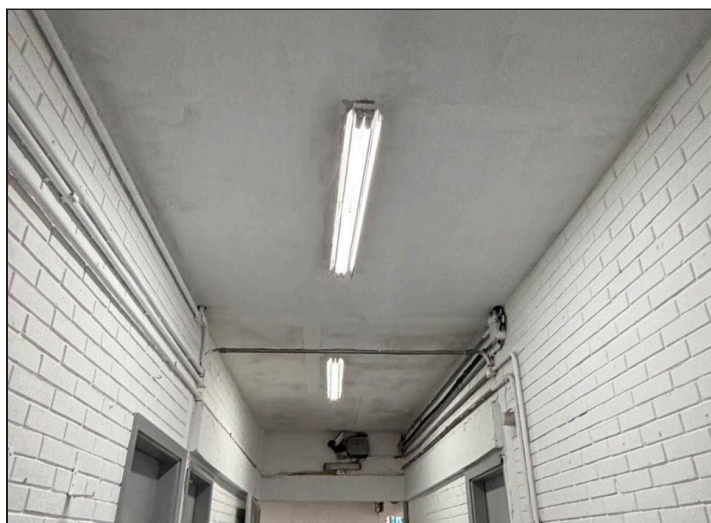


Corredor administrativo - não finalizada pintura

07/10/2026

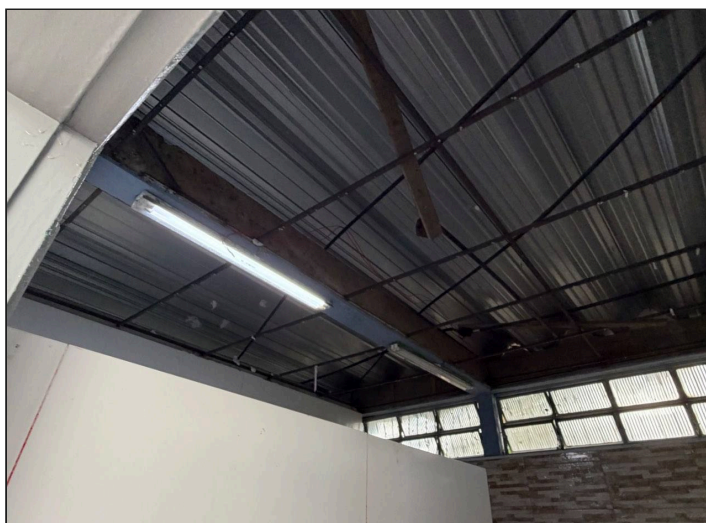

Forro não executado wc alunos masculino

07/10/2026

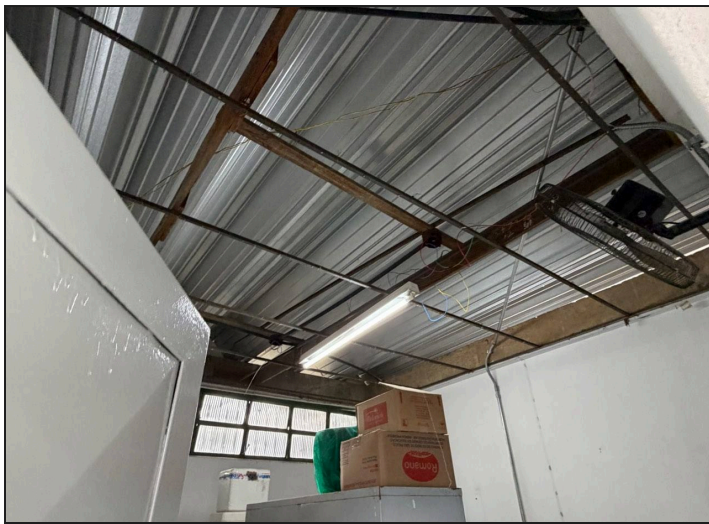


Forro - depósito material

07/10/2026



Forro não executado wc alunos feminino

07/10/2026

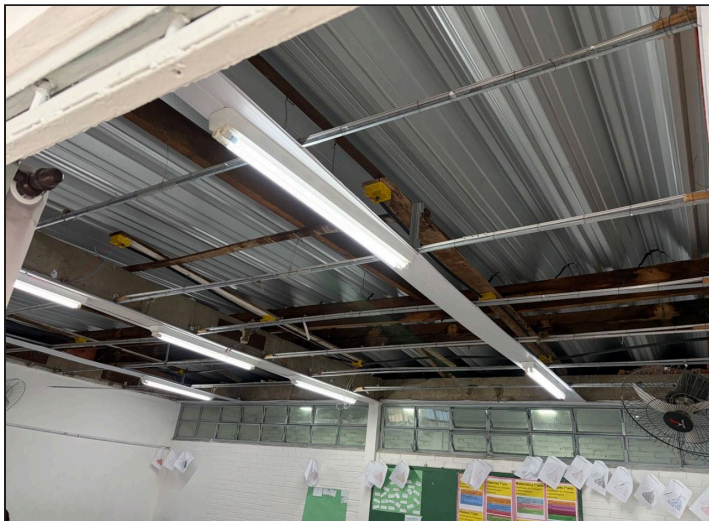

Forro não executado sala de aula

07/10/2026



Extensão fora da norma - apontado pela segurança do trabalho

07/10/2026



Quadra de esportes - pintura mureta

07/10/2026



Piso quadra sujo de tinta e massa

07/10/2026



Piso da quadra sujo

07/10/2026



Limpeza piso externo

07/10/2026



Trabalho em altura

07/10/2026

_____ LUIS JÚNIOR Eng. responsável — contratada	_____ RAFAEL Empreiteiro	_____ DANILO Fiscal / FDE
--	---	--
