

ATA FDE CONTRATO ATA.FDE 41.278	RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA Modelo conforme o Livro de Ocorrências da FDE · documento de acompanhamento da contratada	Nº 1
		Data: 06/10/2026
		Visita: 11:23
		Preenchido por: Eng. Douglas
OBRA / UNIDADE DE ENSINO EE GERTRUDES EDER		CÓDIGO DO PRÉDIO 116104
LOCAL ITAPECERICA DA SERRA		PI (PORTAL) 2026/01192
ORDEM DE SERVIÇO —		CONTRATO FDE 70/00589/26-001-001
EMPREITEIRO LEONARDO ZANAO		ENG. RESPONSÁVEL / FISCAL FDE Douglas / RENATO

ITENS VERIFICADOS NA VISITA

1. Mão-de-obra / Número de funcionários Qtd. (3)	☐ Suficiente ☒ Insuficiente
2. Material em canteiro	☒ Suficiente ☐ Insuficiente
3. Equipamentos	☒ Suficiente ☐ Insuficiente
4. Tempo	☒ Seco ☐ Chuva
5. Falhas construtivas a serem corrigidas	☐ Sim ☒ Não
6. Placa de obra instalada	☐ Sim ☐ Não ☒ N/A
7. Andamento dos serviços (10) % atual aprovado 9,9% · fiscal FDE 24% (LO 17/09/2026)	☐ Não iniciada ☒ Em execução ☐ Obra paralisada ☐ Obra concluída ☐ Em rescisão
8. Ritmo da obra	☐ Normal ☒ Lento ☐ Parado
9. Organização e limpeza da obra	☐ Boa ☒ Regular ☐ Ruim
10. Previsão de término	—

AVANÇO DA OBRA

Indicador	%	Referência
Aprovado pela FDE (medições aprovadas)	9,9%	M001 a M003 aprovadas
Execução apontada pelo engenheiro	10%	visita de 06/10/2026
Fiscal da FDE — último livro de ocorrências	24%	LO nº 10 de 17/09/2026

SERVIÇOS EXECUTADOS

- INICIANDO ESTRUTURA COBERTURA

MATERIAIS — PEDIDOS SEM ENTREGA ATÉ 06/10/2026

19 pedidos no Sienge · 19 entregues · 0 com item pendente, somando R\$ 0,00 a receber.

Nenhum pedido sem entrega confirmada até 06/10/2026.

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES

Observações

- FINALIZAR ZELADORIA - LOUÇAS E METAIS
- ZELADORIA - VIDROS COMPRAR VIDROS CAIXILHOS
- CUMIEIRA ENTREGUE SEM PINTURA- REALIZAR PINTURA NA OBRA


Recomendações à contratada

- AUMENTAR EFETIVO, PARA EXECUÇÃO DE COBERTURA

Pendências em aberto

- ELETRICA ZELADORIA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

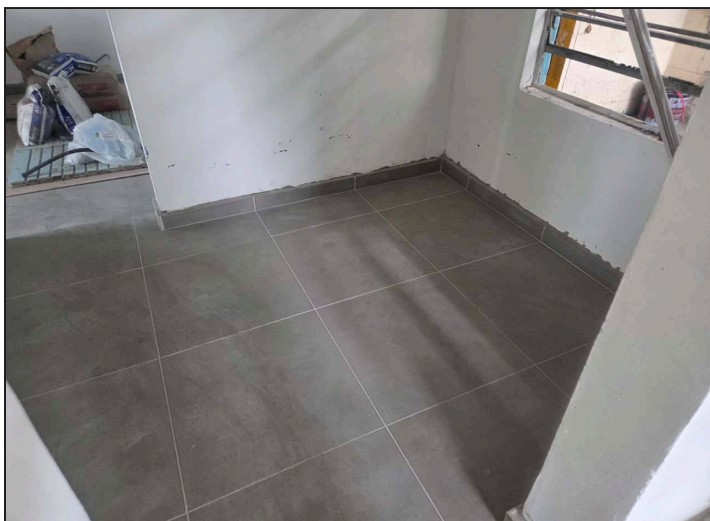


Registro da visita

07/10/2026




Registro da visita

07/10/2026

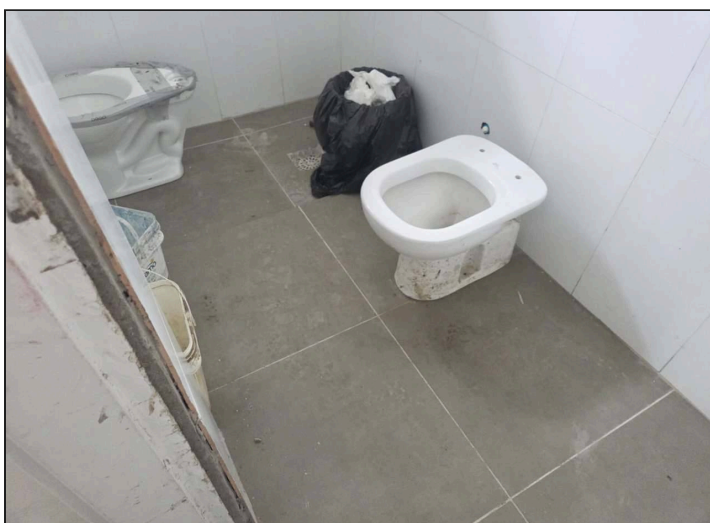

Registro da visita

07/10/2026

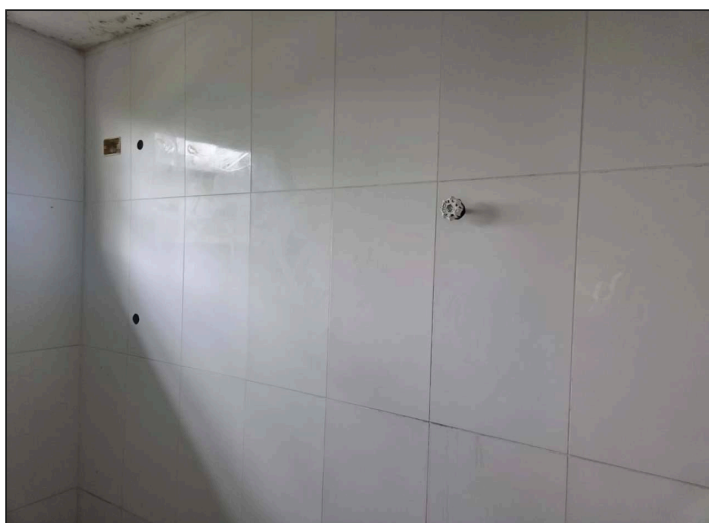


Registro da visita

07/10/2026



Registro da visita

07/10/2026

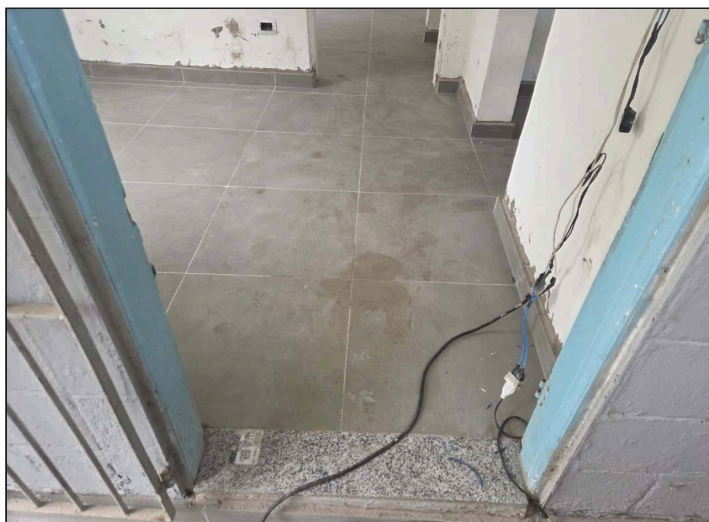


Registro da visita

07/10/2026



Registro da visita

07/10/2026

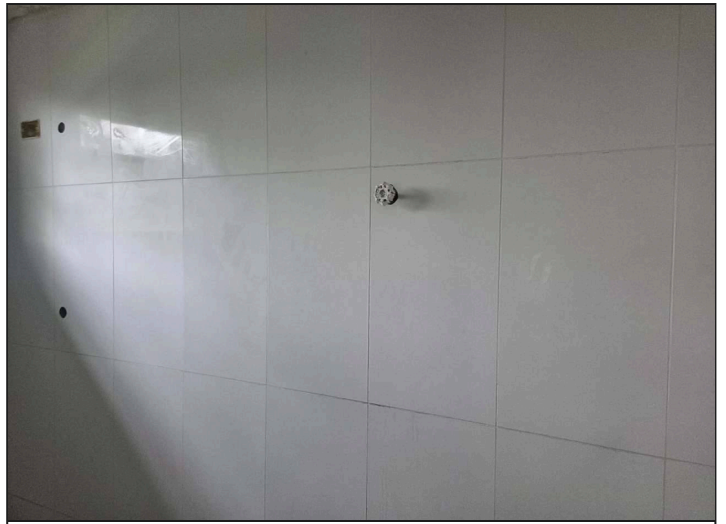

Registro da visita

07/10/2026



Registro da visita

07/10/2026




Registro da visita

07/10/2026




Registro da visita

07/10/2026

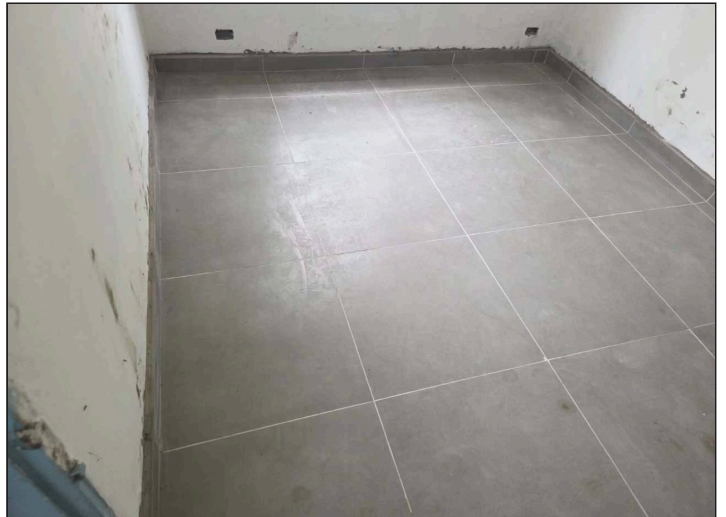

Registro da visita

07/10/2026

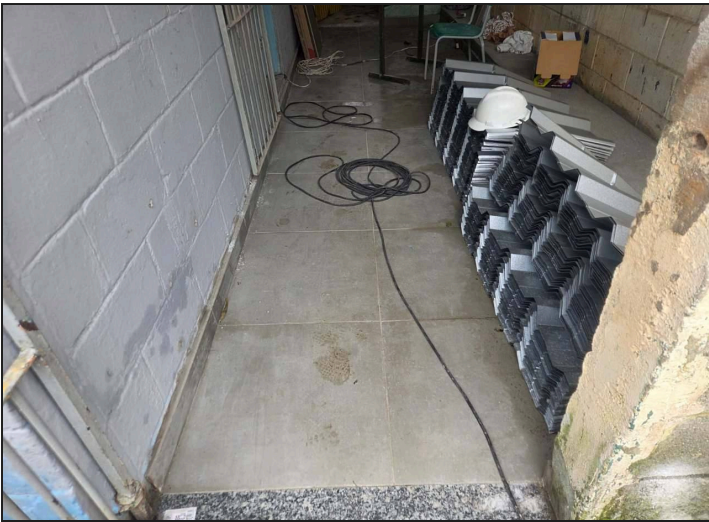


Registro da visita

07/10/2026



Registro da visita

07/10/2026

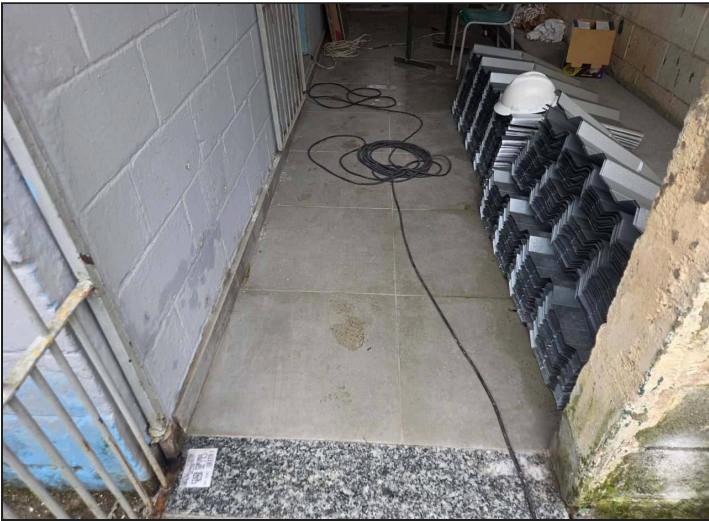

Registro da visita

07/10/2026

DOUGLAS Eng. responsável — contratada	LEONARDO ZANAO Empreiteiro	RENATO Fiscal / FDE
---	--	---
