

ATA FDE CONTRATO ATA.FDE 41.281	RELATÓRIO SEMANAL DE ACOMPANHAMENTO Modelo conforme o Livro de Ocorrências da FDE · documento de acompanhamento da contratada	Semana 41
		05/10/2026 a 09/10/2026
		2 visita(s) registrada(s)
OBRA / UNIDADE DE ENSINO EE BAIRRO DOS BARNABES		CÓDIGO DO PRÉDIO 120102
LOCAL JUQUITIBA		PI (PORTAL) 2026/02404
ORDEM DE SERVIÇO —		CONTRATO FDE 05/00820/26-001-001
EMPREITEIRO UP! RIGHT ENGENHARIA		ENG. RESPONSÁVEL / FISCAL FDE Douglas / GUILHERME

RESUMO DA SEMANA

Data	Dia	Efetivo	Tempo	Ritmo	% execução (eng.)
07/10/2026	qua	0	Seco	Parado	0%
07/10/2026	qua	0	Seco	Parado	0%

2 visita(s) entre 05/10/2026 e 09/10/2026 Execução: 0%. Previsão de término: .

AVANÇO DA OBRA

Indicador	%	Referência
Aprovado pela FDE (medições aprovadas)	11,5%	M001 a M002 aprovadas · M003 em edição fiscal
Execução apontada pelo engenheiro	0%	visita de 09/10/2026
Fiscal da FDE — último livro de ocorrências	0%	LO nº 1 de 03/08/2026

SERVIÇOS EXECUTADOS NA SEMANA

- Piso cozinha - Rede de esgoto

MATERIAIS — SITUAÇÃO DOS PEDIDOS EM 07/10/2026

Situação na data de emissão deste relatório (07/10/2026 às 15:13): pedidos do Sienge (01/01/2025 a 07/10/2026, exportação de 07/10/2026 01:40), marcações de entrega do painel e solicitações sem pedido de compra (Sienge, 07/10/2026).

Nenhum pedido mudou de pendente para entregue nesta semana.

4 pedidos no Sienge · 4 entregues · 0 com item pendente, somando R\$ 0,00 a receber.

Nenhum pedido sem entrega confirmada até 07/10/2026.

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES DA SEMANA


Pendências em aberto - Porcelanato - Argamassa - Definição fiscalização e diretoria de ensino onde realizar a ligação da rede de esgoto
--

REGISTRO FOTOGRÁFICO DA SEMANA




Registro da visita

07/10/2026

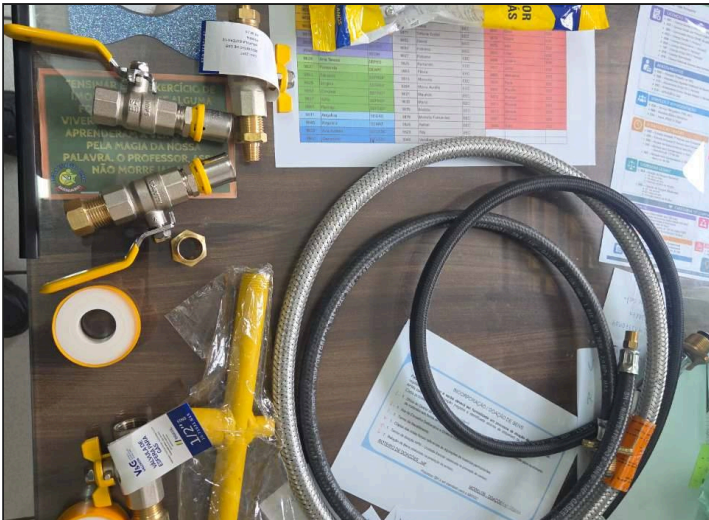


Registro da visita

07/10/2026

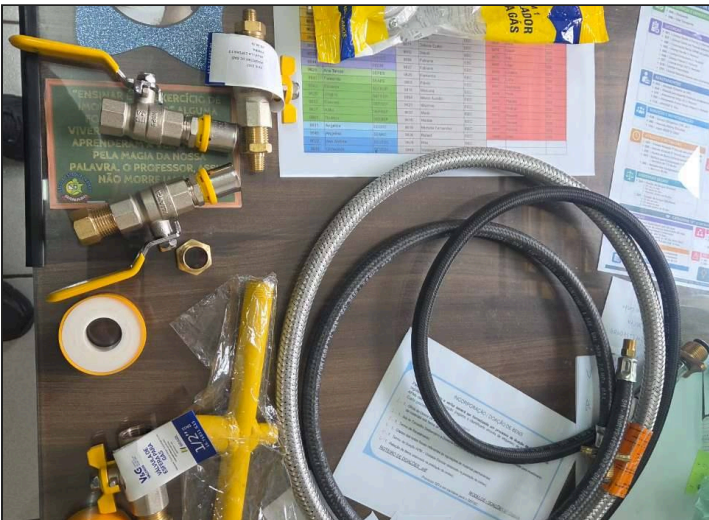

Registro da visita

07/10/2026

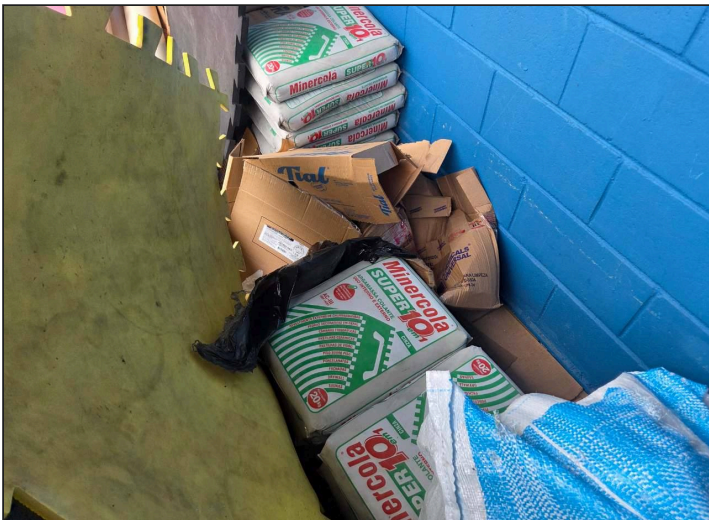

Registro da visita

07/10/2026



Registro da visita

07/10/2026

DOUGLAS
Eng. responsável — contratada

UP! RIGHT ENGENHARIA
Empreiteiro

GUILHERME
Fiscal / FDE
