

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Vistoria NR-18 · Modelo único SST FDE rev01 · pontuação conforme Relatório de Performance de Obra da FDE

Data: 07/10/2026 · 11:43
Obra: 233
Vistoria por: Fernando
código 233-muy8akwh

UNIDADE DE ENSINO 233 — EE JACIRA		MUNICÍPIO ITAPECERICA DA SERRA / SP		TIPO DE OBRA Reforma			
CONTRATO FDE 70/00361/26-001-001		PI 2023/02397		ORDEM DE SERVIÇO 70/00361/26		CÓDIGO FDE —	
EMPREITEIRO RENILDO		CONTRATADA ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS		FASE DA OBRA NA VISTORIA Pintura			
RESPONSÁVEL TÉCNICO Reynildo		ENCARREGADO / PREPOSTO Reynildo		RESPONSÁVEL PELA VISTORIA (SST) Fernando		REGISTRO PROFISSIONAL —	
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DOUGLAS		FISCAL FDE FABIO		PRAZO CONTRATUAL 210 dias		ENDEREÇO —	
PRAZO DECORRIDO NA DATA DA VISTORIA início 30/04/2026 · término previsto 30/11/2026 · decorridos 160 de 214 dias (75%) · restam 54 dias na data da vistoria							

RESULTADO DA AVALIAÇÃO

Classificação geral

REGULAR / ATENÇÃO

média ponderada 1,857 (0 = ótimo · 4 = péssimo)

AÇÃO IMEDIATA — item com nota 4 (PÉSSIMO)

54%

Índice de conformidade

25

Itens avaliados (de 38)

78

Total de pontos (peso × nota)

3,120

Média FDE (total ÷ itens)

4 · Péssimo

Pior nota da vistoria

5


Não conformidades abertas

Distribuição das notas dos itens avaliados: ■ Ótimo 4 ■ Bom 13 ■ Ruim 4 ■ Péssimo 4

RESUMO DA VISTORIA POR GRUPO


GRUPO DE ITENS (NR-18)	ITENS	CONFORMES	NÃO CONFORMES	N.A.
3 · Documentos — comunicação prévia	1	1	0	—
4 · PGR — programa de gerenciamento de riscos	6	6	0	—
5 · PPRA	1	1	0	—
6 · PCMSO	1	1	0	—
7 · Áreas de vivência	10	8	0	2
8 · Instalações elétricas	4	2	0	2
16 · Escadas, rampas e passarelas	3	2	0	1
17 · Proteção contra queda	7	3	3	—
18 · Máquinas, equipamentos e ferramentas	5	3	0	2
19 · Movimentação e transporte	2	2	0	—
20 · Andaimos e plataformas	9	3	3	3
21 · Sinalização de segurança	1	1	0	—
22 · TREINAMENTOS E EPI (quadro de colaboradores na aba 2)	2	1	1	—
23 · Gerais	4	1	2	1

Grupos não aplicáveis à etapa da obra (todos os itens N.A.): 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

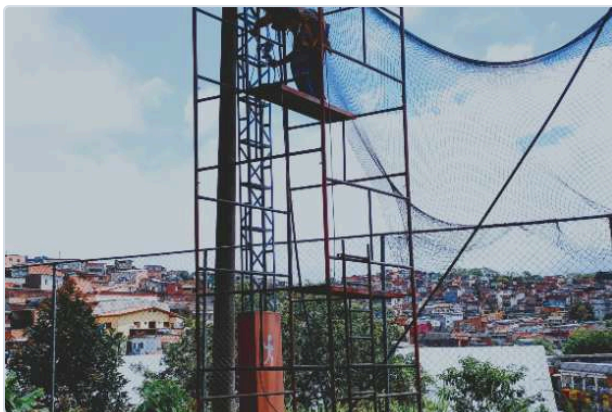

NC 1 · Colaboradores sem EPI e uso de andaime incorreto

Item da vistoria	17.1 — Proteção contra queda — telhado / cobertura (NR-35 / NR-18.16)
Local	Quadra
Risco	Queda
Classificação	CRÍTICO
Ação corretiva	Imediato
Prazo	07/10/2026
Responsável	Reynildo
Status	Aberta

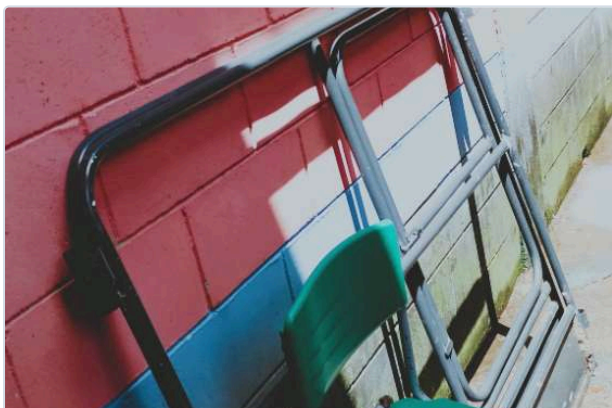

NC 2 · Colaboradores sem EPI e uso de andaime incorreto

Item da vistoria	20.1 — Andaimos / plataformas de trabalho (NR-18.18)
Local	Quadra
Risco	Queda
Classificação	CRÍTICO
Ação corretiva	Imediato
Prazo	07/10/2026
Responsável	Reynildo
Status	Aberta



NC 3 · Colaboradores sem EPI e uso de andaime incorreto

Item da vistoria	17.3 — Treinamento NR-35 dos trabalhadores em altura (NR-35.3)
Local	Quadra
Risco	Queda
Classificação	CRÍTICO
Ação corretiva	Imediato
Prazo	07/10/2026
Responsável	Reynildo
Status	Aberta



NC 4 · Colaboradores sem EPI e uso de andaime incorreto

Item da vistoria	17.2 — Cabo guia / linha de vida instalada (NR-35.5)
Local	Quadra
Risco	Queda
Classificação	CRÍTICO
Ação corretiva	Imediato
Prazo	07/10/2026
Responsável	Reynildo
Status	Aberta



NC 5 · Colaboradores sem EPI e uso de andaime incorreto

Item da vistoria	22.1 — EPIs adequados fornecidos, com CA válido e em uso efetivo (NR-06.6.1 / NR-06.7.1)
Local	Quadra
Risco	Alto
Classificação	ALTO
Ação corretiva	Imediato
Prazo	07/10/2026
Responsável	Reynildo
Status	Aberta

PONTUAÇÃO CONFORME CRITÉRIO FDE

Nº	ITEM AVALIADO	PESO	NOTA	PONTOS
1	Tem registro em carteira de trabalho	3	4 · Péssimo	12
2	Efetuada a comunicação ao SIT	1	0 · Ótimo	0
3	Possui a obra PGR	1	0 · Ótimo	0
4	Possui a obra PCMSO	1	0 · Ótimo	0
5	Possuem os funcionários da obra ASO	1	4 · Péssimo	4
6	Possui a obra PPRA	1	0 · Ótimo	0
7	Instalações Sanitárias	2	1 · Bom	2
8	Vestiários	2	1 · Bom	2
10	Refeitório	2	1 · Bom	2
11	Água potável	2	1 · Bom	2
13	Instalações elétricas	3	1 · Bom	3
23	Escadas	2	1 · Bom	2

Nº	ITEM AVALIADO	PESO	NOTA	PONTOS
24	Rampas	1	1 · Bom	1
26	Proteção Contra Queda - Telhado	3	3 · Ruim	9
28	Maquinas / Equipamentos	2	1 · Bom	2
29	Ferramentas	1	1 · Bom	1
30	Movimentação Materiais	1	1 · Bom	1
31	Movimentação / Transporte de Pessoas	2	1 · Bom	2
32	Andaimes	3	3 · Ruim	9
33	Sinalização de Segurança	1	1 · Bom	1
34	Treinamentos	2	4 · Péssimo	8
35	EPI	2	4 · Péssimo	8
36	Armazenagem de Materiais	1	3 · Ruim	3
37	Ordem e Limpeza	1	3 · Ruim	3
38	Tapumes / Isolamento Obra	1	1 · Bom	1
Total · 25 itens · soma dos pesos 42				78

13 item(ns) da pontuação sem avaliação nesta vistoria (N.A. ou não verificados) — fora da média.

VISTORIA NR-18 — ITENS VERIFICADOS			
ITEM	O QUE FOI VERIFICADO	NR	RESPOSTA
3 · Documentos — comunicação prévia			
3.1	Comunicação prévia à SIT efetuada antes do início das atividades	NR-18.4.1	Sim
4 · PGR — programa de gerenciamento de riscos			
4.1	PGR mantido no local, à disposição da fiscalização	NR-01.5.3	Sim
4.2	Descrição dos riscos e APR — Análise Preliminar de Risco	NR-01.5.4	Sim
4.3	Inventário de riscos por fase (físico, químico, biológico, mecânico, ergonômico, psicossocial)	NR-01.5.5	Sim
4.4	Plano de ação com as medidas previstas e as executadas	NR-01.5.4.4	Sim
4.5	Projeto do SPIQ — Proteção Individual Contra Quedas (quando aplicável)	NR-35.4.1	Sim
4.6	Relação de EPI com especificações técnicas por risco	NR-06.6.1	Sim
5 · PPRA			
5.1	PPRA mantido no local, à disposição da fiscalização	NR-09	Sim
6 · PCMSO			
6.1	PCMSO mantido no local, à disposição da fiscalização	NR-07	Sim
7 · Áreas de vivência			
7.1.1	Instalações sanitárias — lavatórios	NR-18.5 / NR-24	Satisfatório
7.1.2	Instalações sanitárias — vaso sanitário	NR-18.5 / NR-24	Satisfatório
7.1.3	Instalações sanitárias — mictório	NR-18.5 / NR-24	Satisfatório
7.1.4	Instalações sanitárias — chuveiro	NR-18.5 / NR-24	Satisfatório
7.2	Vestiário para troca de roupa dos colaboradores	NR-18.5.4 / NR-24.4	Satisfatório
7.4	Refeitório	NR-18.5.3	Satisfatório
7.5.1	Água potável — bebedouro disponível	NR-24.6	Sim
7.5.2	Uso de copo coletivo	NR-24.6.3	Não
8 · Instalações elétricas			
8.3	Instalações gerais — extensões, cabos e tomadas	NR-18.21	Satisfatório
8.4	Quadros elétricos — proteção, identificação e DR	NR-18.21	Satisfatório

ITEM	O QUE FOI VERIFICADO	NR	RESPOSTA
16 · Escadas, rampas e passarelas			
16.1	Escadas	NR-18.15	Satisfatório
16.2	Rampas	NR-18.15	Satisfatório
17 · Proteção contra queda			
17.1	Proteção contra queda — telhado / cobertura Colaboradores sem EPI e uso de andaime incorreto — ação: Imediato	NR-35 / NR-18.16	Insatisfatório
17.2	Cabo guia / linha de vida instalada Colaboradores sem EPI e uso de andaime incorreto — ação: Imediato	NR-35.5	Não
17.3	Treinamento NR-35 dos trabalhadores em altura Colaboradores sem EPI e uso de andaime incorreto — ação: Imediato	NR-35.3	Não
17.4	Análise de Risco (AR) do trabalho em altura	NR-35.4	Sim
17.5	Permissão de Trabalho (PT) emitida	NR-35.4.6	Sim
17.6	Sinalização e isolamento da área abaixo	NR-18.13	Sim
18 · Máquinas, equipamentos e ferramentas			
18.1	Máquinas com proteções fixas / móveis	NR-12.4	Sim
18.2	Dispositivo de parada de emergência	NR-12.5	Sim
18.4	Ferramentas manuais	NR-18.22	Satisfatório
19 · Movimentação e transporte			
19.1	Movimentação e transporte de materiais	NR-18.17 / NR-11	Satisfatório
19.2	Movimentação e transporte de pessoas	NR-18.17	Satisfatório
20 · Andaimos e plataformas			
20.1	Andaimos / plataformas de trabalho Colaboradores sem EPI e uso de andaime incorreto — ação: Imediato	NR-18.18	Insatisfatório
20.2	Piso completo, travado e dimensionado	NR-18.18	Sim
20.4	Guarda-corpo e rodapé Colaboradores sem EPI e uso de andaime incorreto — ação: Imediato	NR-18.18	Não
20.5	Treinamento NR-35 dos montadores / usuários Colaborador sem documentos — ação: Imediato	NR-35	Não
20.6	Análise de Risco (AR) da montagem	NR-35.4	Sim
20.7	Permissão de Trabalho (PT)	NR-35.4.6	Sim
21 · Sinalização de segurança			
21.1	Sinalização de segurança — EPI obrigatório, riscos, setorização e isolamento	NR-18.13	Satisfatório
22 · TREINAMENTOS E EPI (quadro de colaboradores na aba 2)			
22.1	EPIs adequados fornecidos, com CA válido e em uso efetivo Colaboradores não usam epi — ação: Imediato	NR-06.6.1 / NR-06.7.1	Insatisfatório
22.2	Ordem de Serviço e DDS — Diálogo Diário de Segurança registrado	NR-01.4.1	Sim
23 · Gerais			
23.1	Armazenagem de materiais Local desorganizado — ação: Imediato	NR-18.19	Insatisfatório
23.2	Ordem e limpeza — resíduos, embalagens e circulações desobstruídas Limpeza do local urgente conforme NR 18 — ação: Imediato	NR-18.19	Insatisfatório
23.3	Tapumes / isolamento da obra — barreira rígida, estável e contínua	NR-18.13	Satisfatório

COLABORADORES EM OBRA

2 colaborador(es) (0 próprio(s), 2 subempreitado(s)). Pendências: CTPS 2 · ASO 2 · treinamento 2 · ficha de EPI 2. Nomes só na versão completa (pasta INSPECOES).

