

RELATÓRIO SEMANAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Consolidado das vistorias NR-18 da semana · Modelo único SST FDE rev01

Semana **40**

28/09/2026 a 02/10/2026

Obra: **224**

2 vistoria(s)

UNIDADE DE ENSINO 224 — ELIZA DE OLIVEIRA RIBEIRO		MUNICÍPIO ITAPEVI / SP	CONTRATO FDE 70/00338/26-001-001
EMPREITEIRO ANTONIO CABELO	CONTRATADA B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL LEONARDO	FISCAL FDE RODRIGO
PRAZO DECORRIDO NO FIM DA SEMANA início 04/05/2026 · término previsto 04/02/2027 · decorridos 151 de 276 dias (55%) · restam 125 dias na sexta-feira			

VISTORIAS DA SEMANA

DATA	RESPONSÁVEL	FASE	CLASSIFICAÇÃO	MÉDIA	CONFORMIDADE	NC
28/09/2026	Reginaldo Eder	Organização e limpeza pré eleições	ÓTIMO	0,842	79%	2
29/09/2026	Reginaldo Eder	Limpeza e organização do material da obra	ÓTIMO	0,955	76%	1


ÓTIMO

situação na última vistoria (29/09/2026) · média ponderada **0,955** · evolução na semana: 0,842 → 0,955 (piorou)
CORREÇÃO IMEDIATA — item com nota 3 (RUIM)

ITENS NÃO CONFORMES NA VISTORIA


DATA	ITEM	O QUE FOI VERIFICADO	NR
28/09/2026	23.1	Armazenagem de materiais Sacos de argamassa na entrada do banheiro	NR-18.19
28/09/2026	23.2	Ordem e limpeza — resíduos, embalagens e circulações desobstruídas Sacos de argamassa na entrada do banheiro	NR-18.19
29/09/2026	23.1	Armazenagem de materiais Os sacos de argamassa permanecem em frente ao banheiro	NR-18.19
29/09/2026	23.4	Interface com a comunidade escolar — controle efetivo de acesso sacos de argamassa impedem o acesso livre ao banheiro	NR-18.13
29/09/2026	23.2	Ordem e limpeza — resíduos, embalagens e circulações desobstruídas Restos de material em locais de acesso. Os caos de argamassa na entrada do banheiro	NR-18.19

NÃO CONFORMIDADES DA SEMANA — REGISTRO FOTOGRÁFICO

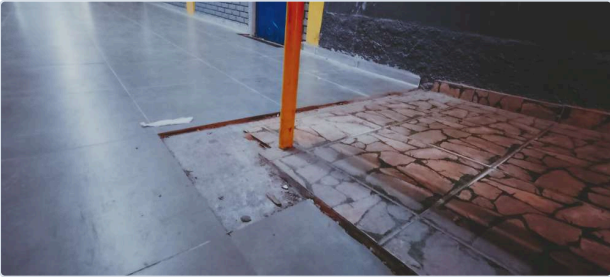


28/09/2026 · Piso com desnível acima, sentido do pátio para as salas de aula, falta dos recortes dos pisos no incio da rampa, falta das soleiras das portas.

Item	23.4 — Interface com a comunidade escolar — controle efetivo de acesso
Local	Piso
Classificação	ALTO
Ação corretiva	Assentamento das peças faltantes com extrema urgência
Prazo	02/10/2026
Responsável	Antonio / Ludmila
Status	Aberta

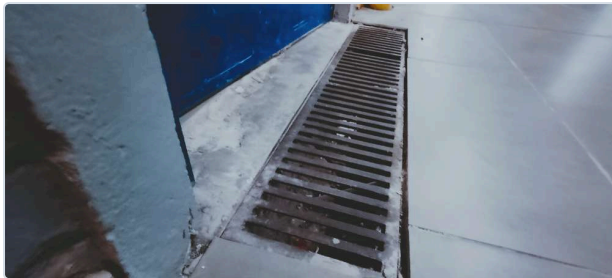

28/09/2026 · falta das soleiras das portas

Item	23.4 — Interface com a comunidade escolar — controle efetivo de acesso
Local	Piso
Classificação	ALTO
Ação corretiva	Assentamento das peças faltantes com extrema urgência
Prazo	02/10/2026
Responsável	Antonio
Status	Aberta

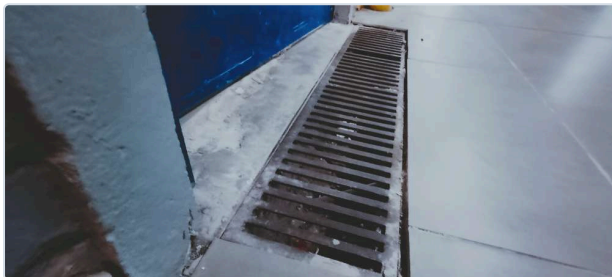

29/09/2026 · No piso novo foi deixado desnível no sentido do pátio para as salas de aula, possível ocasionador de tropeções. Falta de recortes e acabamentos do piso para rampa e falta das soleiras das salas. Todos podendo gerar entorses, quedas e ou tropeções.

Item	23.4 — Interface com a comunidade escolar — controle efetivo de acesso
Local	Piso novo - Desníveis e falta de piso em alguns locais
Classificação	ALTO
Ação corretiva	Retirada imediata/ colocação dentro da área isolada (tapume)
Prazo	02/10/2026
Responsável	Antonio / Ludmila
Status	Aberta

ACOMPANHAMENTO

DATA	EFETIVO	ATIVIDADES	ITENS DE SST OBSERVADOS	PENDÊNCIAS
28/09/2026	3	Organização e limpeza para as eleições		
29/09/2026	2	Limpeza e organização, foco no banheiro onde se concentrava material, ferramentas.		

Colaboradores lançados na vistoria mais completa da semana: 1.

Reginaldo Eder
Responsável SST

LEONARDO
Engenheiro responsável

ANTONIO CABELO
Empreiteiro

Gerado em 02/10/2026 19:09 · consolidado de 2 vistoria(s) do formulário do painel (224-murbgfv2, 224-murandm7). Os relatórios de cada vistoria ficam na aba Segurança.

RELATÓRIO SEMANAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Consolidado das vistorias NR-18 da semana · Modelo único SST FDE rev01

Semana **40**

28/09/2026 a 02/10/2026

Obra: **228**

1 vistoria(s)

UNIDADE DE ENSINO 228 — NERCY AMELIA MARTELINI DAHER PROFESSORA		MUNICÍPIO PIRAPORA DO BOM JESUS / SP	CONTRATO FDE 70/00313/26-001-001
EMPREITEIRO ARAUJO	CONTRATADA B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL LEONARDO	FISCAL FDE RODRIGO
PRAZO DECORRIDO NO FIM DA SEMANA início 04/05/2026 · término previsto 04/02/2027 · decorridos 151 de 276 dias (55%) · restam 125 dias na sexta-feira			

VISTORIAS DA SEMANA

DATA	RESPONSÁVEL	FASE	CLASSIFICAÇÃO	MÉDIA	CONFORMIDADE	NC
30/09/2026	Reginaldo Eder	Limpeza e organização da obra para eleição	BOM	1,000	75%	0

BOM

situação na última vistoria (30/09/2026) · média ponderada **1,000**
CORREÇÃO IMEDIATA — item com nota 3 (RUIM)

ITENS NÃO CONFORMES NA VISTORIA

DATA	ITEM	O QUE FOI VERIFICADO	NR
30/09/2026	23.1	Armazenagem de materiais Areia, pedra e blocos, deixados na calçada sem isolamento	NR-18.19
30/09/2026	23.3	Tapumes / isolamento da obra — barreira rígida, estável e contínua Isolamento do material na calçada, pintura de acordo com as normas da FDE	NR-18.13

NÃO CONFORMIDADES DA SEMANA — REGISTRO FOTOGRÁFICO

Nenhuma não conformidade registrada na semana.

Reginaldo Eder
Responsável SST

LEONARDO
Engenheiro responsável

ARAUJO
Empreiteiro

Gerado em 02/10/2026 19:09 · consolidado de 1 vistoria(s) do formulário do painel (228-mur36p5n). Os relatórios de cada vistoria ficam na aba Segurança.

ATA FDE CONTRATO ATA.FDE 42.228	RELATÓRIO SEMANAL DE ACOMPANHAMENTO Modelo conforme o Livro de Ocorrências da FDE · documento de acompanhamento da contratada	Semana 40
		28/09/2026 a 02/10/2026
		1 visita(s) registrada(s)
OBRA / UNIDADE DE ENSINO NERCY AMELIA MARTELINI DAHER PROFESSORA		CÓDIGO DO PRÉDIO 125102
LOCAL PIRAPORA DO BOM JESUS		PI (PORTAL) 2023/02722
ORDEM DE SERVIÇO —		CONTRATO FDE 70/00313/26-001-001
EMPREITEIRO ARAUJO		ENG. RESPONSÁVEL / FISCAL FDE LEONARDO / RODRIGO

RESUMO DA SEMANA

Data	Dia	Efetivo	Tempo	Ritmo	% execução (eng.)
01/10/2026	qui	6	Chuva	Normal	—

1 visita(s) entre 28/09/2026 e 02/10/2026 1 dia(s) de chuva. Previsão de término: .

AVANÇO DA OBRA

Indicador	%	Referência
Aprovado pela FDE (medições aprovadas)	65%	M001 a M004 aprovadas · M005 em análise fiscal
Execução apontada pelo engenheiro	—	não informado na visita
Fiscal da FDE — último livro de ocorrências	57%	LO nº 13 de 18/09/2026

SERVIÇOS EXECUTADOS NA SEMANA

- EXECUÇÃO DE FORRO DE GESSO NA SALA DE LEITURA - ADEQUAÇÃO DA RAMPA DE ACESSO ÀS SALAS - EXECUÇÃO DE LIMPEZA DA OBRA - INSTALAÇÃO DE PORTAS NAS SALAS
--

MATERIAIS — SITUAÇÃO DOS PEDIDOS EM 04/10/2026

Situação na data de emissão deste relatório (04/10/2026 às 23:52): pedidos do Sienge (01/01/2026 a 02/10/2026, exportação de 02/10/2026 10:10), marcações de entrega do painel e solicitações sem pedido de compra (Sienge, 01/10/2026).

Nenhum pedido mudou de pendente para entregue nesta semana.

20 pedidos no Sienge · 20 entregues · 0 com item pendente, somando R\$ 0,00 a receber.

Nenhum pedido sem entrega confirmada até 04/10/2026.

Solicitações sem pedido de compra (23) — ≈ R\$ 57.326,81 estimado pelos pedidos do Sienge

Solicitação	Finalidade	Itens ainda sem pedido	Entrega
28210 11/05/2026	FINALIDADE: TAPUME FDE ISOLAMENTO TALUDE solicitado há 146 dias	ADESIVO LOGOTIPO FDE — 3 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28212 11/05/2026	FINALIDADE: MURO DE DIVISA FD-16 solicitado há 146 dias	Areia média — 6 m³ · R\$ 1.460,10 BRITA N°01 — 6 m³ · R\$ 1.050,00 ≈ R\$ 2.510,10 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28213 11/05/2026	FINALIDADE: WC ALUNOS MASC E FEM solicitado há 146 dias	PM-74 COMPLETA — 8 un PM-71 COMPLETA — 2 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra

Solicitação	Finalidade	Itens ainda sem pedido	Entrega
28214 11/05/2026	FINALIDADE: WC ALUNOS MASC E FEM solicitado há 146 dias	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DN= 25MM — 2 br TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DN= 50MM — 2 br Tubo PVC SN 100mm — 1 br · ≈ R\$ 78,85 PAPELEIRA DE LOUÇA BRANCA DE 15X15CM — 7 un · R\$ 131,95 CAIXA SIFONADA PVC DN100X100X50MM COM GRELHA PVC — 2 un · ≈ R\$ 52,72 RALO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM COM GRELHA PVC — 2 un · ≈ R\$ 43,44 BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA COM ASSENTO — 7 un · ≈ R\$ 1.442,35 ≈ R\$ 1.749,31 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28215 11/05/2026	FINALIDADE: WC ALUNOS MASC E FEM solicitado há 146 dias	Areia média — 3 m³ · R\$ 730,05 BRITA N°01 — 3 m³ · R\$ 525,00 ≈ R\$ 1.255,05 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28218 11/05/2026	FINALIDADE: FORRO SALA DE AULA solicitado há 146 dias	MASSA DRYWALL 20 KG — 10 sc · R\$ 511,30 Perfil Canaleta F530 — 227 un · R\$ 2.982,78 PENDURAL F 530 — 500 un · R\$ 610,00 UNIÃO F 530 — 180 un · R\$ 176,40 PARAFUSO PPA 25MM — 500 un · R\$ 10,00 PARAFUSO PFM 13MM — 800 un · R\$ 32,00 CHAPA DRYWALL ST BR 12,5MM 1200 X 1800 — 200 un · R\$ 8.232,00 TIRANTE RÍGIDO - NO. 10 (REB = 1,00 M) — 500 un · R\$ 775,00 FITA PARA JUNTA — 4 rol · R\$ 78,52 TABICA OU CANTONEIRA 25 X 30 X 3.000 — 147 pç · R\$ 2.088,87 ≈ R\$ 15.496,87 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28325 14/05/2026	FINALIDADE: COBERTURA solicitado há 143 dias	PARAFUSO AUTO-PERF C/ CONJ VEDACAO P/ TELHA DE ACO — 1.000 un · R\$ 870,00 ≈ R\$ 870,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28391 15/05/2026	FINALIDADE: MURO DE DIVISA solicitado há 142 dias	CIMALHA (PINGADEIRA) PRÉ MOLDADA — 75 m · R\$ 2.950,50 ≈ R\$ 2.950,50 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28483 19/05/2026	FINALIDADE: QE-02 E QE-03 * DE 2KIT COMPLETO DA BASQUETE* *Tabela em chapa de compensado com colagem fenólica, e=20mm e requadro com perfí l metálico galvanizado U ou L ; Aro com diâmetro interno de 450mm em barra redonda galvanizada de 16mm<Ø<20mm; Rede em malha de nylon presa ao aro em 12 pontos, com- primento entre 400 a 450mm; Suporte em chapa de aço galvanizado, e=3/16 .*	QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL — 1 un · R\$ 1.440,00 QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO — 2 un · R\$ 2.357,00 Treliça Cantoneiras de abas iguais L em aço ASTM A-36: 1 1/2 x1/8 (38x3,2mm) — 1 un · ≈ R\$ 2.125,00 Treliça Cantoneiras de abas iguais L em aço ASTM A-36: 1 1/4 x1/8 (32x3,2mm) — 1 un · ≈ R\$ 2.125,00 Treliça Cantoneiras de abas iguais "L" em aço ASTM A-36 1/2 x3/8 (64x9,5mm) — 2 un · ≈ R\$ 4.250,00 Tabela/Cesto: Tabela em chapa de compensado com colagem fenólica, e=20mm e requadro com perfí l metálico galvanizado U ou L ; Aro com diâmetro interno de 450mm em barra redonda galvanizada de 16mm<Ø<20mm; Rede em malha de nylon presa ao aro em 12 pontos, com- primento entre 400 a 450mm; — 2 un Suporte em chapa de aço galvanizado, e=3/16 — 1 un ≈ R\$ 12.297,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28484 19/05/2026	FINALIDADE: QE-37 solicitado há 138 dias	Aço CA-60 3,40mm — 2 br	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28607 22/05/2026	FINALIDADE: WC ALUNOS LT- 06 solicitado há 135 dias	Torneira de acionamento manual e com ciclo de fechamento automático, com desenho projetado para instalação reforçada e proteção contra o vandalismo, conforme ficha H6.14 — 8 un · R\$ 7.758,80 VÁLVULA DE ESCOAMENTO - Ø=1 — 8 un · ≈ R\$ 274,56 SIFÃO TIPO COPO - Ø=1"X 1 ½" — 8 un · R\$ 934,40 ≈ R\$ 8.967,76 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra

Solicitação	Finalidade	Itens ainda sem pedido	Entrega
28608 22/05/2026	FINALIDADE: WC ALUNOS LT-06 solicitado há 135 dias	Cuba de embutir, oval, de cerâmica esmaltada impermeável, na cor branca — 8 un · R\$ 750,64 ≈ R\$ 750,64 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28609 22/05/2026	FINALIDADE: WC ALUNOS LT-06 solicitado há 135 dias	TAMPO COM FRONTÃO E PRATELEIRA DE GRANITO POLIDO, L=55CM, E=2CM, CINZA ANDORINHA OU CINZA CORUMBÁ, COMP=2,40M — 2 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28610 22/05/2026	FINALIDADE: WC ALUNOS solicitado há 135 dias	Espelho EP-01 — 8 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28623 25/05/2026	FINALIDADE: INCENDIO E RESERVATORIO *TODAS AS BARRAS COM 6M* solicitado há 132 dias	Tubo de aço galvanizado 1 1/4" — 4 br · R\$ 820,00 TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2" — 4 br · R\$ 940,00 TUBO AÇO GALVANIZADO 1" — 1 br · R\$ 158,00 Tubo de aço galvanizado 3" — 18 un ≈ R\$ 1.918,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28624 25/05/2026	FINALIDADE: ESTRUTURAS DE AÇO (FERRAGEM TELHADO) solicitado há 132 dias	CALHA COM ABA 5X8X15 — 195 m SUPORTE U PARA CALHA BEIRAL TIPO 5X8X15 — 195 un BOCAL SAIDA P/CALHA COCHO 100MM GALV. — 8 un PRIMER ANTICORROSIVO (GALV. A FRIJO) 3,6L — 10 gl	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28625 25/05/2026	FINALIDADE: PINTURA solicitado há 132 dias	Tinta piso branco 3,6 l — 2 gl · R\$ 184,00 TINTA PISO AZUL 18L — 2 lt · R\$ 557,44 Tinta piso Amarelo 18L — 2 lt · ≈ R\$ 557,44 SELADOR ACRILICO 3,6L — 4 un MASSA CORRIDA P/PAREDE 18KG — 8 lt TINTA ACRILICA PREMIUM BRANCO NEVE 18L — 8 lt TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE PRETO 3,6L — 2 gl TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE CINZA ESCURO 18L — 1 lt ≈ R\$ 1.298,88 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28771 29/05/2026	FINALIDADE: PINTURA solicitado há 128 dias	Tinta látex Branco 18L — 7 lt · R\$ 2.345,00 Tinta Látex Acrílico Branco 18l — 7 lt · R\$ 2.223,20 Tinta látex Acrílica Marfim 18l — 7 lt · ≈ R\$ 2.485,00 TINTA ACRÍLICA - ÁGUAS RASAS — 7 lt ≈ R\$ 7.053,20 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28772 29/05/2026	FINALIDADE: PINTURA solicitado há 128 dias	SALVA PISO — 4 rol BOBINA DE LONA PRETA 4X20 — 2 un FITA CREPE 10CM LARGURA — 10 un FITA CREPE 20CM LARGURA — 20 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
29486 07/07/2026	FINALIDADE: PROTEÇÃO MATERIAL E TELHADO solicitado há 89 dias	Lona plástica preta — 400 m²	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
29583 13/07/2026	FINALIDADE: FORMA QE-37 solicitado há 83 dias	FORMA DE PAPELAO D=30CM ALT=4,0M — 2 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
30206 05/08/2026	FINALIDADE: FORRO DE DRYWALL - SALAS solicitado há 60 dias	FITA PARA GESSO E DRYWALL 55 MM X 75 MM — 1 un GESSO MULTIUSO 40KG — 1 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
30746 25/08/2026	FINALIDADE: SALA DE LEITURA E CANTINA DO PAVILHÃO 2 solicitado há 40 dias	PLACA DE DRYWALL — 5 un · R\$ 209,50 ≈ R\$ 209,50 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES DA SEMANA

Observações

- ADEQUAÇÕES E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA PREPARAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR PARA AS ELEIÇÕES

Recomendações à contratada

- REGULARIZAÇÃO DAS PENDÊNCIAS 01, 02, 03, 05, 06 E 07 ATÉ O DIA 02/10/2026, CONFORME COMBINADO. APÓS A REGULARIZAÇÃO, ENVIAR FOTOS NO GRUPO PARA REGISTRO

Pendências em aberto

- 1- PROBLEMA NO ENCANAMENTO DO RESERVATÓRIO, OCASIONANDO FALTA DE ÁGUA NA UNIDADE ESCOLAR. ENCANADOR ACIONADO, COM ATENDIMENTO PROGRAMADO PARA AMANHÃ, CONFORME INFORMAÇÃO DO EMPREITEIRO
- 2- EXECUÇÃO DE ACABAMENTOS (INSTALAÇÃO DE SIFÕES E CANTONEIRAS) E LIMPEZA GROSSA NOS BANHEIROS PARA LIBERAÇÃO DA UNIDADE PARA AS ELEIÇÕES
- 3- INSTALAÇÃO DE PORTAS NAS SALAS E LIMPEZA DA OBRA
- 4- VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE GÁS
- 5- ADEQUAÇÃO DA RAMPA DE ACESSO ÀS SALAS DE AULA
- 6- LIMPEZA DA OBRA PARA AS ELEIÇÕES
- 7- AJUSTE E REPOSICIONAMENTO DA LONA EXISTENTE NAS CADEIRAS DA QUADRA

LEONARDO Eng. responsável — contratada	ARAUJO Empreiteiro	RODRIGO Fiscal / FDE
---	-----------------------	-------------------------

RELATÓRIO SEMANAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Consolidado das vistorias NR-18 da semana · Modelo único SST FDE rev01

Semana **40**
28/09/2026 a 02/10/2026
Obra: **229**
1 vistoria(s)

UNIDADE DE ENSINO 229 — ETEC BRAZ PASCHOALIN		MUNICÍPIO JANDIRA / SP	CONTRATO FDE 70/00278/26-001-001
EMPREITEIRO Reinaldo / Simone	CONTRATADA B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL LEONARDO	FISCAL FDE RODRIGO
PRAZO DECORRIDO NO FIM DA SEMANA início 23/04/2026 · término previsto 23/10/2026 · decorridos 162 de 183 dias (89%) · restam 21 dias na sexta-feira			

VISTORIAS DA SEMANA

DATA	RESPONSÁVEL	FASE	CLASSIFICAÇÃO	MÉDIA	CONFORMIDADE	NC
29/09/2026	Reginaldo Eder	Limpeza e Pintura	ÓTIMO	0,970	76%	0

ÓTIMO

situação na última vistoria (29/09/2026) · média ponderada **0,970**
AÇÃO IMEDIATA — item com nota 4 (PÉSSIMO)

ITENS NÃO CONFORMES NA VISTORIA

DATA	ITEM	O QUE FOI VERIFICADO	NR
29/09/2026	23.1	Armazenagem de materiais LATAS DE TINTA COLOCADAS EM LOCAL DE FACIL ACESSO	NR-18.19

NÃO CONFORMIDADES DA SEMANA — REGISTRO FOTOGRÁFICO

Nenhuma não conformidade registrada na semana.

ACOMPANHAMENTO

DATA	EFETIVO	ATIVIDADES	ITENS DE SST OBSERVADOS	PENDÊNCIAS
29/09/2026	1			

Colaboradores lançados na vistoria mais completa da semana: 1.

Reginaldo Eder
Responsável SST

LEONARDO
Engenheiro responsável

Reinaldo / Simone
Empreiteiro

Gerado em 02/10/2026 19:09 · consolidado de 1 vistoria(s) do formulário do painel (229-mur1pcnd). Os relatórios de cada vistoria ficam na aba Segurança.

RELATÓRIO SEMANAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Consolidado das vistorias NR-18 da semana · Modelo único SST FDE rev01

Semana **40**

28/09/2026 a 02/10/2026

Obra: **234**

1 vistoria(s)

UNIDADE DE ENSINO 234 — EE PROF DR EURICO DA SILVA BASTOS		MUNICÍPIO ITAPECERICA DA SERRA / SP	CONTRATO FDE 70/00312/26-001-001
EMPREITEIRO LEONARDO ZANAO	CONTRATADA ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DOUGLAS	FISCAL FDE RENATO
PRAZO DECORRIDO NO FIM DA SEMANA início 29/04/2026 · término previsto 29/11/2026 · decorridos 156 de 214 dias (73%) · restam 58 dias na sexta-feira			

VISTORIAS DA SEMANA

DATA	RESPONSÁVEL	FASE	CLASSIFICAÇÃO	MÉDIA	CONFORMIDADE	NC
02/10/2026	FERNANDO	revestimento do wc	ÓTIMO	0,936	77%	0

ÓTIMO

situação na última vistoria (02/10/2026) · média ponderada **0,936**
AÇÃO IMEDIATA — item com nota 4 (PÉSSIMO)

ITENS NÃO CONFORMES NA VISTORIA

Nenhum item não conforme nas vistorias da semana.

NÃO CONFORMIDADES DA SEMANA — REGISTRO FOTOGRÁFICO

Nenhuma não conformidade registrada na semana.

ACOMPANHAMENTO

DATA	EFETIVO	ATIVIDADES	ITENS DE SST OBSERVADOS	PENDÊNCIAS
02/10/2026	02	REVESTIMENTO DO WC MASCULINO ALUNOS		

Colaboradores lançados na vistoria mais completa da semana: 2.

FERNANDO
Responsável SST

DOUGLAS
Engenheiro responsável

LEONARDO ZANAO
Empreiteiro

Gerado em 02/10/2026 21:01 · consolidado de 1 vistoria(s) do formulário do painel (234-murdnq9t). Os relatórios de cada vistoria ficam na aba Segurança.

RELATÓRIO SEMANAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Consolidado das vistorias NR-18 da semana · Modelo único SST FDE rev01

Semana **40**
28/09/2026 a 02/10/2026
Obra: **251**
1 vistoria(s)

UNIDADE DE ENSINO 251 — EE CAMPESTRE		MUNICÍPIO EMBU GUAÇU / SP	CONTRATO FDE 70/00511/26-001-001
EMPREITEIRO BRUNO	CONTRATADA ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DOUGLAS	FISCAL FDE LUIZ FALCETTA
PRAZO DECORRIDO NO FIM DA SEMANA início 19/05/2026 · término previsto 19/09/2026 · decorridos 136 de 123 dias (111%) · prazo vencido há 13 dias na sexta-feira			

VISTORIAS DA SEMANA

DATA	RESPONSÁVEL	FASE	CLASSIFICAÇÃO	MÉDIA	CONFORMIDADE	NC
02/10/2026	FERNANDO	TELHADO	BOM	1,130	72%	0

BOM

situação na última vistoria (02/10/2026) · média ponderada **1,130**
AÇÃO IMEDIATA — item com nota 4 (PÉSSIMO)

ITENS NÃO CONFORMES NA VISTORIA

DATA	ITEM	O QUE FOI VERIFICADO	NR
02/10/2026	16.1	Escadas NÃO U	NR-18.15
02/10/2026	20.1	Andaimes / plataformas de trabalho ANDAINE NÃO BATE AS PEÇAS	NR-18.18

NÃO CONFORMIDADES DA SEMANA — REGISTRO FOTOGRÁFICO

Nenhuma não conformidade registrada na semana.

ACOMPANHAMENTO

DATA	EFETIVO	ATIVIDADES	ITENS DE SST OBSERVADOS	PENDÊNCIAS
02/10/2026	2	TELHADO	USAR ESCADA ADQUADA	

Colaboradores lançados na vistoria mais completa da semana: 3.

FERNANDO
Responsável SST

DOUGLAS
Engenheiro responsável

BRUNO
Empreiteiro

Gerado em 02/10/2026 21:01 · consolidado de 1 vistoria(s) do formulário do painel (251-mure9z4s). Os relatórios de cada vistoria ficam na aba Segurança.

ATA FDE CONTRATO ATA.FDE 41.268	RELATÓRIO SEMANAL DE ACOMPANHAMENTO Modelo conforme o Livro de Ocorrências da FDE · documento de acompanhamento da contratada	Semana 40
		28/09/2026 a 02/10/2026
		1 visita(s) registrada(s)
OBRA / UNIDADE DE ENSINO EE INSTITUTO IMACULADA		CÓDIGO DO PRÉDIO 116302
LOCAL ITAPECERICA DA SERRA		PI (PORTAL) 2026/01340
ORDEM DE SERVIÇO —		CONTRATO FDE 70/00588/26-001-001
EMPREITEIRO RONALDO BRITTES		ENG. RESPONSÁVEL / FISCAL FDE Douglas / FABIO

RESUMO DA SEMANA

Data	Dia	Efetivo	Tempo	Ritmo	% execução (eng.)
30/09/2026	qua	2	Seco	Lento	—

1 visita(s) entre 28/09/2026 e 02/10/2026 Previsão de término: .

AVANÇO DA OBRA

Indicador	%	Referência
Aprovado pela FDE (medições aprovadas)	58,1%	M001 a M003 aprovadas · M004 em edição fiscal
Execução apontada pelo engenheiro	—	não informado na visita
Fiscal da FDE — último livro de ocorrências	40%	LO nº 12 de 30/09/2026

SERVIÇOS EXECUTADOS NA SEMANA

- Instalação do caixilhos - Remoções caixilhos lado corredor - Pintura laboratório
--

MATERIAIS — SITUAÇÃO DOS PEDIDOS EM 04/10/2026

Situação na data de emissão deste relatório (04/10/2026 às 23:52): pedidos do Sienge (01/01/2026 a 02/10/2026, exportação de 02/10/2026 10:10), marcações de entrega do painel e solicitações sem pedido de compra (Sienge, 01/10/2026).

Nenhum pedido mudou de pendente para entregue nesta semana.

27 pedidos no Sienge · 27 entregues · 0 com item pendente, somando R\$ 0,00 a receber.

Nenhum pedido sem entrega confirmada até 04/10/2026.

Solicitações sem pedido de compra (3) — ≈ R\$ 1.479,53 estimado pelos pedidos do Sienge

Solicitação	Finalidade	Itens ainda sem pedido	Entrega
29323 26/06/2026	FINALIDADE: MATERIAL PARA FORRO EM DRYWALL solicitado há 100 dias	CONECTOR (CLIPES/TRAVAS PARA PERFIL) — 400 un LIXA PARA DRYWALL — 20 fl	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
29325 26/06/2026	FINALIDADE: TAPUME *PONTALETE 6X6 3 M PINUS* solicitado há 100 dias	Broxa retangular — 2 un · R\$ 29,28 BISNAGA CORANTE AZUL ESCURO — 3 un · R\$ 27,24 ADESIVO LOGO DO FDE — 3 un ≈ R\$ 56,52 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra

Solicitação	Finalidade	Itens ainda sem pedido	Entrega
29503 07/07/2026	FINALIDADE: COMPLEMENTO COBERTURA solicitado há 89 dias	Eletrodo 3,25mm — 7 kg · R\$ 206,01 PARAFUSO AUTOBROCANTE 12 X 3/4" — 200 un · ≈ R\$ 270,00 PARAFUSO AUTO-PERF C/ CONJ VEDACAO P/ TELHA DE ACO 1/4X3" — 700 un · R\$ 567,00 DISCO DE CORTE INOX 180X1,6X22MM (7"X1/16"X7/8") — 50 un · R\$ 380,00 ≈ R\$ 1.423,01 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES DA SEMANA

Recomendações à contratada - Finalizar instalação dos caixilhos Pendências em aberto - Quadra, material forro

Douglas Eng. responsável — contratada	RONALDO BRITTES Empreiteiro	FABIO Fiscal / FDE
--	--------------------------------	-----------------------

RELATÓRIO SEMANAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Consolidado das vistorias NR-18 da semana · Modelo único SST FDE rev01

Semana **40**
28/09/2026 a 02/10/2026
Obra: **274**
2 vistoria(s)

UNIDADE DE ENSINO 274 — ETEC EMBU		MUNICÍPIO EMBU DAS ARTES / SP	CONTRATO FDE 70/00445/26-001-001
EMPREITEIRO RAFAEL	CONTRATADA ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DOUGLAS	FISCAL FDE FABIO
PRAZO DECORRIDO NO FIM DA SEMANA início 13/05/2026 · término previsto 13/12/2026 · decorridos 142 de 214 dias (66%) · restam 72 dias na sexta-feira			

VISTORIAS DA SEMANA

DATA	RESPONSÁVEL	FASE	CLASSIFICAÇÃO	MÉDIA	CONFORMIDADE	NC
02/10/2026	FERNANDO	LASBORATORIO	BOM	1,455	64%	0
02/10/2026	FERNANDO	TELHADO	BOM	1,268	68%	0

BOM

situação na última vistoria (02/10/2026) · média ponderada **1,268** · evolução na semana: 1,455 → 1,268 (melhorou)
AÇÃO IMEDIATA — item com nota 4 (PÉSSIMO)

ITENS NÃO CONFORMES NA VISTORIA

Nenhum item não conforme nas vistorias da semana.

NÃO CONFORMIDADES DA SEMANA — REGISTRO FOTOGRÁFICO

Nenhuma não conformidade registrada na semana.

Colaboradores lançados na vistoria mais completa da semana: 2.

FERNANDO
Responsável SST

DOUGLAS
Engenheiro responsável

RAFAEL
Empreiteiro

Gerado em 02/10/2026 19:09 · consolidado de 2 vistoria(s) do formulário do painel (274-mur26vmu, 274-mur3ufsd). Os relatórios de cada vistoria ficam na aba Segurança.

RELATÓRIO SEMANAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Consolidado das vistorias NR-18 da semana · Modelo único SST FDE rev01

Semana **40**

28/09/2026 a 02/10/2026

Obra: **283**

1 vistoria(s)

UNIDADE DE ENSINO 283 — PARQUE PAYOL		MUNICÍPIO PIRAPORA DO BOM JESUS / SP	CONTRATO FDE 05/00177/26-001-001
EMPREITEIRO ARAUJO	CONTRATADA B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL LEONARDO	FISCAL FDE VINICIUS
PRAZO DECORRIDO NO FIM DA SEMANA início 02/07/2026 · término previsto 02/10/2026 · decorridos 92 de 92 dias (100%) · restam 0 dias na sexta-feira			

VISTORIAS DA SEMANA

DATA	RESPONSÁVEL	FASE	CLASSIFICAÇÃO	MÉDIA	CONFORMIDADE	NC
28/09/2026	Reginaldo Eder	ADEQUAÇÃO DA COZINHA E DISPENSA	ÓTIMO	0,824	79%	1

ÓTIMO

situação na última vistoria (28/09/2026) · média ponderada **0,824**
AÇÃO IMEDIATA — item com nota 4 (PÉSSIMO)

ITENS NÃO CONFORMES NA VISTORIA

Nenhum item não conforme nas vistorias da semana.

NÃO CONFORMIDADES DA SEMANA — REGISTRO FOTOGRÁFICO



28/09/2026 · Pedaços de infra estrutura metálica deixados em cima do muro de contenção.

Item	23.2 — Ordem e limpeza — resíduos, embalagens e circulações desobstruídas
Local	muro próximo a entrada da secretária
Classificação	BAIXO
Ação corretiva	recolher tudo com atenção e depositar em local de descarte
Prazo	30/09/2026
Responsável	Araujo
Status	Concluída

ACOMPANHAMENTO

DATA	EFETIVO	ATIVIDADES	ITENS DE SST OBSERVADOS	PENDÊNCIAS
28/09/2026	3	Assentamento dos blocos da parede	Organização interna, ou seja dentro da área isolada.	

Colaboradores lançados na vistoria mais completa da semana: 1.

Reginaldo Eder
Responsável SST

LEONARDO
Engenheiro responsável

ARAUJO
Empreiteiro

Gerado em 02/10/2026 19:09 · consolidado de 1 vistoria(s) do formulário do painel (283-mur9klge). Os relatórios de cada vistoria ficam na aba Segurança.

RELATÓRIO SEMANAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Consolidado das vistorias NR-18 da semana · Modelo único SST FDE rev01

Semana **40**

28/09/2026 a 02/10/2026

Obra: **284**

1 vistoria(s)

UNIDADE DE ENSINO 284 — EE PROFA IGNES AMELIA OLIVEIRA MACHADO		MUNICÍPIO ITAPEVI / SP	CONTRATO FDE 70/00639/26-001-001
EMPREITEIRO ANTONIO CABELO	CONTRATADA B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL LEONARDO	FISCAL FDE VINICIUS
PRAZO DECORRIDO NO FIM DA SEMANA início 26/06/2026 · término previsto 26/09/2026 · decorridos 98 de 92 dias (107%) · prazo vencido há 6 dias na sexta-feira			

VISTORIAS DA SEMANA

DATA	RESPONSÁVEL	FASE	CLASSIFICAÇÃO	MÉDIA	CONFORMIDADE	NC
29/09/2026	Reginaldo Eder	Limpeza e organização pré eleição	ÓTIMO	0,750	81%	0

ÓTIMO

situação na última vistoria (29/09/2026) · média ponderada **0,750**
MANTER O PADRÃO

ITENS NÃO CONFORMES NA VISTORIA

Nenhum item não conforme nas vistorias da semana.

NÃO CONFORMIDADES DA SEMANA — REGISTRO FOTOGRÁFICO

Nenhuma não conformidade registrada na semana.

ACOMPANHAMENTO

DATA	EFETIVO	ATIVIDADES	ITENS DE SST OBSERVADOS	PENDÊNCIAS
29/09/2026	0			

Reginaldo Eder
Responsável SST

LEONARDO
Engenheiro responsável

ANTONIO CABELO
Empreiteiro

Gerado em 02/10/2026 22:37 · consolidado de 1 vistoria(s) do formulário do painel (284-murhnnq3). Os relatórios de cada vistoria ficam na aba Segurança.

RELATÓRIO SEMANAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Consolidado das vistorias NR-18 da semana · Modelo único SST FDE rev01

Semana **40**

28/09/2026 a 02/10/2026

Obra: **285**

1 vistoria(s)

UNIDADE DE ENSINO 285 — CANDIDO RONDON MARECHAL		MUNICÍPIO ITAPEVI / SP	CONTRATO FDE 05/00458/26-001-001
EMPREITEIRO LEONIZIO	CONTRATADA B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL LEONARDO	FISCAL FDE VINICIUS
PRAZO DECORRIDO NO FIM DA SEMANA início 03/07/2026 · término previsto 03/09/2026 · decorridos 91 de 62 dias (147%) · prazo vencido há 29 dias na sexta-feira			

VISTORIAS DA SEMANA

DATA	RESPONSÁVEL	FASE	CLASSIFICAÇÃO	MÉDIA	CONFORMIDADE	NC
29/09/2026	REGINALDO EDER	REDE DE ESGOTO	ÓTIMO	0,818	80%	1

ÓTIMO

situação na última vistoria (29/09/2026) · média ponderada **0,818**
MANTER O PADRÃO

ITENS NÃO CONFORMES NA VISTORIA

Nenhum item não conforme nas vistorias da semana.

NÃO CONFORMIDADES DA SEMANA — REGISTRO FOTOGRÁFICO



29/09/2026 · RAMPA COM PISO ESCORREGADIO

Item	20.2 — Piso completo, travado e dimensionado
Local	RAMPA DE ACESSO AO PÁTIO
Classificação	MÉDIO
Ação corretiva	COLOCAÇÃO DE FITA ABRASIVA
Prazo	05/10/2026
Responsável	Leonizio
Status	Aberta

REGINALDO EDER
Responsável SST

LEONARDO
Engenheiro responsável

LEONIZIO
Empreiteiro

Gerado em 02/10/2026 19:09 · consolidado de 1 vistoria(s) do formulário do painel (285-mur0bp8b). Os relatórios de cada vistoria ficam na aba Segurança.

RELATÓRIO SEMANAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Consolidado das vistorias NR-18 da semana · Modelo único SST FDE rev01

Semana **40**
28/09/2026 a 02/10/2026
Obra: **287**
1 vistoria(s)

UNIDADE DE ENSINO 287 — EEPROF LAERT ALMEIDA SÃO BERNARDO		MUNICÍPIO TABOÃO DA SERRA / SP	CONTRATO FDE 05/00008/26-001-001
EMPREITEIRO PEDRO	CONTRATADA ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL LUIZ	FISCAL FDE FABIO
PRAZO DECORRIDO NO FIM DA SEMANA início 03/07/2026 · término previsto 03/03/2027 · decorridos 91 de 243 dias (37%) · restam 152 dias na sexta-feira			

VISTORIAS DA SEMANA

DATA	RESPONSÁVEL	FASE	CLASSIFICAÇÃO	MÉDIA	CONFORMIDADE	NC
01/10/2026	FERNANDO	DEMOLIÇÃO	BOM	1,122	72%	4

BOM situação na última vistoria (01/10/2026) · média ponderada **1,122**
AÇÃO IMEDIATA — item com nota 4 (PÉSSIMO)

ITENS NÃO CONFORMES NA VISTORIA

Nenhum item não conforme nas vistorias da semana.

NÃO CONFORMIDADES DA SEMANA — REGISTRO FOTOGRÁFICO

01/10/2026 · FEITO NA SALA DO ELEVADOR

Item	7.2 — Vestiário para troca de roupa dos colaboradores
Local	—
Classificação	MÉDIO
Ação corretiva	—
Prazo	10/10/2026
Responsável	PEDRO
Status	Aberta



01/10/2026 · PRECISA SEGUIR AS NORMAS CONFORME NR 18, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE OBRAS E LIMPEZA

Item	7.4 — Refeitório
Local	—
Classificação	BAIXO
Ação corretiva	—
Prazo	10/10/2026
Responsável	PEDRO
Status	Aberta

01/10/2026 · USO DE COPO COLETIVO

Item	7.5.2 — Uso de copo coletivo (Sim = não conformidade)
Local	MURO
Classificação	CRÍTICO
Ação corretiva	—
Prazo	02/10/2026
Responsável	PEDRO
Status	Em andamento



01/10/2026 · PRECISA SEGUIR AS ORIENTAÇÕES CONFOME O ENGENHEIRO PEDE

Item	9.1 — Demolições
Local	—
Classificação	MÉDIO
Ação corretiva	IMEDIATO
Prazo	10/10/2026
Responsável	PEDRO
Status	Em andamento

ACOMPANHAMENTO

DATA	EFETIVO	ATIVIDADES	ITENS DE SST OBSERVADOS	PENDÊNCIAS
01/10/2026	02	DEMOLIÇÃO DO MURO	N/A	N/A

Colaboradores lançados na vistoria mais completa da semana: 3.

FERNANDO
Responsável SST

LUIZ
Engenheiro responsável

PEDRO
Empreiteiro
