

ATA FDE CONTRATO ATA.FDE 41.234	RELATÓRIO SEMANAL DE ACOMPANHAMENTO Modelo conforme o Livro de Ocorrências da FDE · documento de acompanhamento da contratada	Semana 41
		05/10/2026 a 09/10/2026
		1 visita(s) registrada(s)
OBRA / UNIDADE DE ENSINO EE EE PROF DR EURICO DA SILVA BASTOS		CÓDIGO DO PRÉDIO 116221
LOCAL ITAPECERICA DA SERRA		PI (PORTAL) 2026/00778
ORDEM DE SERVIÇO —		CONTRATO FDE 70/00312/26-001-001
EMPREITEIRO LEONARDO ZANAO		ENG. RESPONSÁVEL / FISCAL FDE Douglas / RENATO

RESUMO DA SEMANA

Data	Dia	Efetivo	Tempo	Ritmo	% execução (eng.)
05/10/2026	seg	1	Seco	Lento	50%

1 visita(s) entre 05/10/2026 e 09/10/2026 Execução: **50%**. Previsão de término: .

AVANÇO DA OBRA

Indicador	%	Referência
Aprovado pela FDE (medições aprovadas)	62%	M001 a M004 aprovadas · M005 em análise scm
Execução apontada pelo engenheiro	50%	visita de 09/10/2026
Fiscal da FDE — último livro de ocorrências	43%	LO nº 11 de 10/09/2026

SERVIÇOS EXECUTADOS NA SEMANA

Instalando pingadeira de concreto

MATERIAIS — SITUAÇÃO DOS PEDIDOS EM 05/10/2026

Situação na data de emissão deste relatório (05/10/2026 às 15:58): pedidos do Sienge (01/01/2026 a 02/10/2026, exportação de 02/10/2026 13:10), marcações de entrega do painel e solicitações sem pedido de compra (Sienge, 01/10/2026).

Nenhum pedido mudou de pendente para entregue nesta semana.

57 pedidos no Sienge · 57 entregues · 0 com item pendente, somando **R\$ 0,00** a receber.

Nenhum pedido sem entrega confirmada até 05/10/2026.

Solicitações sem pedido de compra (17) — ≈ R\$ 28.271,31 estimado pelos pedidos do Sienge

Solicitação	Finalidade	Itens ainda sem pedido	Entrega
27966 28/04/2026	FINALIDADE: MURO DIVISA *IMAGEM EM ANEXO* solicitado há 160 dias	VIGA BALDRAME CORTE E DOBRA — 50 m · R\$ 3.200,00 ≈ R\$ 3.200,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
27967 28/04/2026	FINALIDADE: MURO DIVISA *IMAGEM EM ANEXO* solicitado há 160 dias	PILAR CORTE E DOBRA COMP=2,40M — 25 un · R\$ 1.721,50 ≈ R\$ 1.721,50 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
27968 28/04/2026	FINALIDADE: MURO DE DIVISA *IMAGEM EM ANEXO* solicitado há 160 dias	BROCA CORTE E DOBRA COMP = 2,50M — 25 un · R\$ 4.791,25 ≈ R\$ 4.791,25 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra

Solicitação	Finalidade	Itens ainda sem pedido	Entrega
27969 28/04/2026	FINALIDADE: MURO DE DIVISA FD-16 solicitado há 160 dias	Areia média — 6 m³ · R\$ 1.460,10 BLOCO CONCRETO CANALETA 14X19X39CM — 20 un · R\$ 105,40 BRITA N°01 — 6 m³ · R\$ 1.050,00 ≈ R\$ 2.615,50 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28516 21/05/2026	FINALIDADE: GRANITO COZINHA solicitado há 137 dias	BA-10 GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM COMP=2,00M — 1 un Placa de granito (40x30cm, e=2cm), cinza andorinha COM FURO CENTRAL — 2 un CC-04 GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM 1,65M X 0,65M — 1 un BS-05 GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM COMP= 0,55M — 1 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28519 21/05/2026	FINALIDADE: ARMADURA QE-37 solicitado há 137 dias	AÇO CA-50 8,00MM — 9 br · R\$ 280,80 AÇO CA-50 6,30MM — 6 br · R\$ 224,34 AÇO CA-50 12,50MM — 14 br · R\$ 971,74 AÇO 3,4MM — 2 br · R\$ 21,00 ≈ R\$ 1.497,88 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28540 22/05/2026	FINALIDADE: COZINHA solicitado há 136 dias	CUBA DUPLA ACO INOX 304 CH22 1020X400X250MM — 1 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28544 22/05/2026	FINALIDADE: MURO DE DIVISA ETAPA 02 - AGUARDAR LIBERAÇÃO *IMAGEM EM ANEXO* solicitado há 136 dias	BROCA CORTE E DOBRA COMP = 2,50M — 25 un · R\$ 4.791,25 ≈ R\$ 4.791,25 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28545 22/05/2026	FINALIDADE: MURO DE DIVISA ETAPA 02 - AGUARDAR LIBERAÇÃO *IMAGEM EM ANEXO* solicitado há 136 dias	PILAR CORTE E DOBRA COMP=2,40M — 25 un · R\$ 1.721,50 ≈ R\$ 1.721,50 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28546 22/05/2026	FINALIDADE: MURO DIVISA ETAPA 02 - AGUARDAR LIBERAÇÃO *IMAGEM EM ANEXO* solicitado há 136 dias	VIGA BALDRAME CORTE E DOBRA — 50 m · R\$ 3.200,00 ≈ R\$ 3.200,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28556 22/05/2026	FINALIDADE: LINHAS DEMARCATÓRIAS DA QUADRA DE ESPORTES solicitado há 136 dias	FITA CREPE 18MM X 50M — 10 un · R\$ 150,00 PINCEL MÉDIO — 2 un · R\$ 15,50 Linha de pedreiro — 2 un · R\$ 16,74 Pincel pequeno — 2 un · R\$ 9,80 FITA CREPE GROSSA 48MM X 50M — 10 un · R\$ 105,20 TINTA CORAL PINTA PISO (LÁTEX) CONF. S14.07 BRANCO 3,6L — 2 gl · R\$ 178,00 TINTA CORAL PINTA PISO (LÁTEX) CONF. S14.07 VERDE 3,6L — 2 gl · R\$ 178,00 TINTA CORAL PINTA PISO (LÁTEX) CONF. S14.07 AMARELO 3,6L — 2 gl · R\$ 178,00 TINTA CORAL PINTA PISO (LÁTEX) CONF. S14.07 VERMELHO 3,6L — 1 gl · R\$ 89,00 SELADOR ACRÍLICO CORAL CONF. S14.20 — 1 lt · R\$ 175,00 ≈ R\$ 1.119,24 estimado ... e mais 1 itens	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28557 22/05/2026	FINALIDADE: PINTURA INTERNA solicitado há 136 dias	Tinta piso vermelho 18l — 1 lt · R\$ 458,55 TINTA PISO VERDE QUADRA — 1 lt · R\$ 278,72 TINTA PISO AZUL 18L — 1 lt · R\$ 278,72 ≈ R\$ 1.015,99 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28558 22/05/2026	FINALIDADE: WC solicitado há 136 dias	Espelho EP-01 — 6 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra

Solicitação	Finalidade	Itens ainda sem pedido	Entrega
29202 22/06/2026	FINALIDADE: MURO DE DIVISA *PILAR CORTE E DOBRA ARMADO* solicitado há 105 dias	PILAR CORTE E DOBRA COMP=2,40M — 20 un · R\$ 1.377,20 ≈ R\$ 1.377,20 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
30324 10/08/2026	FINALIDADE: REFORMA COZINHA solicitado há 56 dias	Fechadura tipo livre / ocupado — 4 un · R\$ 200,00 Dobradiça — 6 jg · R\$ 60,00 FECHADURA ROSETA EXTERNA — 2 un ≈ R\$ 260,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
30349 10/08/2026	FINALIDADE: LIMPEZA DA OBRA solicitado há 56 dias	TROCA DE CAÇAMBA — 2 un · R\$ 960,00 ≈ R\$ 960,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
30590 19/08/2026	FINALIDADE: REMOÇÃO solicitado há 47 dias	REMOÇÃO CONTAINER — 1 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES DA SEMANA	
Observações • Itens a serem regularizar • Válvula HYDRA (nao conectado tubo de descida) • Azulejos trincado • Rejunte com falhas • Falta pintura tetos sanitado • Vazamento telhado • Falta instalar rufo Recomendações à contratada • Aumentar efetivo, e finalizar sant masculino	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DA SEMANA



Registro da visita

05/10/2026



Registro da visita

05/10/2026



Registro da visita

05/10/2026



Registro da visita

05/10/2026




Registro da visita

05/10/2026



Registro da visita

05/10/2026

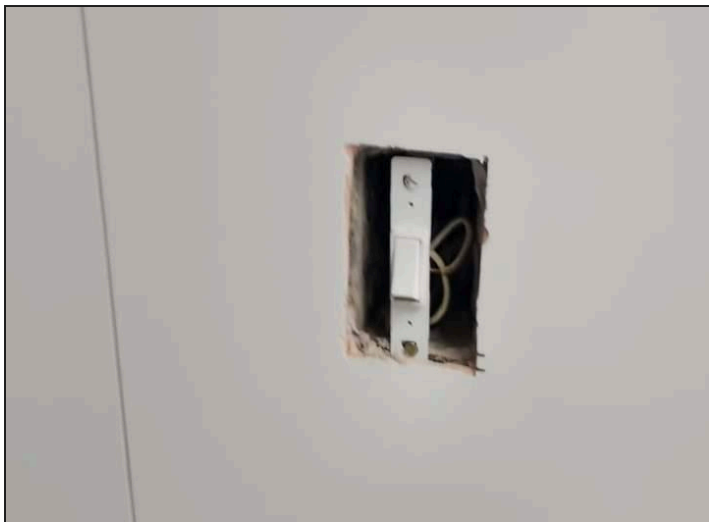

Registro da visita

05/10/2026




Registro da visita

05/10/2026



Registro da visita

05/10/2026

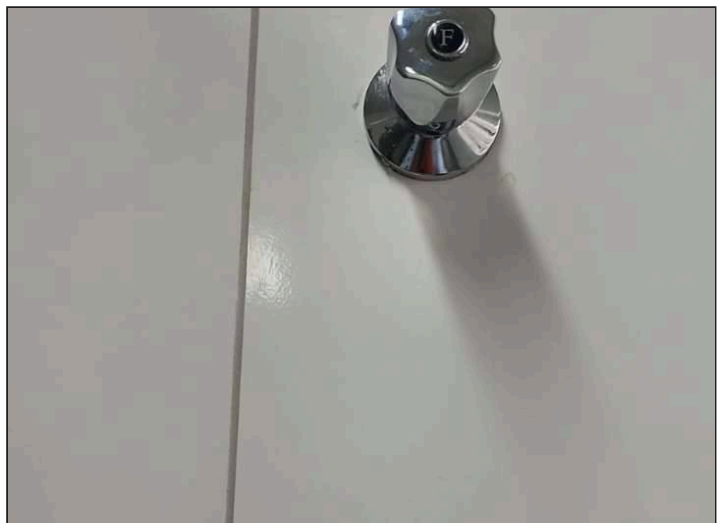


Registro da visita

05/10/2026



05/10/2026

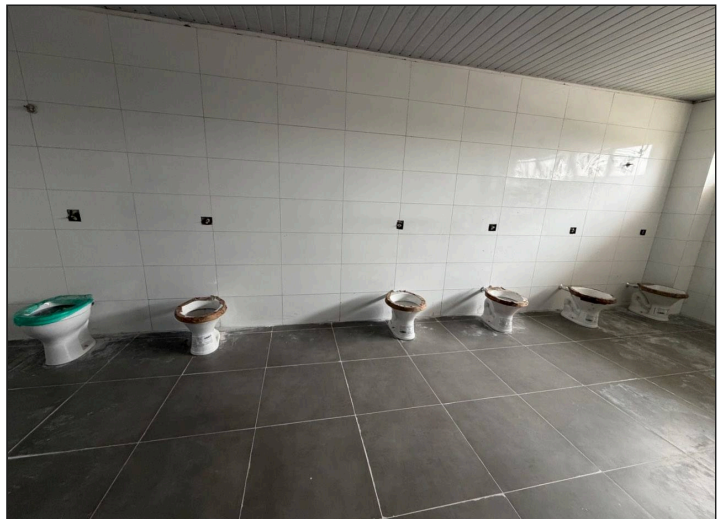

05/10/2026



05/10/2026



05/10/2026



05/10/2026



05/10/2026



05/10/2026



05/10/2026



05/10/2026



05/10/2026



05/10/2026



05/10/2026



05/10/2026



05/10/2026

Douglas
Eng. responsável — contratada

LEONARDO ZANAO
Empreiteiro

RENATO
Fiscal / FDE
