

ATA FDE CONTRATO ATA.FDE 42.283	RELATÓRIO SEMANAL DE ACOMPANHAMENTO Modelo conforme o Livro de Ocorrências da FDE · documento de acompanhamento da contratada	Semana 41
		05/10/2026 a 09/10/2026
		1 visita(s) registrada(s)
OBRA / UNIDADE DE ENSINO PARQUE PAYOL	CÓDIGO DO PRÉDIO 125103	
LOCAL PIRAPORA DO BOM JESUS	PI (PORTAL) 2025/04440	
ORDEM DE SERVIÇO —	CONTRATO FDE 05/00177/26-001-001	
EMPREITEIRO ARAUJO	ENG. RESPONSÁVEL / FISCAL FDE LEONARDO / VINICIUS	

RESUMO DA SEMANA

Data	Dia	Efetivo	Tempo	Ritmo	% execução (eng.)
05/10/2026	seg	5	Seco	Normal	77%

1 visita(s) entre 05/10/2026 e 09/10/2026 Execução: 77%. Previsão de término: .

AVANÇO DA OBRA

Indicador	%	Referência
Aprovado pela FDE (medições aprovadas)	1,8%	M001 aprovada · M002 em análise scm
Execução apontada pelo engenheiro	77%	visita de 09/10/2026
Fiscal da FDE — último livro de ocorrências	50%	LO nº 6 de 24/09/2026

SERVIÇOS EXECUTADOS NA SEMANA

- Execução de requadro para chumbamento e posterior instalação de balcão - Execução do chumbamento de janelas metálicas (ferro), incluindo fixação e alinhamento dos caixilhos
--

MATERIAIS — SITUAÇÃO DOS PEDIDOS EM 05/10/2026

Situação na data de emissão deste relatório (05/10/2026 às 15:58): pedidos do Sienge (01/01/2026 a 02/10/2026, exportação de 02/10/2026 13:10), marcações de entrega do painel e solicitações sem pedido de compra (Sienge, 01/10/2026).

Nenhum pedido mudou de pendente para entregue nesta semana.

6 pedidos no Sienge · 5 entregues · 1 com item pendente, somando R\$ 14.665,93 a receber.

1 pedido(s) sem entrega confirmada até 05/10/2026 — todos listados abaixo, do mais antigo para o mais novo.

Pedido	Fornecedor	Itens	Valor	Entrega
56008 04/09/2026	PERACINI & CIA LTDA pedido há 31 dias	44086 - PRATELEIRA DE GRANILITE DE (5,30 X 0,75 M) — 6 un 44091 - PRATELEIRA DE GRANILITE DE (1,40 X 0,60 M) — 3 un 44088 - PRATELEIRA DE GRANILITE DE (1,80 X 0,75 M) — 3 un 44087 - PRATELEIRA DE GRANILITE DE (5,00 X 0,75 M) — 2 un 44089 - PRATELEIRA DE GRANILITE DE (1,45 X 0,75 M) — 1 un 44084 - SUPORTE METÁLICO (55 X 35 CM) EM PERFIL "L" (38 X 38 X 3,2 MM) — 62 un 44092 - PRATELEIRA DE GRANILITE DE (1,20 X 0,60 M) — 1 un 44090 - SUPORTE METÁLICO (45 X 20 CM) EM PERFIL TREFILADO "T" (1 ¼" X 1 ¼" X 1/8") — 7 un	R\$ 14.665,60	PENDENTE marcado por Eng. Leonardo · 05/10/2026 11:11

Solicitações sem pedido de compra (5) — ≈ R\$ 807,66 estimado pelos pedidos do Sienge

Solicitação	Finalidade	Itens ainda sem pedido	Entrega
30356 11/08/2026	FINALIDADE: EXECUÇÃO E ADEQUAÇÃO DA COZINHA. *MEDIR IN LOCO ANTES DA FABRICAÇÃO/EXECUÇÃO.* solicitado há 55 dias	BS-05 BANCADA PARA COZINHA GRANITO POLIDO 20 MM 12,80 M — 1 un ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO 13,70 M — 1 un BA-10 BALCÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE GRANITO L = 350 CM — 1 un BA-11 BALCÃO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO L = 70 CM — 1 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
30357 11/08/2026	FINALIDADE: EXECUÇÃO E ADEQUAÇÃO DA COZINHA. *MEDIR IN LOCO ANTES DA FABRICAÇÃO/EXECUÇÃO.* solicitado há 55 dias	PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE L = 55 CM — 1 m PR-10 PRATELEIRA EM GRANILITE L = 70 CM — 12,70 m	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
30813 27/08/2026	FINALIDADE: COZINHA *IMAGENS EM ANEXO* solicitado há 39 dias	CHUMBADOR METÁLICO, TIPO "BOLT", Ø = 1/4" X 3" — 186 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
30814 27/08/2026	FINALIDADE: COZINHA *IMAGEM EM ANEXO* solicitado há 39 dias	Parafuso e bucha S8 Philips — 28 un · R\$ 8,96 ≈ R\$ 8,96 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
31450 24/09/2026	FINALIDADE: COZINHA solicitado há 11 dias	EX-01 Exaustor axial DN= 40cm — 1 un · R\$ 373,59 FT-02 Filtro para água — 3 un · R\$ 301,29 TORNEIRA ELETRICA - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465 — 1 un TORNEIRA DE USO RESTRITO DE 3/4" — 1 un · ≈ R\$ 123,82 ≈ R\$ 798,70 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES DA SEMANA

Recomendações à contratada

- Envio de fotos no grupo da obra, registrando as pendências identificadas e a evolução dos serviços executados

Pendências em aberto

- 01 - Retirada do balcão, com posterior requadro da alvenaria, deixando 5 cm de espaço para a instalação da pedra inferior do balcão e do passa-prato
- 02 - Instalação das janelas metálicas (ferro), com posicionamento, alinhamento e fixação dos caixilhos
- 03 - Assentamento de revestimento cerâmico (azulejos) e porcelanato, incluindo preparação e nivelamento das superfícies

REGISTRO FOTOGRÁFICO DA SEMANA



05/10/2026



05/10/2026



05/10/2026



05/10/2026




05/10/2026



05/10/2026



05/10/2026

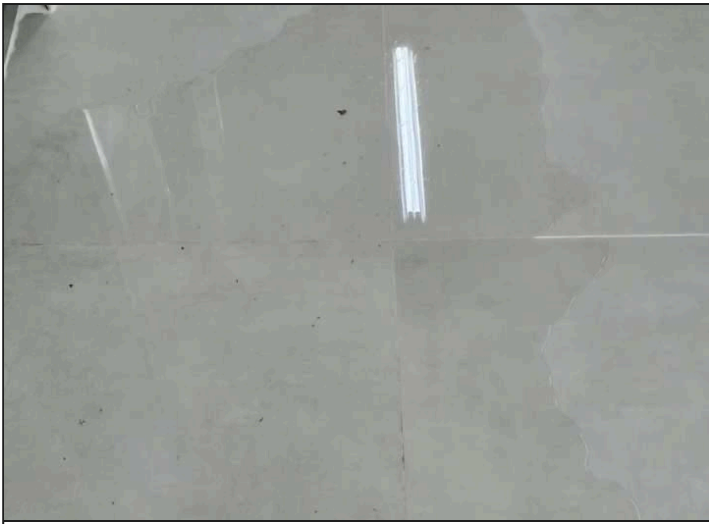

05/10/2026




05/10/2026



05/10/2026



05/10/2026

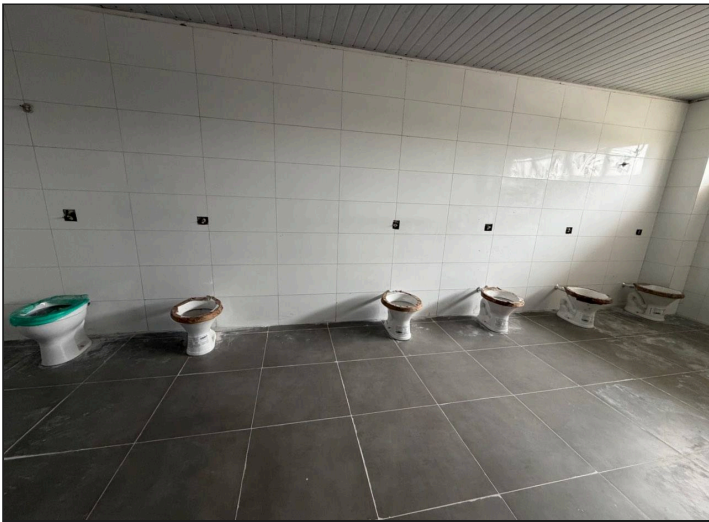

05/10/2026



05/10/2026



05/10/2026



05/10/2026



05/10/2026



05/10/2026



05/10/2026



05/10/2026



05/10/2026



05/10/2026



05/10/2026



05/10/2026



05/10/2026

LEONARDO Eng. responsável — contratada	ARAUJO Empreiteiro	VINICIUS Fiscal / FDE
---	-----------------------	--------------------------
