

ATA FDE CONTRATO ATA.FDE 41.286	RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA Modelo conforme o Livro de Ocorrências da FDE · documento de acompanhamento da contratada	Nº 1
		Data: 05/10/2026
		Visita: 14:21
		Preenchido por: Eng. Douglas
OBRA / UNIDADE DE ENSINO EE MARIA CATHARINA COMINO		CÓDIGO DO PRÉDIO 136112
LOCAL TABOÃO DA SERRA		PI (PORTAL) 2026/01150
ORDEM DE SERVIÇO —		CONTRATO FDE 05/00188/26-001-001
EMPREITEIRO LUCAS EMPREITEIRO		ENG. RESPONSÁVEL / FISCAL FDE Douglas / FABIO

ITENS VERIFICADOS NA VISITA

1. Mão-de-obra / Número de funcionários Qtd. (0)	☐ Suficiente ☒ Insuficiente
2. Material em canteiro	☒ Suficiente ☐ Insuficiente
3. Equipamentos	☒ Suficiente ☐ Insuficiente
4. Tempo	☒ Seco ☐ Chuva
5. Falhas construtivas a serem corrigidas	☐ Sim ☒ Não
6. Placa de obra instalada	☐ Sim ☐ Não ☒ N/A
7. Andamento dos serviços (25) % atual aprovado 13% · fiscal FDE 23% (LO 30/09/2026)	☐ Não iniciada ☒ Em execução ☐ Obra paralisada ☐ Obra concluída ☐ Em rescisão
8. Ritmo da obra	☐ Normal ☐ Lento ☒ Parado
9. Organização e limpeza da obra	☐ Boa ☐ Regular ☒ Ruim
10. Previsão de término	—

AVANÇO DA OBRA

Indicador	%	Referência
Aprovado pela FDE (medições aprovadas)	13%	M001 a M002 aprovadas · M003 em edição fiscal
Execução apontada pelo engenheiro	25%	visita de 05/10/2026
Fiscal da FDE — último livro de ocorrências	23%	LO nº 9 de 30/09/2026

SERVIÇOS EXECUTADOS

- Pintura estrutura quadra
- Pintura interna
- Elétrica

MATERIAIS — PEDIDOS SEM ENTREGA ATÉ 05/10/2026

17 pedidos no Sienge · 17 entregues · 0 com item pendente, somando R\$ 0,00 a receber.

Nenhum pedido sem entrega confirmada até 05/10/2026.

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES

Observações

- Sala dos professores, luminaria sem funcionar
- Sala coordenadora 1pav, pintura sem realizar
- Cobertura parada
- Piso pátio sem finalizar a mais de 40 dias

Recomendações à contratada

- Aumentar efetivo, finalizar adequação hidráulica incêndio, e finalizar piso pátio

Pendências em aberto


- Tampa de concreto canaleta

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Registro da visita

05/10/2026

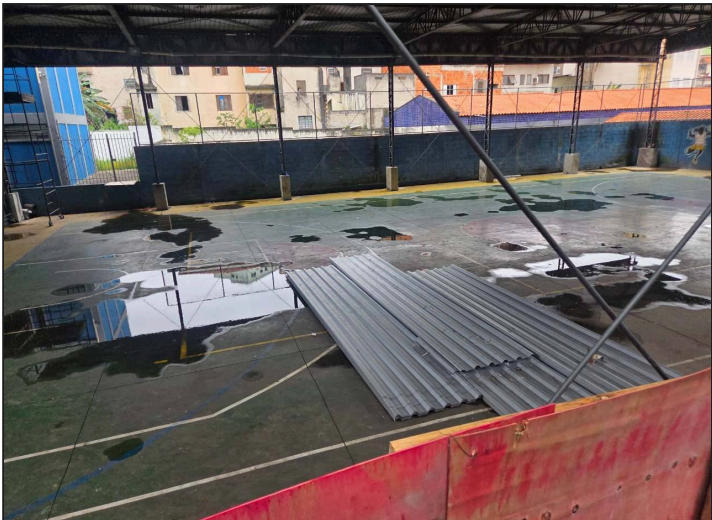

Registro da visita

05/10/2026

Douglas Eng. responsável — contratada	LUCAS EMPREITEIRO Empreiteiro	FABIO Fiscal / FDE
---	---	--
