

ATA FDE CONTRATO ATA.FDE 41.288	RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA Modelo conforme o Livro de Ocorrências da FDE · documento de acompanhamento da contratada	Nº 1
		Data: 05/10/2026
		Visita: 11:47
		Preenchido por: Eng. Luis Júnior
OBRA / UNIDADE DE ENSINO EE EDUARDO VAZ		CÓDIGO DO PRÉDIO 109111
LOCAL EMBU DAS ARTES		PI (PORTAL) 2025/04667
ORDEM DE SERVIÇO —		CONTRATO FDE 05/00007/26-001-001
EMPREITEIRO ANTONIO CABELO		ENG. RESPONSÁVEL / FISCAL FDE Douglas / FABIO

ITENS VERIFICADOS NA VISITA

1. Mão-de-obra / Número de funcionários Qtd. (1)	☐ Suficiente ☒ Insuficiente
2. Material em canteiro	☒ Suficiente ☐ Insuficiente
3. Equipamentos	☐ Suficiente ☒ Insuficiente
4. Tempo	☒ Seco ☐ Chuva
5. Falhas construtivas a serem corrigidas	☒ Sim ☐ Não
6. Placa de obra instalada	☐ Sim ☐ Não ☒ N/A
7. Andamento dos serviços (25) % atual aprovado 9% · fiscal FDE 20% (LO 29/09/2026)	☐ Não iniciada ☒ Em execução ☐ Obra paralisada ☐ Obra concluída ☐ Em rescisão
8. Ritmo da obra	☐ Normal ☒ Lento ☐ Parado
9. Organização e limpeza da obra	☐ Boa ☐ Regular ☒ Ruim
10. Previsão de término	—

AVANÇO DA OBRA

Indicador	%	Referência
Aprovado pela FDE (medições aprovadas)	9%	M001 a M002 aprovadas · M003 em edição fiscal
Execução apontada pelo engenheiro	25%	visita de 05/10/2026
Fiscal da FDE — último livro de ocorrências	20%	LO nº 9 de 29/09/2026

SERVIÇOS EXECUTADOS

- Execução da limpeza da obra
- Remoção de telhas e madeiramento

MATERIAIS — PEDIDOS SEM ENTREGA ATÉ 05/10/2026

14 pedidos no Sienge · 14 entregues · 0 com item pendente, somando R\$ 0,00 a receber.

Nenhum pedido sem entrega confirmada até 05/10/2026.

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES

Recomendações à contratada

- Agilizar a limpeza da obra e melhorar isolamento dos materiais e locais de trabalho

Pendências em aberto

- Isolamento material

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Falta limpeza e remoção do material

05/10/2026



Falta limpeza e remoção do material

05/10/2026




Falta limpeza e remoção do material

05/10/2026



Falta limpeza e remoção do material

05/10/2026

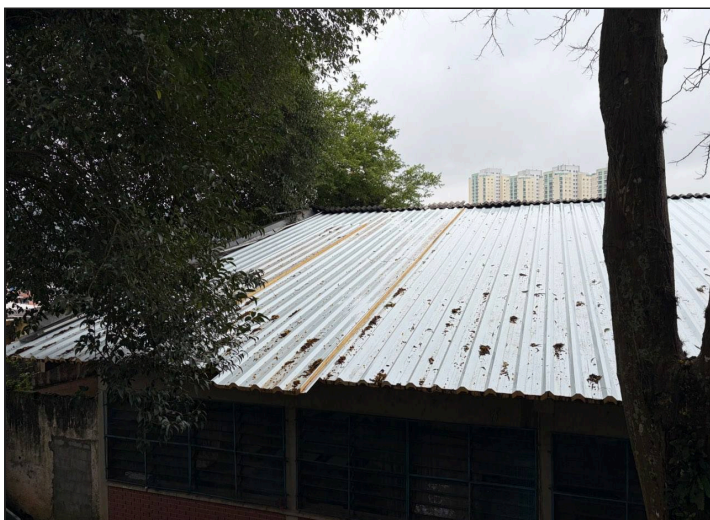

Telha em cima podendo voar

05/10/2026



Falta limpeza e remoção do material

05/10/2026



Falta limpeza e remoção do material

05/10/2026



Falta limpeza e remoção do material

05/10/2026



Falta limpeza e remoção do material

05/10/2026




Falta isolamento do material

05/10/2026




Falta isolamento do material

05/10/2026

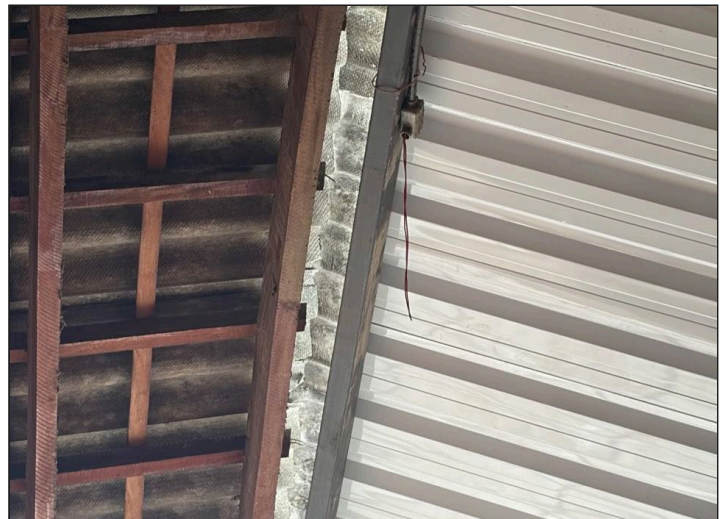


Tubulação e cabos pendurados

05/10/2026

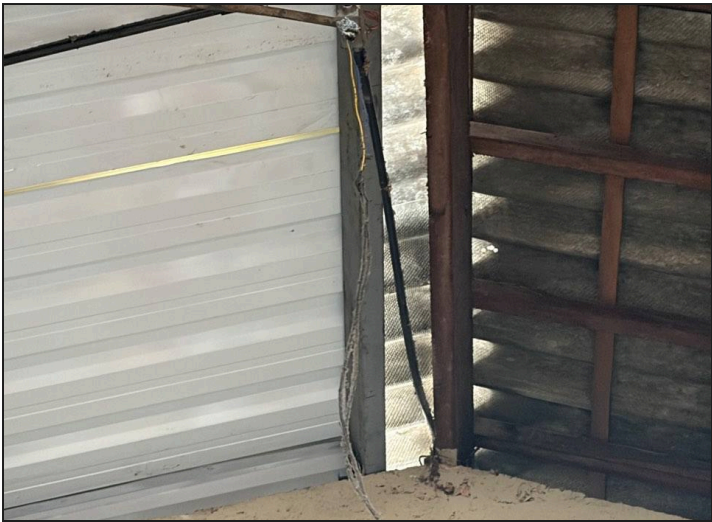


Vão entre telhas instaladas

05/10/2026

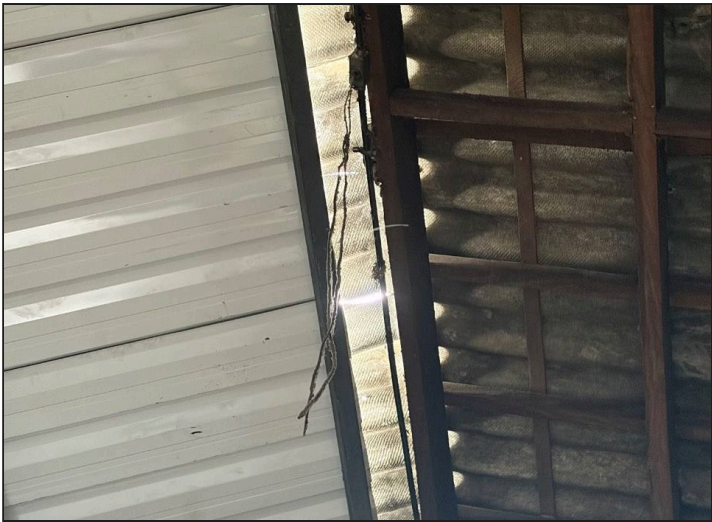

Tubulação e fios penduras

05/10/2026

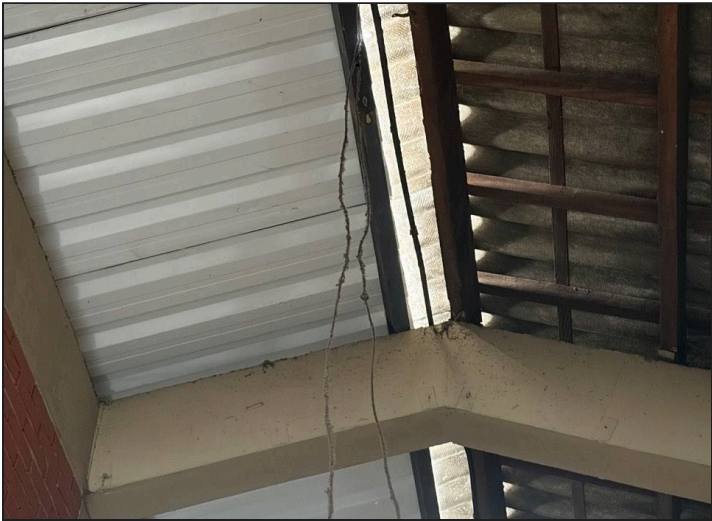

Tubulação e fios pendurados

05/10/2026

Douglas Eng. responsável — contratada	ANTONIO CABELO Empreiteiro	FABIO Fiscal / FDE
---	--	--
