

|                                                           |                                                                                                                                                     |                                                  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <div>ATA FDE</div> <div>CONTRATO<br/>ATA.FDE 41.301</div> | <div>RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA</div> <div>Modelo conforme o Livro de Ocorrências da FDE · documento de acompanhamento da contratada</div> | Nº 1                                             |
|                                                           |                                                                                                                                                     | Data: 05/10/2026                                 |
|                                                           |                                                                                                                                                     | Visita: 11:57                                    |
|                                                           |                                                                                                                                                     | Preenchido por: Eng. Luis Júnior                 |
| OBRA / UNIDADE DE ENSINO<br>EE EDUARDO VAZ                |                                                                                                                                                     | CÓDIGO DO PRÉDIO<br>109111                       |
| LOCAL<br>EMBU DAS ARTES                                   |                                                                                                                                                     | PI (PORTAL)<br>2026/02482                        |
| ORDEM DE SERVIÇO<br>—                                     |                                                                                                                                                     | CONTRATO FDE<br>05/00853/26-001-001              |
| EMPREITEIRO<br>ANTONIO CABELO                             |                                                                                                                                                     | ENG. RESPONSÁVEL / FISCAL FDE<br>Douglas / FABIO |

ITENS VERIFICADOS NA VISITA

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Mão-de-obra / Número de funcionários Qtd. (1)                                      | <input type="checkbox"/> Suficiente <input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente                                                                                                                           |
| 2. Material em canteiro                                                               | <input type="checkbox"/> Suficiente <input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente                                                                                                                           |
| 3. Equipamentos                                                                       | <input type="checkbox"/> Suficiente <input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente                                                                                                                           |
| 4. Tempo                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Seco <input type="checkbox"/> Chuva                                                                                                                                        |
| 5. Falhas construtivas a serem corrigidas                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não                                                                                                                                           |
| 6. Placa de obra instalada                                                            | <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> N/A                                                                                                              |
| 7. Andamento dos serviços (5) % atual<br>aprovado 0% · fiscal FDE 10% (LO 29/09/2026) | <input type="checkbox"/> Não iniciada <input type="checkbox"/> Em execução <input checked="" type="checkbox"/> Obra paralisada<br><input type="checkbox"/> Obra concluída <input type="checkbox"/> Em rescisão |
| 8. Ritmo da obra                                                                      | <input type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Lento <input checked="" type="checkbox"/> Parado                                                                                                      |
| 9. Organização e limpeza da obra                                                      | <input type="checkbox"/> Boa <input type="checkbox"/> Regular <input checked="" type="checkbox"/> Ruim                                                                                                         |
| 10. Previsão de término                                                               | —                                                                                                                                                                                                              |

AVANÇO DA OBRA

| Indicador                                   | %   | Referência                          |
|---------------------------------------------|-----|-------------------------------------|
| Aprovado pela FDE (medições aprovadas)      | 0%  | M001 aprovada · M002 em análise scm |
| Execução apontada pelo engenheiro           | 5%  | visita de 05/10/2026                |
| Fiscal da FDE — último livro de ocorrências | 10% | LO nº 5 de 29/09/2026               |

SERVIÇOS EXECUTADOS

- Serviços parados
- Efetivo tinha apenas uma funcionários organizando e limpando

MATERIAIS — PEDIDOS SEM ENTREGA ATÉ 05/10/2026

5 pedidos no Sienge · 5 entregues · 0 com item pendente, somando R\$ 0,00 a receber.

Nenhum pedido sem entrega confirmada até 05/10/2026.

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES

**Pendências em aberto**

- Aguardando entrega de material já comprado - elétrico e hidráulico

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



Entregue apenas luminária da elétrica

05/10/2026



Demolição de revestimento

05/10/2026




Portas de ferro entregue

05/10/2026



Demolição e contrapiso parado

05/10/2026

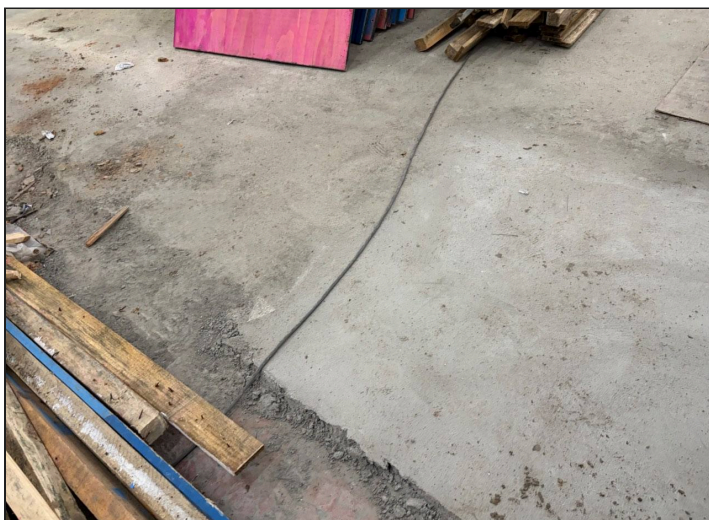

Contrapiso parado

05/10/2026



Porta de acesso mas sem identificação da obra

05/10/2026



Demolição e piso parada

05/10/2026



Desorganização na obra

05/10/2026

|                                                             |                                                  |                                          |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <div>Douglas</div> <div>Eng. responsável — contratada</div> | <div>ANTONIO CABELO</div> <div>Empreiteiro</div> | <div>FABIO</div> <div>Fiscal / FDE</div> |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
