

ATA FDE CONTRATO ATA.FDE 42.275	RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA Modelo conforme o Livro de Ocorrências da FDE · documento de acompanhamento da contratada	Nº 1
		Data: 05/10/2026
		Visita: 13:16
		Preenchido por: Eng. Luis Júnior
OBRA / UNIDADE DE ENSINO EE/EMEF JD MARIA HELENA / PADRE ELIDIO		CÓDIGO DO PRÉDIO 102206
LOCAL BARUERI		PI (PORTAL) 2024/01752
ORDEM DE SERVIÇO —		CONTRATO FDE 70/00559/26-001-001
EMPREITEIRO RAFAEL		ENG. RESPONSÁVEL / FISCAL FDE LEONARDO / GUILHERME

ITENS VERIFICADOS NA VISITA

1. Mão-de-obra / Número de funcionários Qtd. (0)	☐ Suficiente ☒ Insuficiente
2. Material em canteiro	☒ Suficiente ☐ Insuficiente
3. Equipamentos	☒ Suficiente ☐ Insuficiente
4. Tempo	☒ Seco ☐ Chuva
5. Falhas construtivas a serem corrigidas	☒ Sim ☐ Não
6. Placa de obra instalada	☐ Sim ☐ Não ☒ N/A
7. Andamento dos serviços (24) % atual aprovado 21,2% · fiscal FDE 38% (LO 28/09/2026)	☐ Não iniciada ☒ Em execução ☐ Obra paralisada ☐ Obra concluída ☐ Em rescisão
8. Ritmo da obra	☒ Normal ☐ Lento ☐ Parado
9. Organização e limpeza da obra	☐ Boa ☐ Regular ☒ Ruim
10. Previsão de término	—

AVANÇO DA OBRA

Indicador	%	Referência
Aprovado pela FDE (medições aprovadas)	21,2%	M001 a M003 aprovadas · M004 em edição fiscal
Execução apontada pelo engenheiro	24%	visita de 05/10/2026
Fiscal da FDE — último livro de ocorrências	38%	LO nº 10 de 28/09/2026

SERVIÇOS EXECUTADOS

- No horário da vistoria não havia funcionário na unidade

MATERIAIS — PEDIDOS SEM ENTREGA ATÉ 05/10/2026

4 pedidos no Sienge · 4 entregues · 0 com item pendente, somando R\$ 0,00 a receber.

Nenhum pedido sem entrega confirmada até 05/10/2026.

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES

Pendências em aberto


- Instalação da porta de vidro no corredor, solicitado diversas vezes e até o momento não instalado
- Material sem isolamento no corredor de acesso ao estacionamento
- Material sem isolamento no refeitório, acesso para qualquer pessoa
- Pisos sem junta de dilatação executada
- Pisos com degrau entre ambientes
- Sem soleiras, mostrando o piso sob piso executado

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Latas de tintas sem isolamento no refeitório

05/10/2026

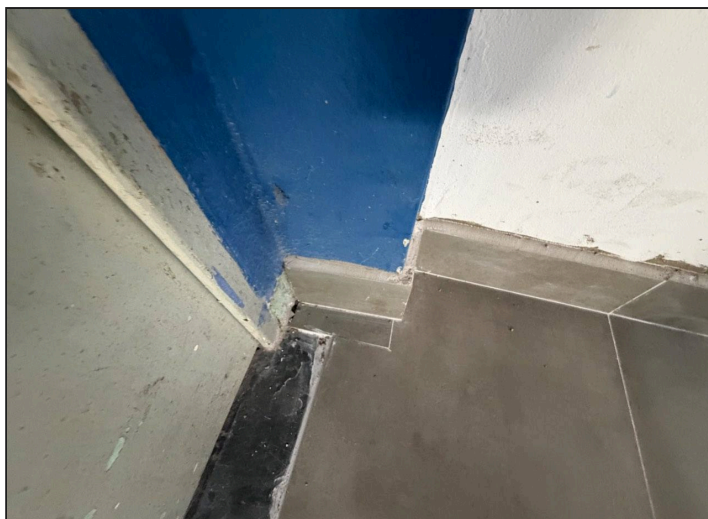


Acabamento do piso ficou ruim

05/10/2026

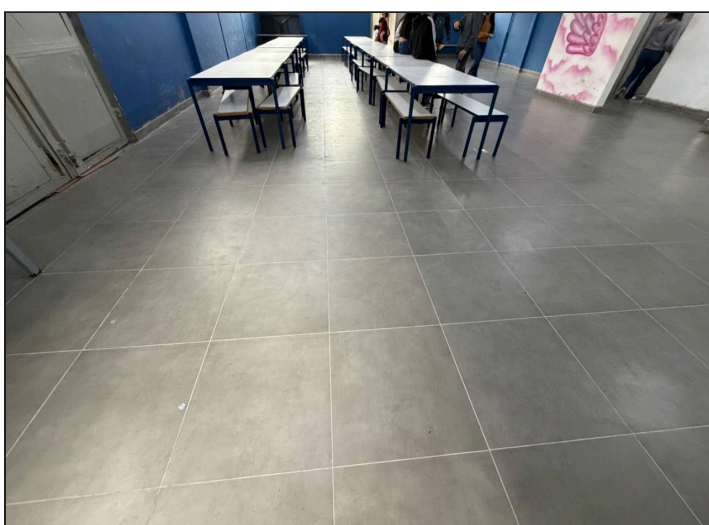


Piso refeitório sem junta de dilatação

05/10/2026

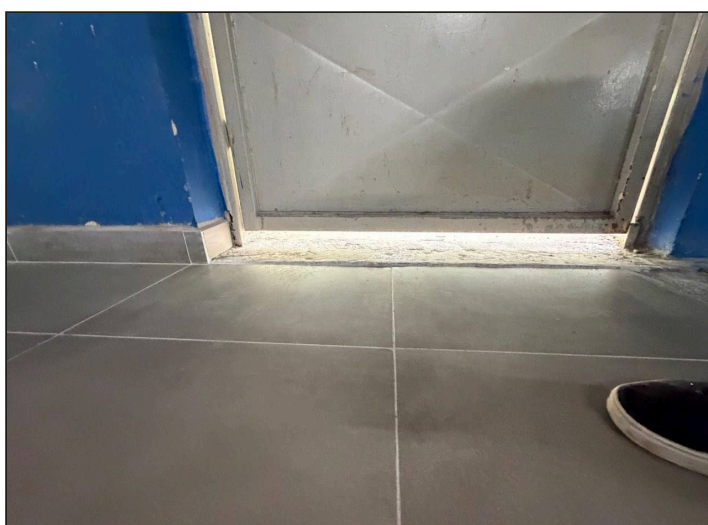


Degrau no acesso externo

05/10/2026

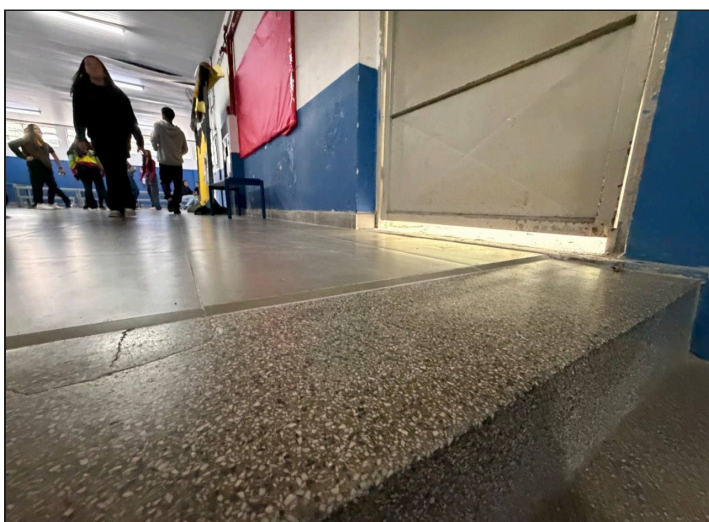

Registro da visita

05/10/2026

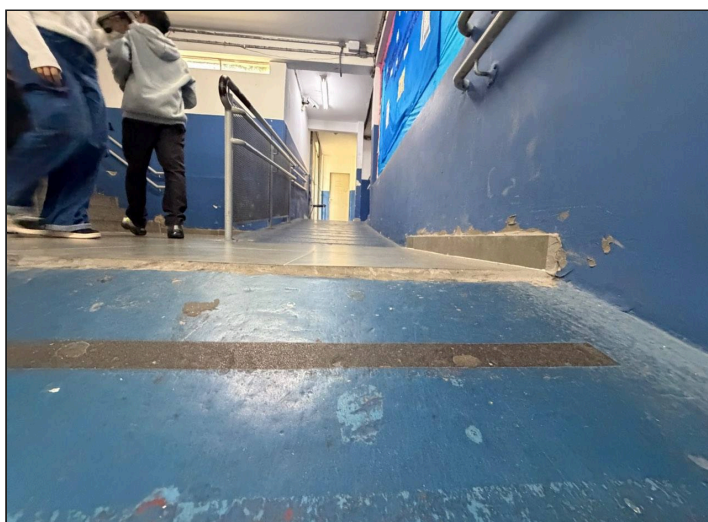

Registro da visita

05/10/2026



Não trocado soleira entre ambientes, degrau no piso 05/10/2026



Sem soleira, podendo danificar o piso 05/10/2026




Sem soleira, mostrando o piso sob piso 05/10/2026



Sem isolamento material no corredor acesso estacionamento 05/10/2026



Entulho no estacionamento 05/10/2026

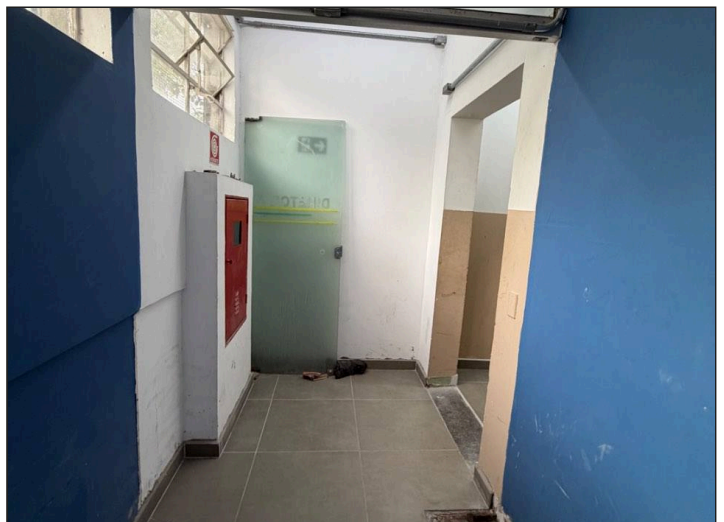

Porta removida ainda não foi instalada 05/10/2026



Danificado guarnição porta sala direção

05/10/2026

_____ LUIS JÚNIOR Eng. responsável — contratada	_____ RAFAEL Empreiteiro	_____ GUILHERME Fiscal / FDE
--	---	---
