

|                                                                        |                                                                                                                                                     |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <div>ATA FDE</div> <div>CONTRATO<br/>ATA.FDE 42.285</div>              | <div>RELATÓRIO SEMANAL DE ACOMPANHAMENTO</div> <div>Modelo conforme o Livro de Ocorrências da FDE · documento de acompanhamento da contratada</div> | Semana 41                 |
|                                                                        |                                                                                                                                                     | 05/10/2026 a 09/10/2026   |
|                                                                        |                                                                                                                                                     | 1 visita(s) registrada(s) |
| <div>OBRA / UNIDADE DE ENSINO</div> <div>CANDIDO RONDON MARECHAL</div> | <div>CÓDIGO DO PRÉDIO</div> <div>117101</div>                                                                                                       |                           |
| <div>LOCAL</div> <div>ITAPEVI</div>                                    | <div>PI (PORTAL)</div> <div>2026/02302</div>                                                                                                        |                           |
| <div>ORDEM DE SERVIÇO</div> <div>—</div>                               | <div>CONTRATO FDE</div> <div>05/00458/26-001-001</div>                                                                                              |                           |
| <div>EMPREITEIRO</div> <div>LEONIZIO</div>                             | <div>ENG. RESPONSÁVEL / FISCAL FDE</div> <div>LEONARDO / VINICIUS</div>                                                                             |                           |

RESUMO DA SEMANA

| Data       | Dia | Efetivo | Tempo | Ritmo  | % execução (eng.) |
|------------|-----|---------|-------|--------|-------------------|
| 05/10/2026 | seg | 0       | Chuva | Normal | 99%               |

1 visita(s) entre 05/10/2026 e 09/10/2026 1 dia(s) de chuva. Execução: 99%. Previsão de término: .

AVANÇO DA OBRA

| Indicador                                   | %    | Referência                          |
|---------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| Aprovado pela FDE (medições aprovadas)      | 7,6% | M001 aprovada · M002 em análise scm |
| Execução apontada pelo engenheiro           | 99%  | visita de 09/10/2026                |
| Fiscal da FDE — último livro de ocorrências | 90%  | LO nº 6 de 24/09/2026               |

SERVIÇOS EXECUTADOS NA SEMANA

|                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>CONCLUSÃO DA OBRA (falta alguns detalhes)</li><li>Agendado para entrega com o Fiscal na Quinta-feira</li></ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

MATERIAIS — SITUAÇÃO DOS PEDIDOS EM 05/10/2026

Situação na data de emissão deste relatório (05/10/2026 às 13:55): pedidos do Sienge (01/01/2026 a 02/10/2026, exportação de 02/10/2026 13:10), marcações de entrega do painel e solicitações sem pedido de compra (Sienge, 01/10/2026).

Nenhum pedido mudou de pendente para entregue nesta semana.

3 pedidos no Sienge · 3 entregues · 0 com item pendente, somando R\$ 0,00 a receber.

Nenhum pedido sem entrega confirmada até 05/10/2026.

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES DA SEMANA

|                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pendências em aberto</b> <ul style="list-style-type: none"><li>01 - Retoque de pintura na janela- (Pátio)</li><li>02 - Acabamento (piso de concreto)</li></ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## REGISTRO FOTOGRÁFICO DA SEMANA



Registro da visita

05/10/2026



Registro da visita

05/10/2026



Registro da visita

05/10/2026




Pendência 02

05/10/2026




Registro da visita

05/10/2026

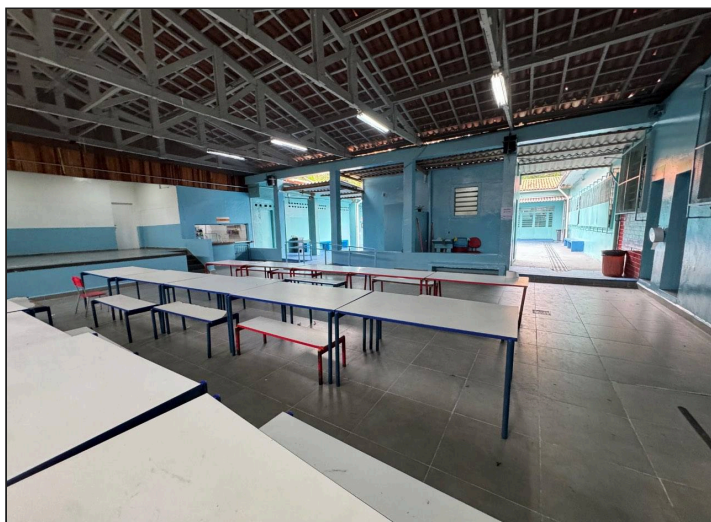

Registro da visita

05/10/2026

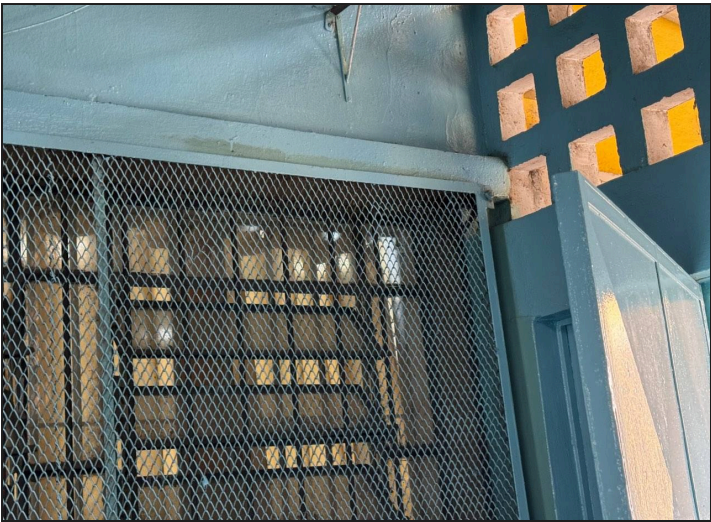

Pendência 01

05/10/2026



Registro da visita

05/10/2026



Registro da visita

05/10/2026

|                                           |                         |                          |
|-------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| LEONARDO<br>Eng. responsável — contratada | LEONIZIO<br>Empreiteiro | VINICIUS<br>Fiscal / FDE |
|-------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
