

ATA FDE CONTRATO ATA.FDE 42.228	RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA Modelo conforme o Livro de Ocorrências da FDE · documento de acompanhamento da contratada	Nº 1
		Data: 01/10/2026
		Visita: 13:30
		Preenchido por: Eng. Leonardo

OBRA / UNIDADE DE ENSINO NERCY AMELIA MARTELINI DAHER PROFESSORA	CÓDIGO DO PRÉDIO 125102
LOCAL PIRAPORA DO BOM JESUS	PI (PORTAL) 2023/02722
ORDEM DE SERVIÇO —	CONTRATO FDE 70/00313/26-001-001
EMPREITEIRO ARAUJO	ENG. RESPONSÁVEL / FISCAL FDE LEONARDO / RODRIGO

ITENS VERIFICADOS NA VISITA

1. Mão-de-obra / Número de funcionários Qtd. (6)	☒ Suficiente ☐ Insuficiente
2. Material em canteiro	☒ Suficiente ☐ Insuficiente
3. Equipamentos	☒ Suficiente ☐ Insuficiente
4. Tempo	☐ Seco ☒ Chuva
5. Falhas construtivas a serem corrigidas	☒ Sim ☐ Não
6. Placa de obra instalada	☐ Sim ☐ Não ☒ N/A
7. Andamento dos serviços () % atual aprovado 65% · fiscal FDE 57% (LO 18/09/2026)	☐ Não iniciada ☒ Em execução ☐ Obra paralisada ☐ Obra concluída ☐ Em rescisão
8. Ritmo da obra	☒ Normal ☐ Lento ☐ Parado
9. Organização e limpeza da obra	☐ Boa ☐ Regular ☐ Ruim
10. Previsão de término	29/01/2027

PONTOS DE ATENÇÃO

- ALTO Falhas construtivas a corrigir — registrar quais e o prazo

AVANÇO DA OBRA

Indicador	%	Referência
Aprovado pela FDE (medições aprovadas)	65%	M001 a M004 aprovadas · M005 em análise fiscal
Execução apontada pelo engenheiro	—	não informado na visita
Fiscal da FDE — último livro de ocorrências	57%	LO nº 13 de 18/09/2026

SERVIÇOS EXECUTADOS

- EXECUÇÃO DE FORRO DE GESSO NA SALA DE LEITURA
- ADEQUAÇÃO DA RAMPA DE ACESSO ÀS SALAS
- EXECUÇÃO DE LIMPEZA DA OBRA
- INSTALAÇÃO DE PORTAS NAS SALAS

MATERIAIS — PEDIDOS SEM ENTREGA ATÉ 01/10/2026

20 pedidos no Sienge · 20 entregues · 0 com item pendente, somando R\$ 0,00 a receber.

Nenhum pedido sem entrega confirmada até 01/10/2026.

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES

Observações

- ADEQUAÇÕES E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA PREPARAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR PARA AS ELEIÇÕES

Recomendações à contratada

- REGULARIZAÇÃO DAS PENDÊNCIAS 01, 02, 03, 05, 06 E 07 ATÉ O DIA 02/10/2026, CONFORME COMBINADO. APÓS A REGULARIZAÇÃO, ENVIAR FOTOS NO GRUPO PARA REGISTRO

Pendências em aberto

- 1- PROBLEMA NO ENCANAMENTO DO RESERVATÓRIO, OCASIONANDO FALTA DE ÁGUA NA UNIDADE ESCOLAR. ENCANADOR ACIONADO, COM ATENDIMENTO PROGRAMADO PARA AMANHÃ, CONFORME INFORMAÇÃO DO EMPREITEIRO
- 2- EXECUÇÃO DE ACABAMENTOS (INSTALAÇÃO DE SIFÕES E CANTONEIRAS) E LIMPEZA GROSSA NOS BANHEIROS PARA LIBERAÇÃO DA UNIDADE PARA AS ELEIÇÕES
- 3- INSTALAÇÃO DE PORTAS NAS SALAS E LIMPEZA DA OBRA
- 4- VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE GÁS
- 5- ADEQUAÇÃO DA RAMPA DE ACESSO ÀS SALAS DE AULA
- 6- LIMPEZA DA OBRA PARA AS ELEIÇÕES
- 7- AJUSTE E REPOSICIONAMENTO DA LONA EXISTENTE NAS CADEIRAS DA QUADRA


REGISTRO FOTOGRÁFICO




01/10/2026




01/10/2026

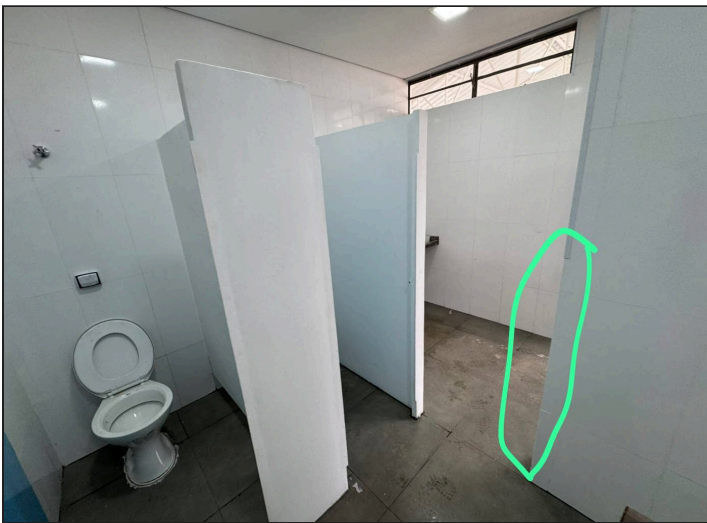

01/10/2026

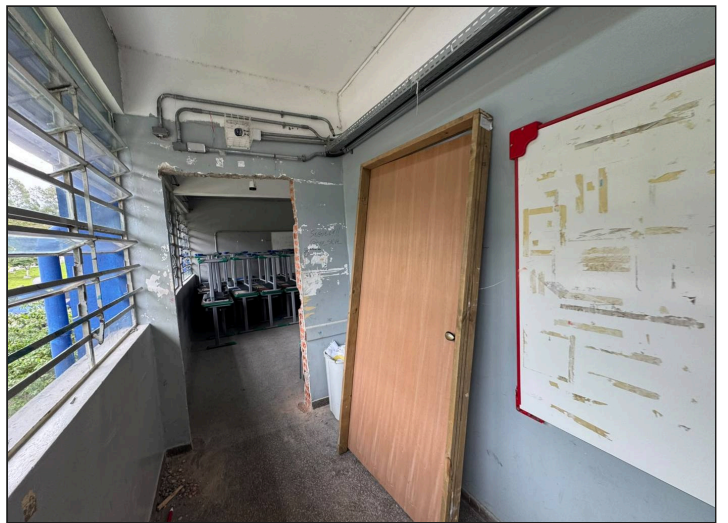


01/10/2026

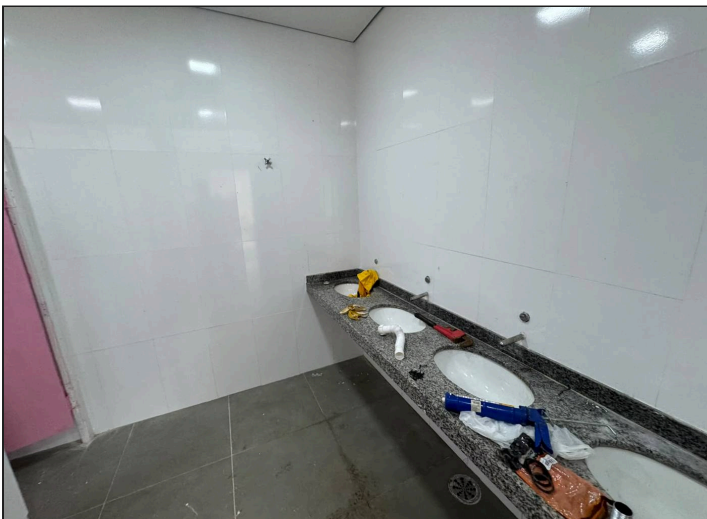

01/10/2026



01/10/2026

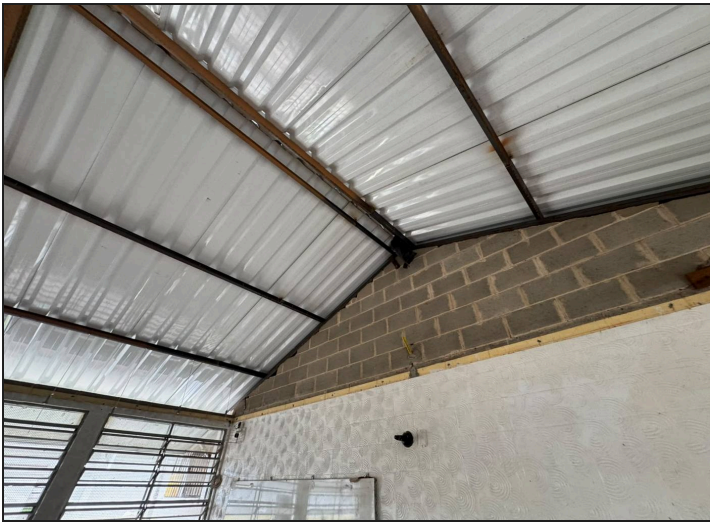

01/10/2026



01/10/2026



01/10/2026



01/10/2026



01/10/2026

LEONARDO Eng. responsável — contratada	ARAUJO Empreiteiro	RODRIGO Fiscal / FDE
--	--	--
