

ATA FDE CONTRATO ATA.FDE 42.228	RELATÓRIO SEMANAL DE ACOMPANHAMENTO Modelo conforme o Livro de Ocorrências da FDE · documento de acompanhamento da contratada	Semana 40
		28/09/2026 a 02/10/2026
		1 visita(s) registrada(s)
OBRA / UNIDADE DE ENSINO NERCY AMELIA MARTELINI DAHER PROFESSORA		CÓDIGO DO PRÉDIO 125102
LOCAL PIRAPORA DO BOM JESUS		PI (PORTAL) 2023/02722
ORDEM DE SERVIÇO —		CONTRATO FDE 70/00313/26-001-001
EMPREITEIRO ARAUJO		ENG. RESPONSÁVEL / FISCAL FDE LEONARDO / RODRIGO

RESUMO DA SEMANA

Data	Dia	Efetivo	Tempo	Ritmo	% execução (eng.)
01/10/2026	qui	6	Chuva	Normal	—

1 visita(s) entre 28/09/2026 e 02/10/2026 1 dia(s) de chuva. Previsão de término: **29/01/2027**.

AVANÇO DA OBRA

Indicador	%	Referência
Aprovado pela FDE (medições aprovadas)	65%	M001 a M004 aprovadas · M005 em análise fiscal
Execução apontada pelo engenheiro	—	não informado na visita
Fiscal da FDE — último livro de ocorrências	57%	LO nº 13 de 18/09/2026

SERVIÇOS EXECUTADOS NA SEMANA

- EXECUÇÃO DE FORRO DE GESSO NA SALA DE LEITURA - ADEQUAÇÃO DA RAMPA DE ACESSO ÀS SALAS - EXECUÇÃO DE LIMPEZA DA OBRA - INSTALAÇÃO DE PORTAS NAS SALAS
--

MATERIAIS — SITUAÇÃO DOS PEDIDOS EM 02/10/2026

Situação na data de emissão deste relatório (02/10/2026 às 21:07): pedidos do Sienge (01/01/2026 a 02/10/2026, exportação de 02/10/2026 13:10), marcações de entrega do painel e solicitações sem pedido de compra (Sienge, 01/10/2026).

Nenhum pedido mudou de pendente para entregue nesta semana.

20 pedidos no Sienge · 20 entregues · 0 com item pendente, somando **R\$ 0,00** a receber.

Nenhum pedido sem entrega confirmada até 02/10/2026.

Solicitações sem pedido de compra (23)

Solicitação	Finalidade	Itens ainda sem pedido	Entrega
28210 11/05/2026	FINALIDADE: TAPUME FDE ISOLAMENTO TALUDE solicitado há 144 dias	ADESIVO LOGOTIPO FDE — 3 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28212 11/05/2026	FINALIDADE: MURO DE DIVISA FD-16 solicitado há 144 dias	Areia média — 6 m³ BRITA N°01 — 6 m³	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28213 11/05/2026	FINALIDADE: WC ALUNOS MASC E FEM solicitado há 144 dias	PM-74 COMPLETA — 8 un PM-71 COMPLETA — 2 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra

Solicitação	Finalidade	Itens ainda sem pedido	Entrega
28214 11/05/2026	FINALIDADE: WC ALUNOS MASC E FEM solicitado há 144 dias	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DN= 25MM — 2 br TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DN= 50MM — 2 br Tubo PVC SN 100mm — 1 br PAPELEIRA DE LOUÇA BRANCA DE 15X15CM — 7 un CAIXA SIFONADA PVC DN100X100X50MM COM GRELHA PVC — 2 un RALO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM COM GRELHA PVC — 2 un BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA COM ASSENTO — 7 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28215 11/05/2026	FINALIDADE: WC ALUNOS MASC E FEM solicitado há 144 dias	Areia média — 3 m³ BRITA N°01 — 3 m³	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28218 11/05/2026	FINALIDADE: FORRO SALA DE AULA solicitado há 144 dias	MASSA DRYWALL 20 KG — 10 sc Perfil Canaleta F530 — 227 un PENDURAL F 530 — 500 un UNIÃO F 530 — 180 un PARAFUSO PPA 25MM — 500 un PARAFUSO PFM 13MM — 800 un CHAPA DRYWALL ST BR 12,5MM 1200 X 1800 — 200 un TIRANTE RÍGIDO - NO. 10 (REB = 1,00 M) — 500 un FITA PARA JUNTA — 4 rol TABICA OU CANTONEIRA 25 X 30 X 3.000 — 147 pç	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28325 14/05/2026	FINALIDADE: COBERTURA solicitado há 141 dias	PARAFUSO AUTO-PERF C/ CONJ VEDACAO P/ TELHA DE ACO — 1.000 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28391 15/05/2026	FINALIDADE: MURO DE DIVISA solicitado há 140 dias	CIMALHA (PINGADEIRA) PRÉ MOLDADA — 75 m	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28483 19/05/2026	FINALIDADE: QE-02 E QE-03 * DE 2KIT COMPLETO DA BASQUETE* *Tabela em chapa de compensado com colagem fenólica, e=20mm e requadro com perfi I metálico galvanizado $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8}$ ou $\frac{1}{4} \times \frac{1}{8}$ Aro com diâmetro interno de 450mm em barra redonda galvanizada de 16mm< $\varnothing$ <20mm; Rede em malha de nylon presa ao aro em 12 pontos, com- primento entre 400 a 450mm; Suporte em chapa de aço galvanizado, e=3/16" * solicitado há 136 dias	QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL — 1 un QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO — 2 un Trelça Cantoneiras de abas iguais $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8}$ em aço ASTM A-36: 1 1/2" x 1/8" (38x3,2mm) — 1 un Trelça Cantoneiras de abas iguais $\frac{1}{4} \times \frac{1}{8}$ em aço ASTM A-36: 1 1/4" x 1/8" (32x3,2mm) — 1 un Trelça Cantoneiras de abas iguais "L" em aço ASTM A-36 1/2" x 3/8" (64x9,5mm) — 2 un Tabela/Cesto: Tabela em chapa de compensado com colagem fenólica, e=20mm e requadro com perfi I metálico galvanizado $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8}$ ou $\frac{1}{4} \times \frac{1}{8}$; Aro com diâmetro interno de 450mm em barra redonda galvanizada de 16mm< $\varnothing$ <20mm; Rede em malha de nylon presa ao aro em 12 pontos, com- primento entre 400 a 450mm; — 2 un Suporte em chapa de aço galvanizado, e=3/16" — 1 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28484 19/05/2026	FINALIDADE: QE-37 solicitado há 136 dias	Aço CA-60 3,40mm — 2 br	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28607 22/05/2026	FINALIDADE: WC ALUNOS LT- 06 solicitado há 133 dias	Torneira de acionamento manual e com ciclo de fechamento automático, com desenho projetado para instalação reforçada e proteção contra o vandalismo, conforme ficha H6.14 — 8 un VÁLVULA DE ESCOAMENTO - $\varnothing=1$ — 8 un SIFÃO TIPO COPO - $\varnothing=1"$ X 1 1/2" — 8 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28608 22/05/2026	FINALIDADE: WC ALUNOS LT- 06 solicitado há 133 dias	Cuba de embutir, oval, de cerâmica esmaltada impermeável, na cor branca — 8 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28609 22/05/2026	FINALIDADE: WC ALUNOS LT- 06 solicitado há 133 dias	TAMPO COM FRONTÃO E PRATELEIRA DE GRANITO POLIDO, L=55CM, E=2CM, CINZA ANDORINHA OU CINZA CORUMBÁ, COMP=2,40M — 2 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra

Solicitação	Finalidade	Itens ainda sem pedido	Entrega
28610 22/05/2026	FINALIDADE: WC ALUNOS solicitado há 133 dias	Espelho EP-01 — 8 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28623 25/05/2026	FINALIDADE: INCENDIO E RESERVATORIO *TODAS AS BARRAS COM 6M* solicitado há 130 dias	Tubo de aço galvanizado 1 1/4" — 4 br TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2" — 4 br TUBO AÇO GALVANIZADO 1" — 1 br Tubo de aço galvanizado 3" — 18 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28624 25/05/2026	FINALIDADE: ESTRUTURAS DE AÇO (FERRAGEM TELHADO) solicitado há 130 dias	CALHA COM ABA 5X8X15 — 195 m SUPORTE U PARA CALHA BEIRAL TIPO 5X8X15 — 195 un BOCAL SAIDA P/CALHA COCHO 100MM GALV. — 8 un PRIMER ANTICORROSIVO (GALV. A FRIIO) 3,6L — 10 gl	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28625 25/05/2026	FINALIDADE: PINTURA solicitado há 130 dias	Tinta piso branco 3,6 l — 2 gl TINTA PISO AZUL 18L — 2 lt Tinta piso Amarelo 18L — 2 lt SELADOR ACRILICO 3,6L — 4 un MASSA CORRIDA P/PAREDE 18KG — 8 lt TINTA ACRILICA PREMIUM BRANCO NEVE 18L — 8 lt TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE PRETO 3,6L — 2 gl TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE CINZA ESCURO 18L — 1 lt	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28771 29/05/2026	FINALIDADE: PINTURA solicitado há 126 dias	Tinta látex Branco 18L — 7 lt Tinta Látex Acrílico Branco 18l — 7 lt Tinta látex Acrílica Marfim 18l — 7 lt TINTA ACRÍLICA - ÁGUAS RASAS — 7 lt	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28772 29/05/2026	FINALIDADE: PINTURA solicitado há 126 dias	SALVA PISO — 4 rol BOBINA DE LONA PRETA 4X20 — 2 un FITA CREPE 10CM LARGURA — 10 un FITA CREPE 20CM LARGURA — 20 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
29486 07/07/2026	FINALIDADE: PROTEÇÃO MATERIAL E TELHADO solicitado há 87 dias	Lona plástica preta — 400 m²	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
29583 13/07/2026	FINALIDADE: FORMA QE-37 solicitado há 81 dias	FORMA DE PAPELAO D=30CM ALT=4,0M — 2 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
30206 05/08/2026	FINALIDADE: FORRO DE DRYWALL - SALAS solicitado há 58 dias	FITA PARA GESSO E DRYWALL 55 MM X 75 MM — 1 un GESSO MULTIUSO 40KG — 1 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
30746 25/08/2026	FINALIDADE: SALA DE LEITURA E CANTINA DO PAVILHÃO 2 solicitado há 38 dias	PLACA DE DRYWALL — 5 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES DA SEMANA

Observações

- ADEQUAÇÕES E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA PREPARAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR PARA AS ELEIÇÕES


Recomendações à contratada

- REGULARIZAÇÃO DAS PENDÊNCIAS 01, 02, 03, 05, 06 E 07 ATÉ O DIA 02/10/2026, CONFORME COMBINADO. APÓS A REGULARIZAÇÃO, ENVIAR FOTOS NO GRUPO PARA REGISTRO

Pendências em aberto

- 1- PROBLEMA NO ENCANAMENTO DO RESERVATÓRIO, OCASIONANDO FALTA DE ÁGUA NA UNIDADE ESCOLAR. ENCANADOR ACIONADO, COM ATENDIMENTO PROGRAMADO PARA AMANHÃ, CONFORME INFORMAÇÃO DO EMPREITEIRO
- 2- EXECUÇÃO DE ACABAMENTOS (INSTALAÇÃO DE SIFÕES E CANTONEIRAS) E LIMPEZA GROSSA NOS BANHEIROS PARA LIBERAÇÃO DA UNIDADE PARA AS ELEIÇÕES
- 3- INSTALAÇÃO DE PORTAS NAS SALAS E LIMPEZA DA OBRA
- 4- VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE GÁS
- 5- ADEQUAÇÃO DA RAMPA DE ACESSO ÀS SALAS DE AULA
- 6- LIMPEZA DA OBRA PARA AS ELEIÇÕES
- 7- AJUSTE E REPOSICIONAMENTO DA LONA EXISTENTE NAS CADEIRAS DA QUADRA


REGISTRO FOTOGRÁFICO DA SEMANA

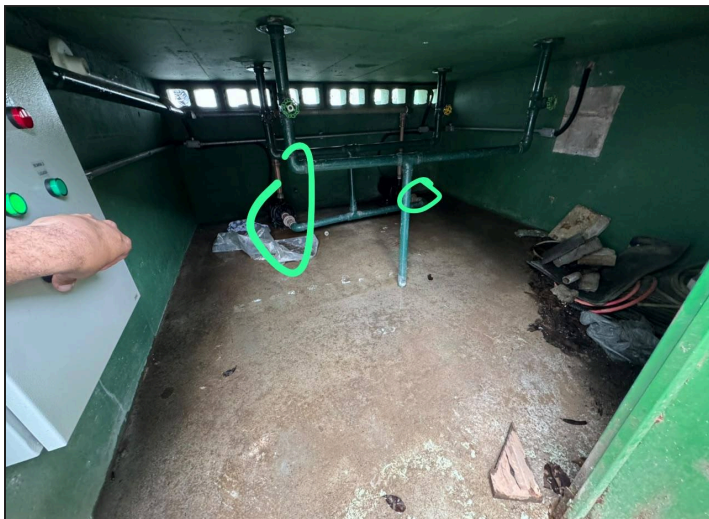

01/10/2026




01/10/2026

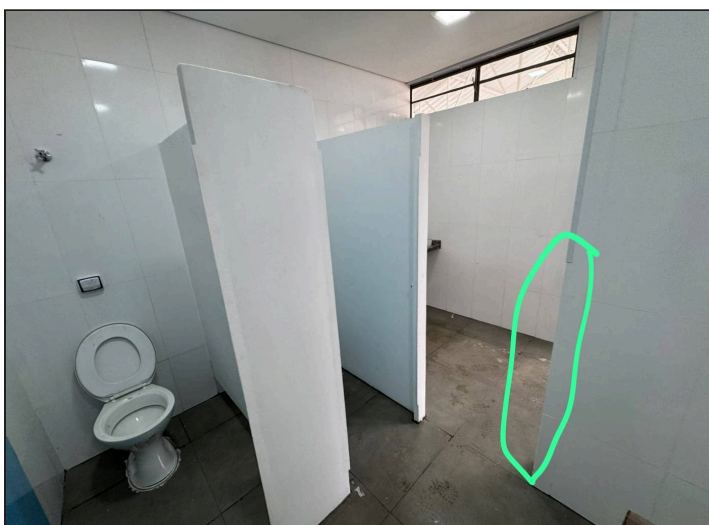

01/10/2026




01/10/2026

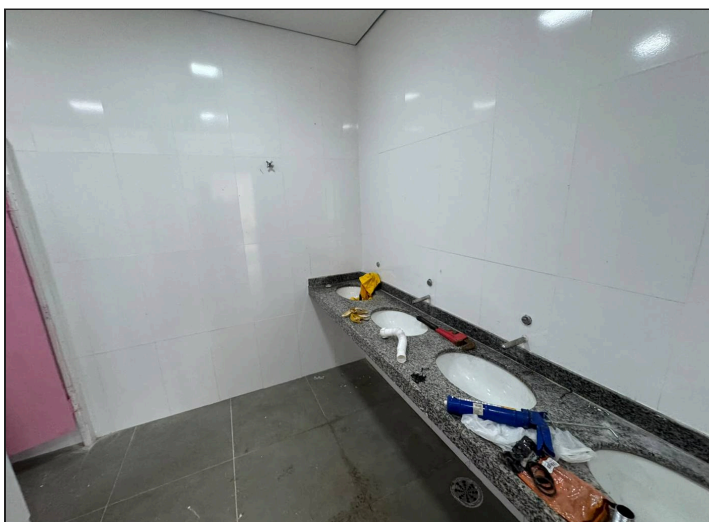

01/10/2026



01/10/2026

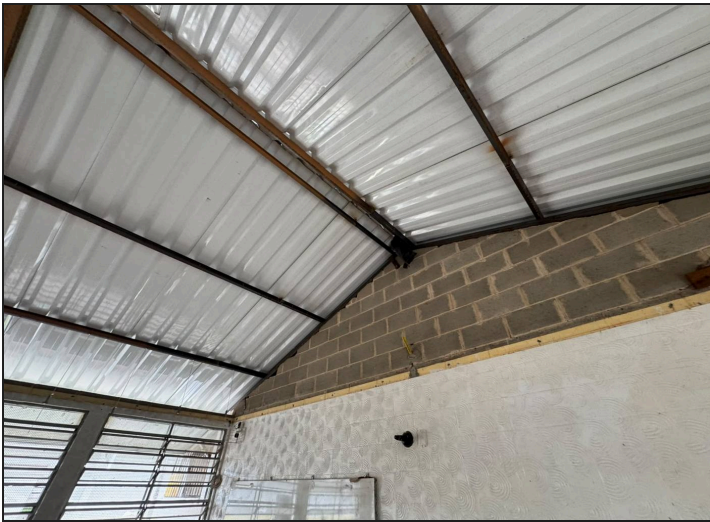

01/10/2026



01/10/2026



01/10/2026



01/10/2026



01/10/2026

LEONARDO Eng. responsável — contratada	ARAUJO Empreiteiro	RODRIGO Fiscal / FDE
---	-----------------------	-------------------------
