

ATA FDE CONTRATO ATA.FDE 41.268	RELATÓRIO SEMANAL DE ACOMPANHAMENTO Modelo conforme o Livro de Ocorrências da FDE · documento de acompanhamento da contratada	Semana 40
		28/09/2026 a 02/10/2026
		1 visita(s) registrada(s)
OBRA / UNIDADE DE ENSINO EE INSTITUTO IMACULADA	CÓDIGO DO PRÉDIO 116302	
LOCAL ITAPECERICA DA SERRA	PI (PORTAL) 2026/01340	
ORDEM DE SERVIÇO —	CONTRATO FDE 70/00588/26-001-001	
EMPREITEIRO RONALDO BRITTES	ENG. RESPONSÁVEL / FISCAL FDE Douglas / FABIO	

RESUMO DA SEMANA

Data	Dia	Efetivo	Tempo	Ritmo	% execução (eng.)
30/09/2026	qua	2	Seco	Lento	—

1 visita(s) entre 28/09/2026 e 02/10/2026 Previsão de término: 28/10/2026.

AVANÇO DA OBRA

Indicador	%	Referência
Aprovado pela FDE (medições aprovadas)	58,1%	M001 a M003 aprovadas · M004 em edição fiscal
Execução apontada pelo engenheiro	—	não informado na visita
Fiscal da FDE — último livro de ocorrências	40%	LO nº 12 de 30/09/2026

SERVIÇOS EXECUTADOS NA SEMANA

- Instalação do caixilhos - Remoções caixilhos lado corredor - Pintura laboratório
--

MATERIAIS — SITUAÇÃO DOS PEDIDOS EM 02/10/2026

Situação na data de emissão deste relatório (02/10/2026 às 21:07): pedidos do Sienge (01/01/2026 a 02/10/2026, exportação de 02/10/2026 13:10), marcações de entrega do painel e solicitações sem pedido de compra (Sienge, 01/10/2026).

Nenhum pedido mudou de pendente para entregue nesta semana.

27 pedidos no Sienge · 27 entregues · 0 com item pendente, somando R\$ 0,00 a receber.

Nenhum pedido sem entrega confirmada até 02/10/2026.

Solicitações sem pedido de compra (3)

Solicitação	Finalidade	Itens ainda sem pedido	Entrega
29323 26/06/2026	FINALIDADE: MATERIAL PARA FORRO EM DRYWALL solicitado há 98 dias	CONECTOR (CLIPES/TRAVAS PARA PERFIL) — 400 un LIXA PARA DRYWALL — 20 fl	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
29325 26/06/2026	FINALIDADE: TAPUME *PONTALETE 6X6 3 M PINUS* solicitado há 98 dias	Broxa retangular — 2 un BISNAGA CORANTE AZUL ESCURO — 3 un ADESIVO LOGO DO FDE — 3 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
29503 07/07/2026	FINALIDADE: COMPLEMENTO COBERTURA solicitado há 87 dias	Eletrodo 3,25mm — 7 kg PARAFUSO AUTOBROCANTE 12 X 3/4" — 200 un PARAFUSO AUTO-PERF C/ CONJ VEDACAO P/ TELHA DE ACO 1/4X3" — 700 un DISCO DE CORTE INOX 180X1,6X22MM (7"X1/16"X7/8") — 50 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES DA SEMANA

Recomendações à contratada

- Finalizar instalação dos caixilhos

Pendências em aberto

- Quadra, material forro

REGISTRO FOTOGRÁFICO DA SEMANA



30/09/2026



30/09/2026




30/09/2026



30/09/2026



30/09/2026

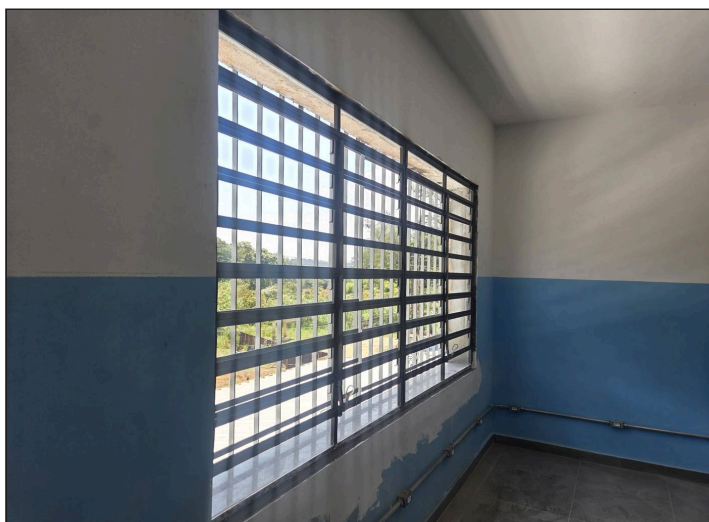

30/09/2026



30/09/2026



30/09/2026



30/09/2026



30/09/2026

_____ Douglas Eng. responsável — contratada	_____ RONALDO BRITTES Empreiteiro	_____ FABIO Fiscal / FDE
--	--	---
