

ATA FDE CONTRATO ATA.FDE 41.274	RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA Modelo conforme o Livro de Ocorrências da FDE · documento de acompanhamento da contratada	Nº 2
		Data: 05/10/2026
		Visita: 11:16
		Preenchido por: Eng. Luis Júnior
OBRA / UNIDADE DE ENSINO ETEC EMBU		CÓDIGO DO PRÉDIO 1200296
LOCAL EMBU DAS ARTES		PI (PORTAL) 2026/00851
ORDEM DE SERVIÇO —		CONTRATO FDE 70/00445/26-001-001
EMPREITEIRO RAFAEL		ENG. RESPONSÁVEL / FISCAL FDE Douglas / FABIO

ITENS VERIFICADOS NA VISITA

1. Mão-de-obra / Número de funcionários Qtd. (1)	☐ Suficiente ☒ Insuficiente
2. Material em canteiro	☐ Suficiente ☒ Insuficiente
3. Equipamentos	☐ Suficiente ☒ Insuficiente
4. Tempo	☒ Seco ☐ Chuva
5. Falhas construtivas a serem corrigidas	☒ Sim ☐ Não
6. Placa de obra instalada	☐ Sim ☐ Não ☒ N/A
7. Andamento dos serviços (40) % atual aprovado 36,6% · fiscal FDE 41% (LO 29/09/2026)	☐ Não iniciada ☒ Em execução ☐ Obra paralisada ☐ Obra concluída ☐ Em rescisão
8. Ritmo da obra	☐ Normal ☒ Lento ☐ Parado
9. Organização e limpeza da obra	☐ Boa ☒ Regular ☐ Ruim
10. Previsão de término	—

AVANÇO DA OBRA

Indicador	%	Referência
Aprovado pela FDE (medições aprovadas)	36,6%	M001 a M004 aprovadas · M005 em edição fiscal
Execução apontada pelo engenheiro	40%	visita de 05/10/2026
Fiscal da FDE — último livro de ocorrências	41%	LO nº 14 de 29/09/2026

SERVIÇOS EXECUTADOS

- Assentamento e rejuntamento de azulejo

MATERIAIS — PEDIDOS SEM ENTREGA ATÉ 05/10/2026

40 pedidos no Sienge · 38 entregues · 2 com item pendente, somando R\$ 43.776,09 a receber.

2 pedido(s) sem entrega confirmada até 05/10/2026 — todos listados abaixo, do mais antigo para o mais novo.

Pedido	Fornecedor	Itens	Valor	Entrega
56182 09/09/2026	PERACINI & CIA LTDA pedido há 26 dias	323 - DIVISORIA SANITARIA DE GRANILITE E=3CM — 143,15 m2 13315 - BATENTE ALUMINIO — 128,70 m/min 13316 - REFORÇO METÁLICO FDE PARA FIXAÇÃO DAS DIVISÓRIAS — 66 pc	R\$ 42.474,50	PENDENTE marcado por Eng. Luis Júnior · 05/10/2026 11:20
57433 05/10/2026	CIMEMPRIMO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pedido há 0 dias	44289 - TIRANTE 15CM — 35 un 44291 - PARAFUSO GN 45 — 5 cx 45077 - PARAFUSO 4,5 X 40 FLANGEADO COM BUCHA 6 (COM ANEL) — 500 un 45076 - CANTONEIRA L — 25 un 7493 - Regulador F530 — 35 un 17760 - Canaleta F530 — 40 un 45078 - PARAFUSO METAL/METAL — 1 cx 7494 - Parafuso GN25 — 1.000 un 18335 - FITA DRYWALL TELADA AZUL 5CMX90M — 5 pç 22476 - MASSA DRYWALL 20 KG — 1 sc 17696 - Bucha 6 — 1.000 un	R\$ 1.310,05	PENDENTE falta R\$ 1.302,30

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES


Pendências em aberto Execução do forro de gesso dos banheiros alunos masculino e feminino, equipe da obra informou que tinha material mas hoje fez uma solicitação da estrutura do forro
--

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Fachada a ser executada reparo do revestimento, pintura e reparo do brise metalico

05/10/2026

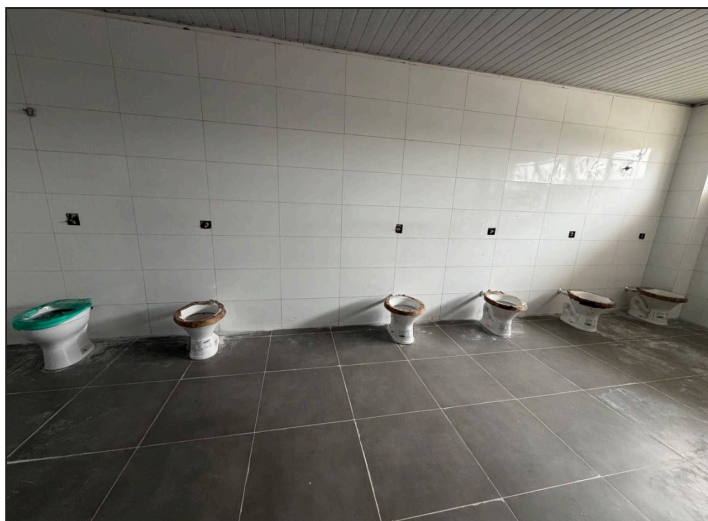

Bacia sanitária com espaçamento

05/10/2026

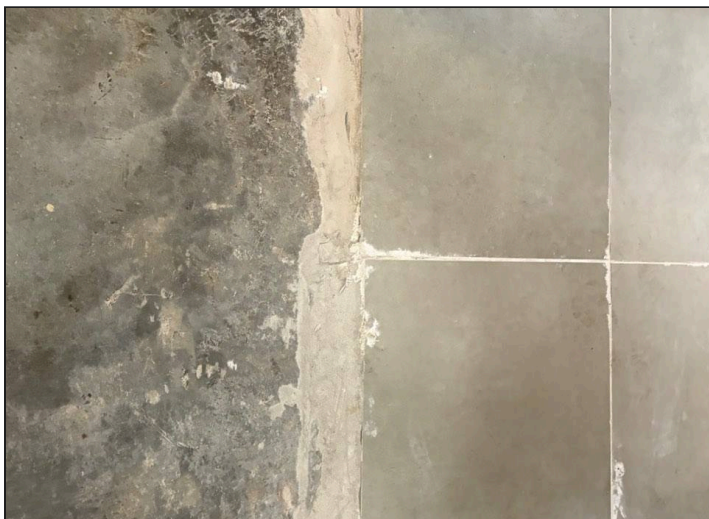

Acabamento ruim entre porcelanato e piso existente da escola

05/10/2026



Acabamento ruim entre porcelanato e piso existente da escola

05/10/2026



Acabamento entre azulejo e viga existente

05/10/2026



Não iniciado forro

05/10/2026




Válvulas sem os acabamentos

05/10/2026



Pontos de infiltração do telhado a serem corrigidos

05/10/2026

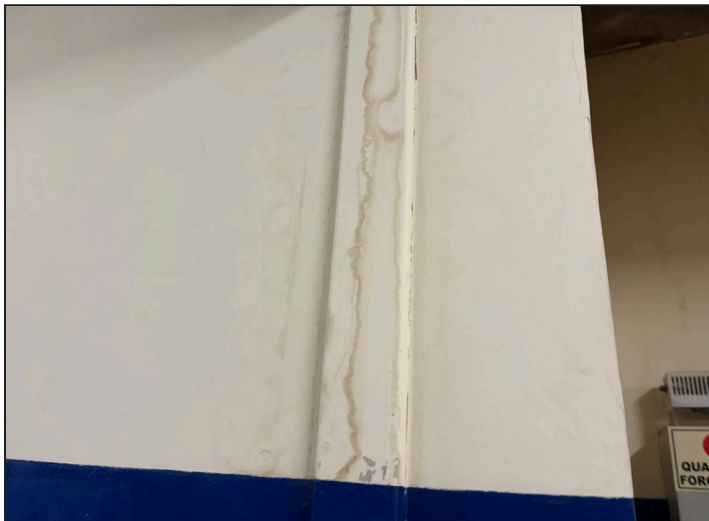

Pontos de infiltração do telhado a serem corrigidos

05/10/2026




Pontos de infiltração do telhado a serem corrigidos (Elevador)

05/10/2026



Pontos de infiltração do telhado a serem corrigidos

05/10/2026

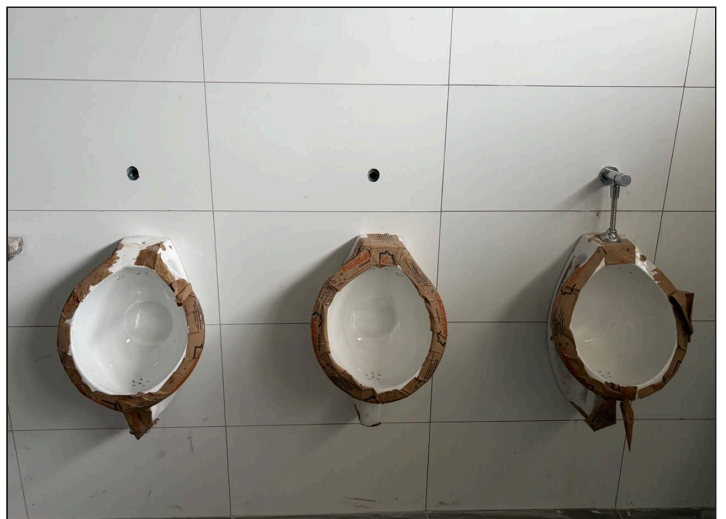

Mictórios não finalizados válvulas

05/10/2026



Azulejo banheiro não finalizado

05/10/2026



Muro onde possivelmente será executado alambrado

05/10/2026



Guarita, previsão de manutenção para acabar com infiltrações

05/10/2026

_____ LUIS JÚNIOR Eng. responsável — contratada	_____ RAFAEL Empreiteiro	_____ FABIO Fiscal / FDE
--	---	---
