

ATA FDE CONTRATO ATA.FDE 42.276	RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA Modelo conforme o Livro de Ocorrências da FDE · documento de acompanhamento da contratada	Nº 1
		Data: 06/10/2026
		Visita: 16:00
		Preenchido por: Eng. Leonardo
OBRA / UNIDADE DE ENSINO REPUBLICA DO EQUADOR		CÓDIGO DO PRÉDIO 102109
LOCAL BARUERI		PI (PORTAL) 2026/00989
ORDEM DE SERVIÇO —		CONTRATO FDE 70/00633/26-001-001
EMPREITEIRO REINALDO		ENG. RESPONSÁVEL / FISCAL FDE LEONARDO / RODRIGO

ITENS VERIFICADOS NA VISITA

1. Mão-de-obra / Número de funcionários Qtd. (1)	☐ Suficiente ☒ Insuficiente
2. Material em canteiro	☒ Suficiente ☐ Insuficiente
3. Equipamentos	☒ Suficiente ☐ Insuficiente
4. Tempo	☒ Seco ☐ Chuva
5. Falhas construtivas a serem corrigidas	☐ Sim ☒ Não
6. Placa de obra instalada	☐ Sim ☐ Não ☒ N/A
7. Andamento dos serviços (37) % atual aprovado 17,1% · fiscal FDE 25% (LO 22/09/2026)	☐ Não iniciada ☒ Em execução ☐ Obra paralisada ☐ Obra concluída ☐ Em rescisão
8. Ritmo da obra	☐ Normal ☒ Lento ☐ Parado
9. Organização e limpeza da obra	☐ Boa ☒ Regular ☐ Ruim
10. Previsão de término	—

AVANÇO DA OBRA

Indicador	%	Referência
Aprovado pela FDE (medições aprovadas)	17,1%	M001 a M003 aprovadas · M004 em análise fiscal
Execução apontada pelo engenheiro	37%	visita de 06/10/2026
Fiscal da FDE — último livro de ocorrências	25%	LO nº 8 de 22/09/2026

SERVIÇOS EXECUTADOS

- ASSENTAMENTO DE PORCELANATO
- REVISÃO ELÉTRICA
- COLOCAÇÃO DE PORTAS

MATERIAIS — PEDIDOS SEM ENTREGA ATÉ 06/10/2026

14 pedidos no Sienge · 12 entregues · 2 com item pendente, somando R\$ 8.232,35 a receber.

2 pedido(s) sem entrega confirmada até 06/10/2026 — todos listados abaixo, do mais antigo para o mais novo.

Pedido	Fornecedor	Itens	Valor	Entrega
53527 23/07/2026	LEANDRO GONZALEZ ELETRICA pedido há 75 dias	41940 - CONDULETE 3/4 COM TAMPA — 20 un (pend. 20) 41941 - LUMINÁRIA SOBREPOR LED TUBULAR VIDRO 2X18W (COM LAMPADAS) — 18 un (pend. 18) 10126 - Eletroduto Galvanizado 3/4 — 15 br (pend. 15) 9375 - EX-01 Exaustor axial DN= 40cm — 1 un (pend. 1) 11012 - Tomada 2P + T 20A — 5 un (pend. 5) 17839 - TOMADA 2P+T DE 10A — 5 cj (pend. 5)	R\$ 2.492,35	PARCIAL marcado por Eng. Leonardo · 06/10/2026 01:46
57416 05/10/2026	ATACADAO DAS MADEIRAS LTDA pedido há 1 dias	44607 - PORTA DE BANHEIRO DE MADEIRA, BOX, 62CM X 1,50M, COM FECHADURA INDICADORA — 14 un	R\$ 5.740,00	PENDENTE falta R\$ 5.740,00

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES

Recomendações à contratada • APÓS A REGULARIZAÇÃO, ENVIAR FOTOS NO GRUPO PARA REGISTRO Pendências em aberto • 01 - AUMENTAR O EFETIVO NA OBRA, CONFORME ACORDADO COM O EMPREITEIRO • 02 - INÍCIO DA DEMOLIÇÃO DO MURO DE DIVISA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



PENDÊNCIA 01

06/10/2026



PENDÊNCIA 01

06/10/2026



PENDÊNCIA 01

06/10/2026



PENDÊNCIA 02 E 01

06/10/2026




PENDÊNCIA 01

06/10/2026



PENDÊNCIA 01

06/10/2026

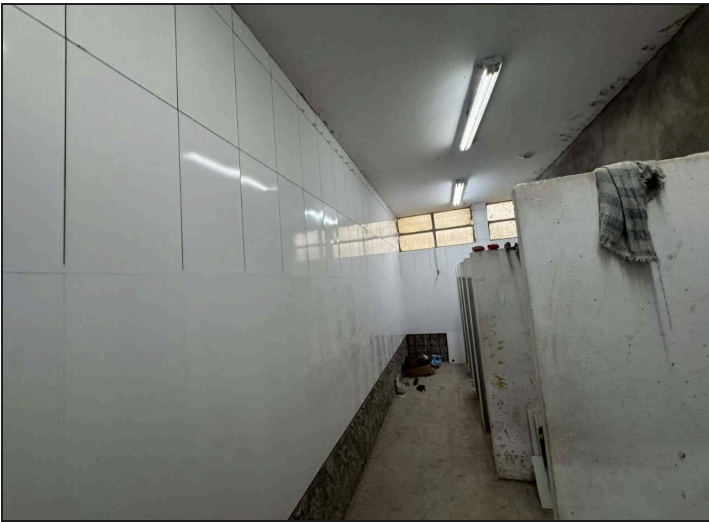

PENDÊNCIA 01

06/10/2026



PENDÊNCIA 02 E 01

06/10/2026



PENDÊNCIA 01

06/10/2026



PENDÊNCIA 01

06/10/2026

LEONARDO Eng. responsável — contratada	REINALDO Empreiteiro	RODRIGO Fiscal / FDE
--	--	--
