

ATA FDE CONTRATO ATA.FDE 42.284	RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA Modelo conforme o Livro de Ocorrências da FDE · documento de acompanhamento da contratada	Nº 1
		Data: 05/10/2026
		Visita: 09:13
		Preenchido por: Eng. Leonardo
OBRA / UNIDADE DE ENSINO EE PROFA IGNES AMELIA OLIVEIRA MACHADO		CÓDIGO DO PRÉDIO 117116
LOCAL ITAPEVI		PI (PORTAL) 2026/02180
ORDEM DE SERVIÇO —		CONTRATO FDE 70/00639/26-001-001
EMPREITEIRO ANTONIO CABELO		ENG. RESPONSÁVEL / FISCAL FDE LEONARDO / VINICIUS

ITENS VERIFICADOS NA VISITA

1. Mão-de-obra / Número de funcionários Qtd. (0)	☐ Suficiente ☒ Insuficiente
2. Material em canteiro	☐ Suficiente ☒ Insuficiente
3. Equipamentos	☒ Suficiente ☐ Insuficiente
4. Tempo	☒ Seco ☐ Chuva
5. Falhas construtivas a serem corrigidas	☐ Sim ☒ Não
6. Placa de obra instalada	☐ Sim ☐ Não ☒ N/A
7. Andamento dos serviços (99) % atual aprovado 42,2% · fiscal FDE 45% (LO 10/09/2026)	☐ Não iniciada ☐ Em execução ☒ Obra paralisada ☐ Obra concluída ☐ Em rescisão
8. Ritmo da obra	☐ Normal ☐ Lento ☒ Parado
9. Organização e limpeza da obra	☒ Boa ☐ Regular ☐ Ruim
10. Previsão de término	—

AVANÇO DA OBRA

Indicador	%	Referência
Aprovado pela FDE (medições aprovadas)	42,2%	M001 a M003 aprovadas · M004 em análise fiscal
Execução apontada pelo engenheiro	99%	visita de 05/10/2026
Fiscal da FDE — último livro de ocorrências	45%	LO nº 3 de 10/09/2026

SERVIÇOS EXECUTADOS

- OBRA COM ENTREGA PREVISTA PARA QUINTA-FEIRA
- CONFORME ALINHADO COM O FISCAL

MATERIAIS — PEDIDOS SEM ENTREGA ATÉ 05/10/2026

6 pedidos no Sienge · 5 entregues · 1 com item pendente, somando R\$ 400,00 a receber.


1 pedido(s) sem entrega confirmada até 05/10/2026 — todos listados abaixo, do mais antigo para o mais novo.

Pedido	Fornecedor	Itens	Valor	Entrega
57239 01/10/2026	ATACADAO DAS MADEIRAS LTDA pedido há 5 dias	7705 - Fechadura tipo livre / ocupado — 8 un	R\$ 400,00	PENDENTE marcado por Eng. Leonardo · 06/10/2026 01:21

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES


Recomendações à contratada • APÓS A REGULARIZAÇÃO, ENVIAR FOTOS NO GRUPO PARA REGISTRO Pendências em aberto • 01 - PENDÊNCIA DE ACABAMENTOS DOS REGISTROS HIDRÁULICOS • 02 - INSTALAÇÃO DE TRINCOS NAS PORTAS DOS BOXES • 03 - FALTA DE ACABAMENTO NAS PORTAS DOS BOXES, COM MASSA APARENTE • 04 - FALTA DE DESCARGAS NOS MICTÓRIOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

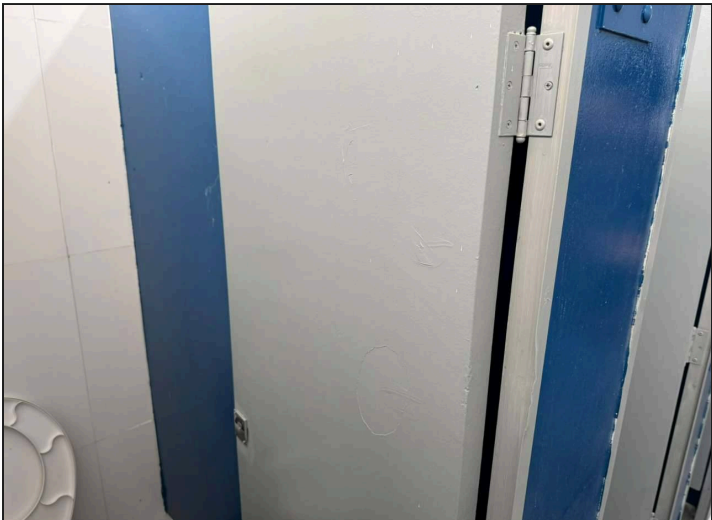


PENDÊNCIA 03

06/10/2026

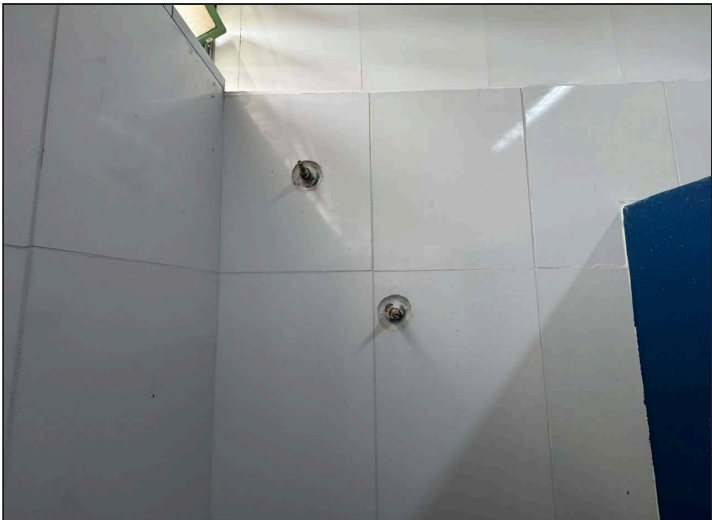


PENDÊNCIA 01

06/10/2026

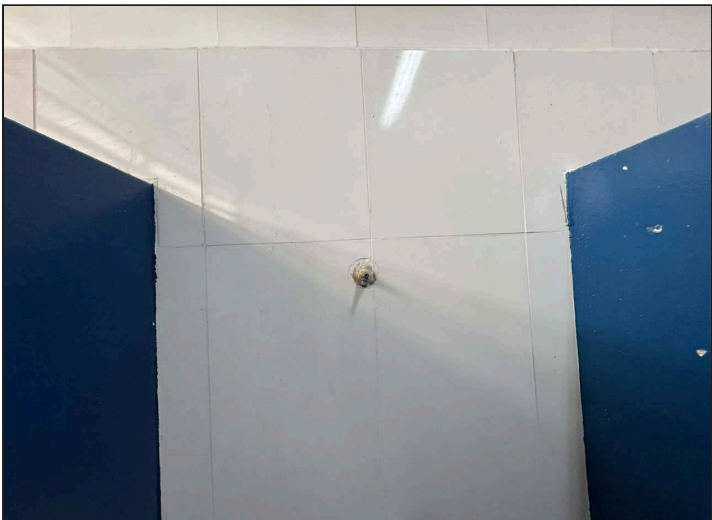


PENDÊNCIA 01

06/10/2026

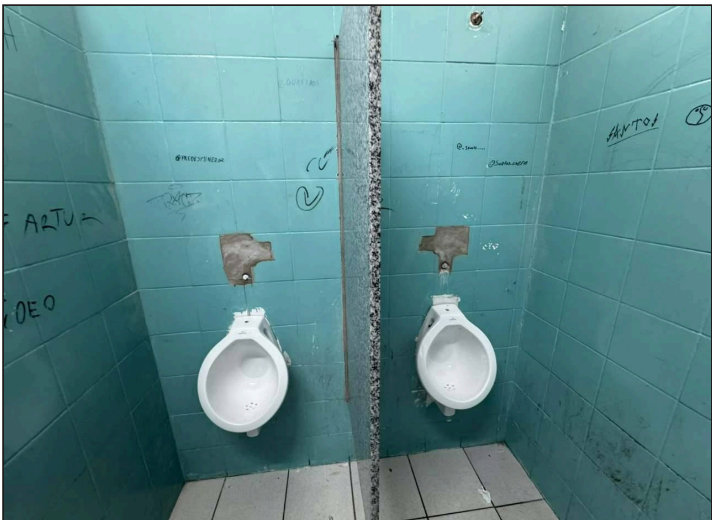


PENDÊNCIA 04

06/10/2026

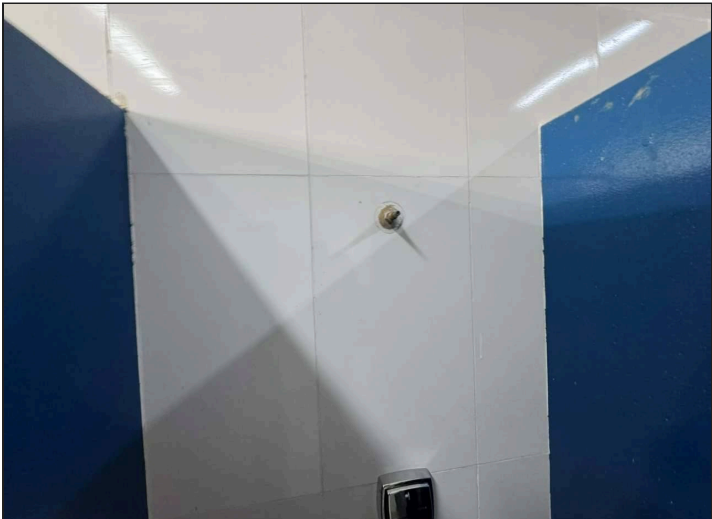


PENDÊNCIA 01

06/10/2026

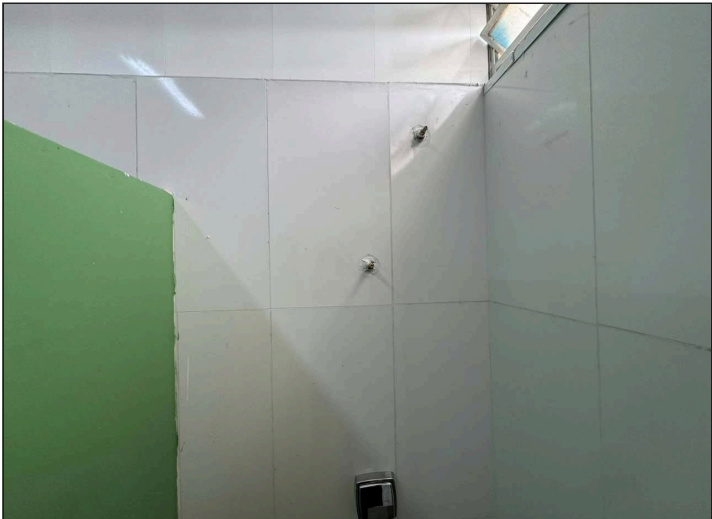


PENDÊNCIA 01

06/10/2026

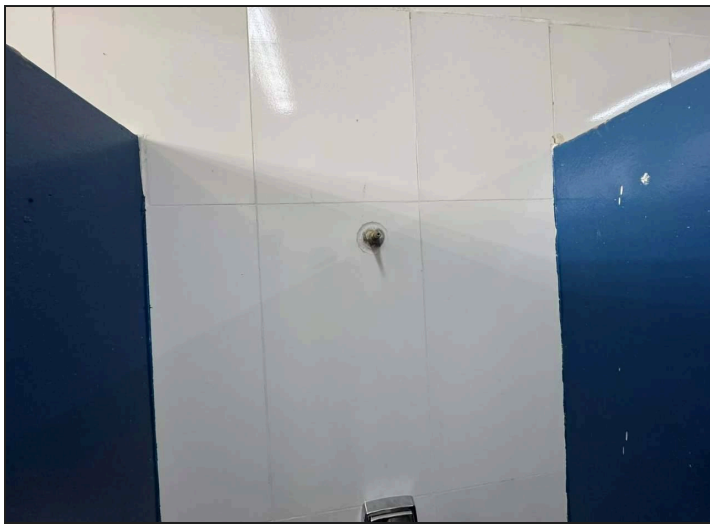


PENDÊNCIA 01

06/10/2026

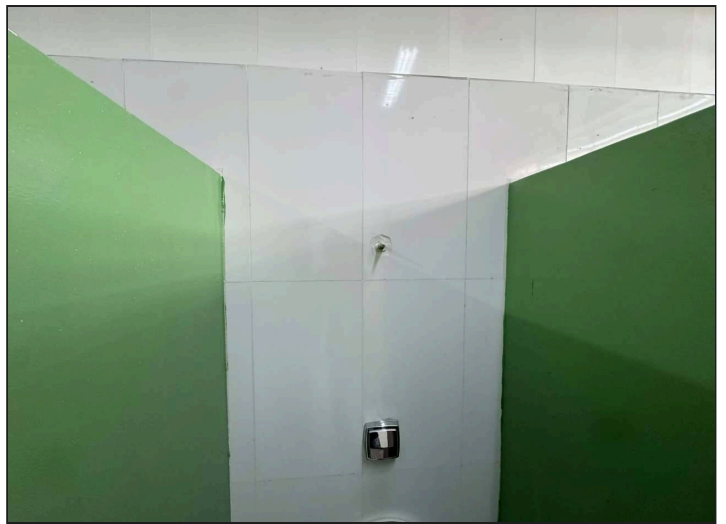


PENDÊNCIA 01

06/10/2026

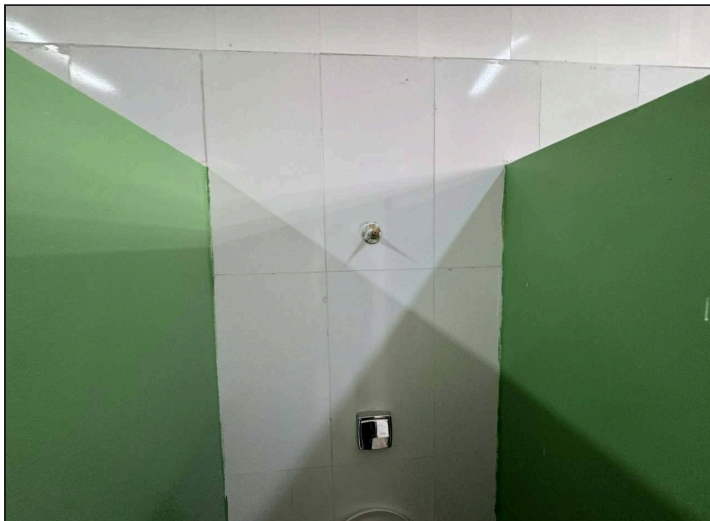


PENDÊNCIA 01

06/10/2026

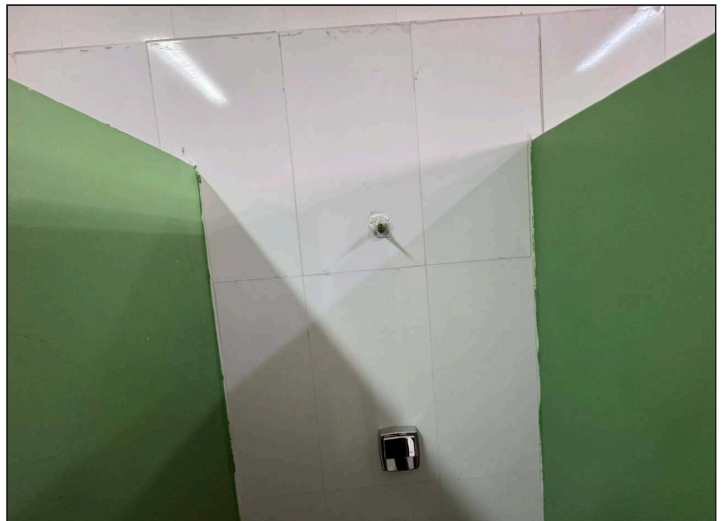


PENDÊNCIA 01

06/10/2026

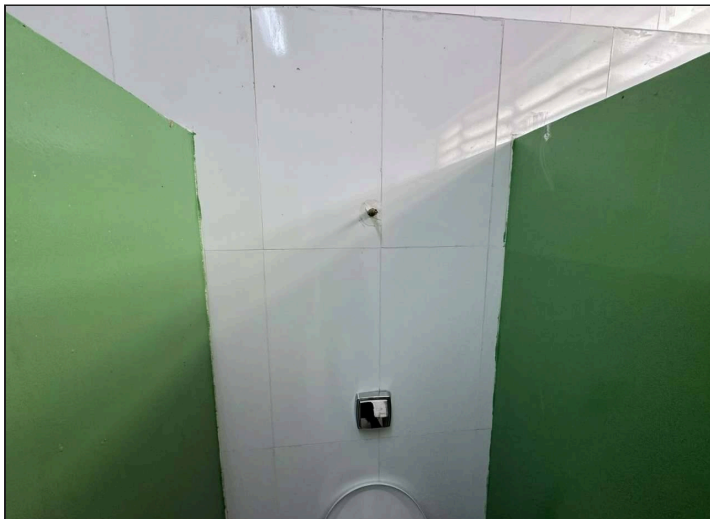


PENDÊNCIA 01

06/10/2026

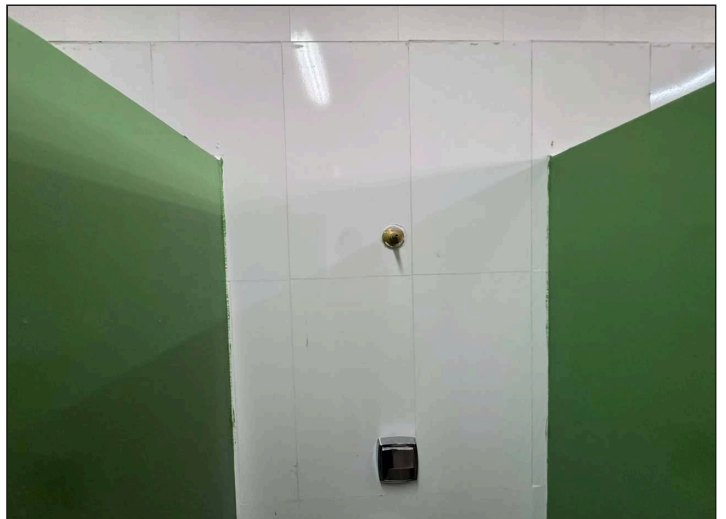


PENDÊNCIA 01

06/10/2026

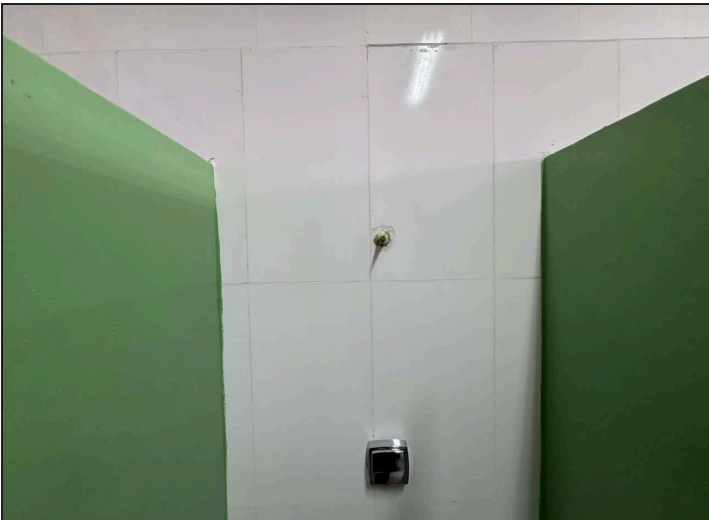

PENDÊNCIA 01

06/10/2026

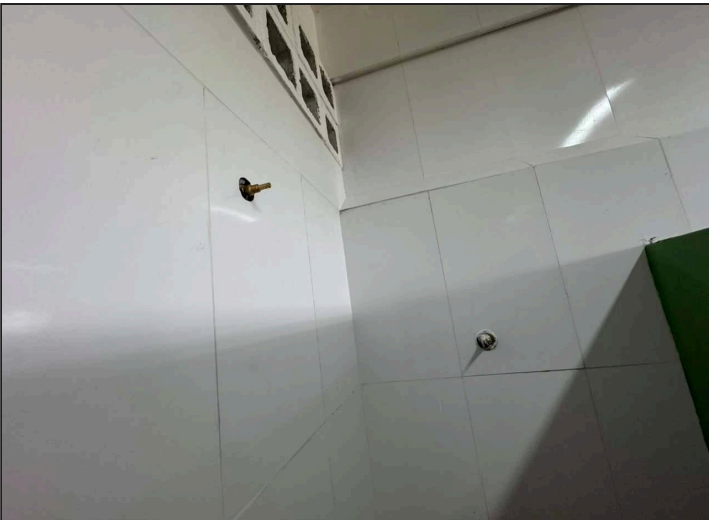

PENDÊNCIA 01

06/10/2026



PENDÊNCIA 02

06/10/2026

LEONARDO Eng. responsável — contratada	ANTONIO CABELO Empreiteiro	VINICIUS Fiscal / FDE
--	--	---
