

ATA FDE CONTRATO ATA.FDE 42.285	RELATÓRIO SEMANAL DE ACOMPANHAMENTO Modelo conforme o Livro de Ocorrências da FDE · documento de acompanhamento da contratada	Semana 41
		05/10/2026 a 09/10/2026
		1 visita(s) registrada(s)
OBRA / UNIDADE DE ENSINO CANDIDO RONDON MARECHAL	CÓDIGO DO PRÉDIO 117101	
LOCAL ITAPEVI	PI (PORTAL) 2026/02302	
ORDEM DE SERVIÇO —	CONTRATO FDE 05/00458/26-001-001	
EMPREITEIRO LEONIZIO	ENG. RESPONSÁVEL / FISCAL FDE LEONARDO / VINICIUS	

RESUMO DA SEMANA

Data	Dia	Efetivo	Tempo	Ritmo	% execução (eng.)
05/10/2026	seg	0	Chuva	Normal	99%

1 visita(s) entre 05/10/2026 e 09/10/2026 1 dia(s) de chuva. Execução: 99%. Previsão de término: .

AVANÇO DA OBRA

Indicador	%	Referência
Aprovado pela FDE (medições aprovadas)	39,4%	M001 a M002 aprovadas
Execução apontada pelo engenheiro	99%	visita de 09/10/2026
Fiscal da FDE — último livro de ocorrências	90%	LO nº 6 de 24/09/2026

SERVIÇOS EXECUTADOS NA SEMANA

- CONCLUSÃO DA OBRA (falta alguns detalhes) - Agendado para entrega com o Fiscal na Quinta-feira
--

MATERIAIS — SITUAÇÃO DOS PEDIDOS EM 06/10/2026

Situação na data de emissão deste relatório (06/10/2026 às 11:19): pedidos do Sienge (01/01/2025 a 05/10/2026, exportação de 05/10/2026 19:13), marcações de entrega do painel e solicitações sem pedido de compra (Sienge, 05/10/2026).

Nenhum pedido mudou de pendente para entregue nesta semana.

3 pedidos no Sienge · 3 entregues · 0 com item pendente, somando R\$ 0,00 a receber.

Nenhum pedido sem entrega confirmada até 06/10/2026.

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES DA SEMANA

Pendências em aberto 01 - Retoque de pintura na janela- (Pátio) 02 - Acabamento (piso de concreto)

REGISTRO FOTOGRÁFICO DA SEMANA




Registro da visita

05/10/2026



Registro da visita

05/10/2026

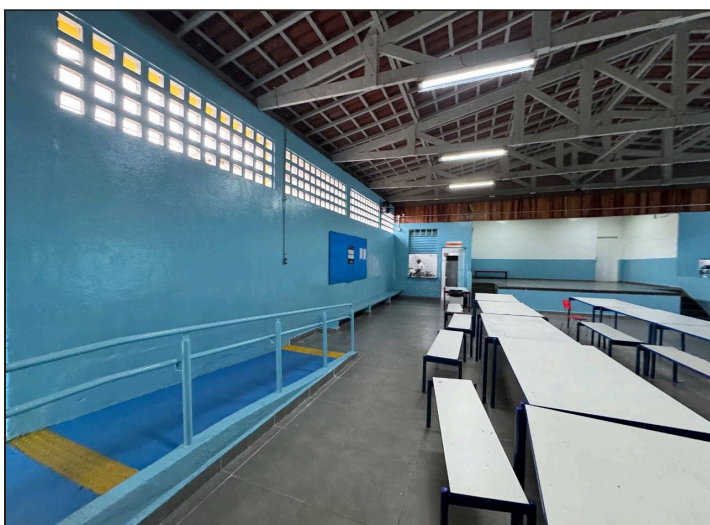

Registro da visita

05/10/2026




Pendência 02

05/10/2026




Registro da visita

05/10/2026

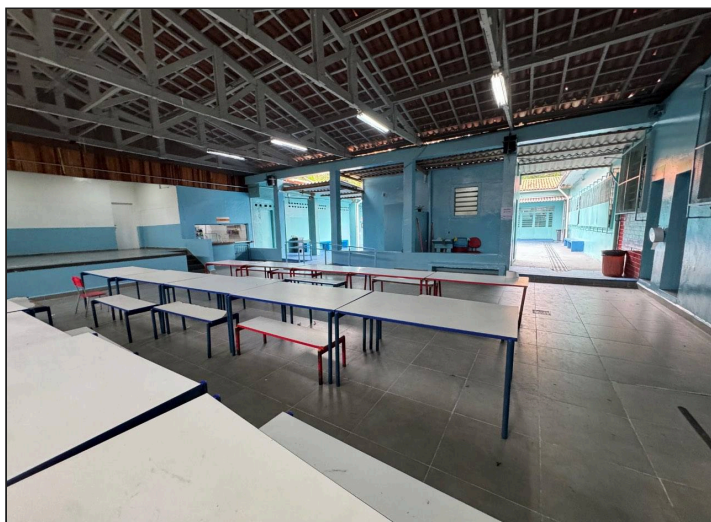

Registro da visita

05/10/2026

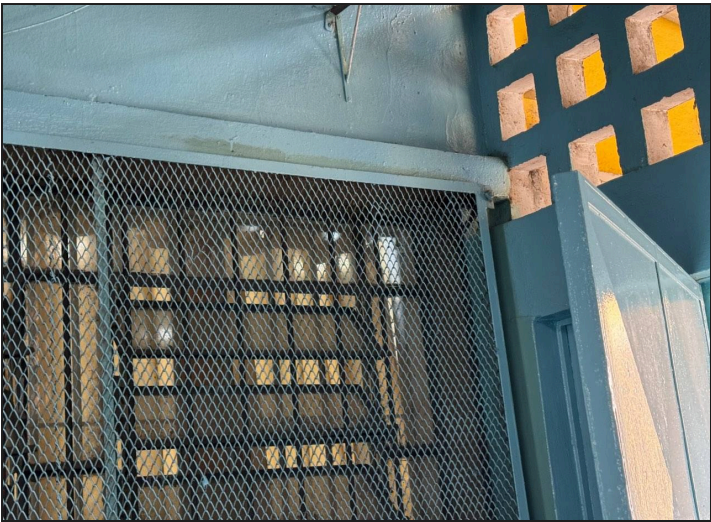

Pendência 01

05/10/2026



Registro da visita

05/10/2026



Registro da visita

05/10/2026

LEONARDO Eng. responsável — contratada	LEONIZIO Empreiteiro	VINICIUS Fiscal / FDE
---	-------------------------	--------------------------
