

ATA FDE CONTRATO ATA.FDE 42.299	RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA Modelo conforme o Livro de Ocorrências da FDE · documento de acompanhamento da contratada	Nº 1
		Data: 05/10/2026
		Visita: 14:37
		Preenchido por: Eng. Leonardo
OBRA / UNIDADE DE ENSINO MYRTHES THEREZINHA ASSAD VILLELA PROFA		CÓDIGO DO PRÉDIO 102114
LOCAL BARUERI		PI (PORTAL) 2026/02143
ORDEM DE SERVIÇO —		CONTRATO FDE 05/01006/26-001-001
EMPREITEIRO REINALDO		ENG. RESPONSÁVEL / FISCAL FDE LEONARDO / VINICIUS

ITENS VERIFICADOS NA VISITA

1. Mão-de-obra / Número de funcionários Qtd. (3)	☒ Suficiente ☐ Insuficiente
2. Material em canteiro	☒ Suficiente ☐ Insuficiente
3. Equipamentos	☒ Suficiente ☐ Insuficiente
4. Tempo	☒ Seco ☐ Chuva
5. Falhas construtivas a serem corrigidas	☐ Sim ☒ Não
6. Placa de obra instalada	☐ Sim ☐ Não ☒ N/A
7. Andamento dos serviços (91) % atual aprovado 33,1% · fiscal FDE 35% (LO 10/09/2026)	☐ Não iniciada ☒ Em execução ☐ Obra paralisada ☐ Obra concluída ☐ Em rescisão
8. Ritmo da obra	☒ Normal ☐ Lento ☐ Parado
9. Organização e limpeza da obra	☒ Boa ☐ Regular ☐ Ruim
10. Previsão de término	—

AVANÇO DA OBRA

Indicador	%	Referência
Aprovado pela FDE (medições aprovadas)	33,1%	M001 a M002 aprovadas
Execução apontada pelo engenheiro	91%	visita de 05/10/2026
Fiscal da FDE — último livro de ocorrências	35%	LO nº 2 de 10/09/2026

SERVIÇOS EXECUTADOS

- FINALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA VALA PARA PASSAGEM DA TUBULAÇÃO DE GÁS

MATERIAIS — PEDIDOS SEM ENTREGA ATÉ 05/10/2026

Nenhum pedido do Sienge vinculado a esta obra.

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES


Observações

- FINALIZAÇÃO DA OBRA, POIS A ENTREGA COM O FISCAL ESTÁ AGENDADA PARA QUINTA-FEIRA

Pendências em aberto


- 01 - EXECUÇÃO DE RAMPA PARA TROCA DE GÁS
- 02 - EXECUÇÃO DE ACABAMENTO NA CASA DE GÁS
- 03 - FINALIZAÇÃO DA CANALETA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

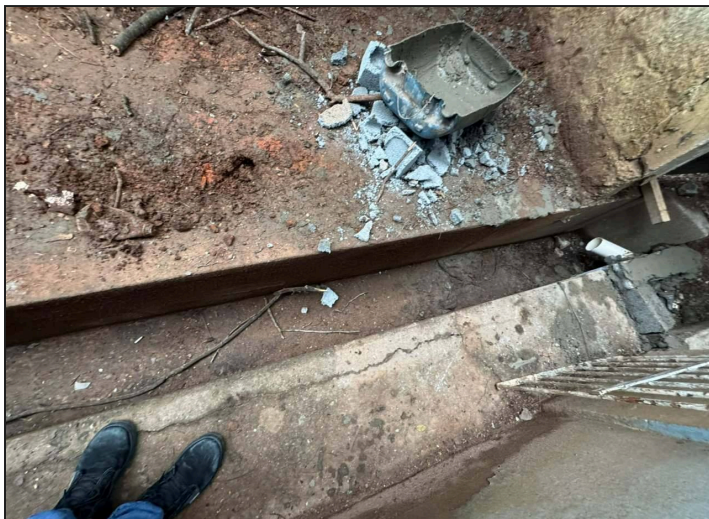

PENDÊNCIA 01

06/10/2026

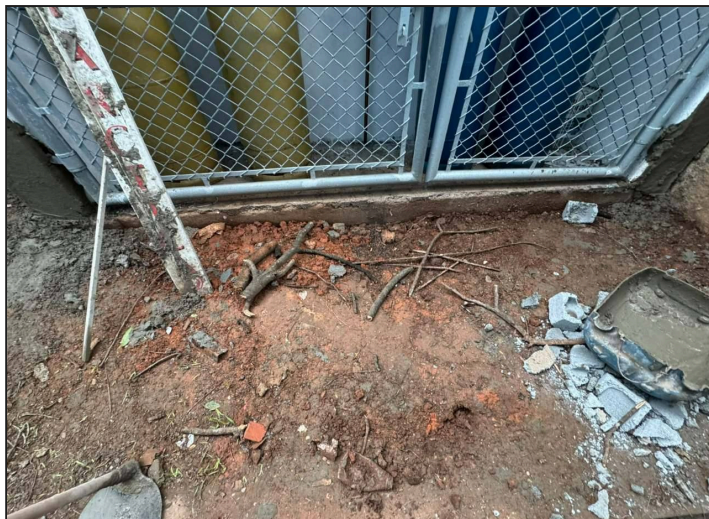


PENDÊNCIA 01

06/10/2026




DEMOLIÇÃO

06/10/2026

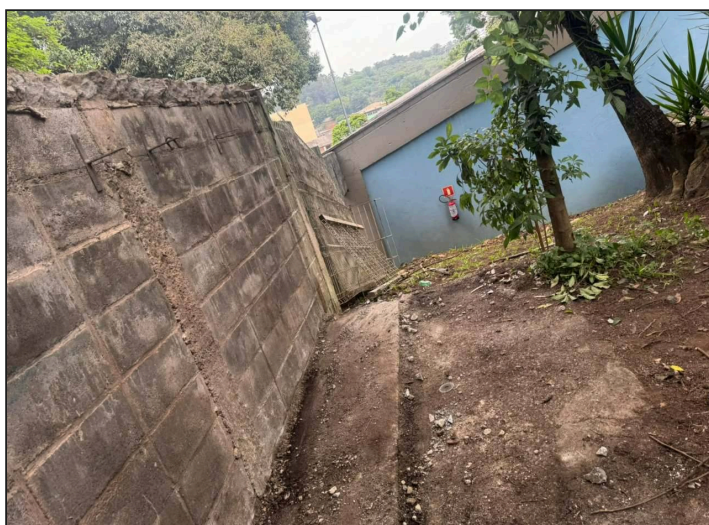

DEMOLIÇÃO

06/10/2026

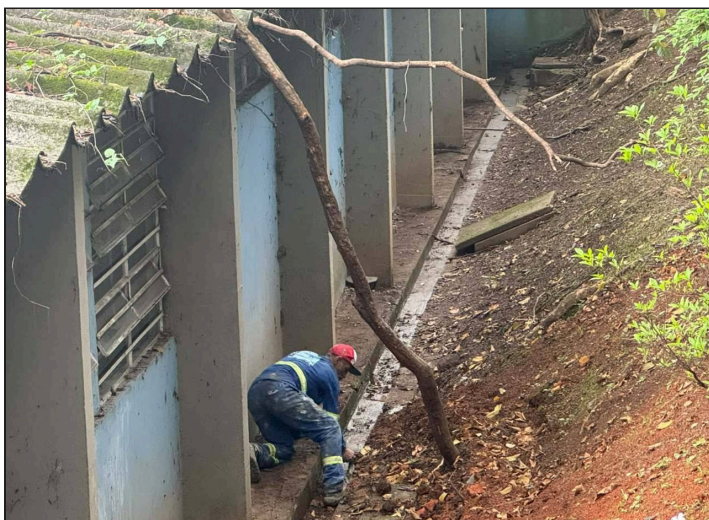

PENDÊNCIA 03

06/10/2026




PENDÊNCIA 03

06/10/2026



TAPUME

06/10/2026

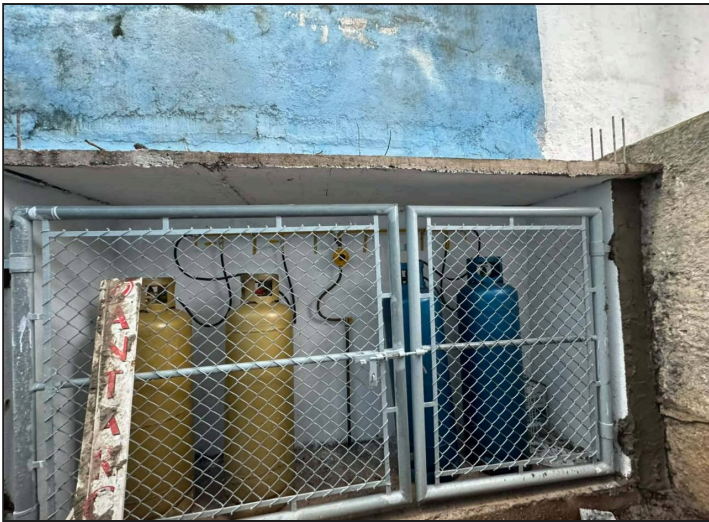

PENDÊNCIA 02

06/10/2026

LEONARDO Eng. responsável — contratada	REINALDO Empreiteiro	VINICIUS Fiscal / FDE
--	--	---
