

ATA FDE CONTRATO ATA.FDE 42.299	RELATÓRIO SEMANAL DE ACOMPANHAMENTO Modelo conforme o Livro de Ocorrências da FDE · documento de acompanhamento da contratada	Semana 41
		05/10/2026 a 09/10/2026
		1 visita(s) registrada(s)
OBRA / UNIDADE DE ENSINO MYRTHES THEREZINHA ASSAD VILLELA PROFA		CÓDIGO DO PRÉDIO 102114
LOCAL BARUERI		PI (PORTAL) 2026/02143
ORDEM DE SERVIÇO —		CONTRATO FDE 05/01006/26-001-001
EMPREITEIRO REINALDO		ENG. RESPONSÁVEL / FISCAL FDE LEONARDO / VINICIUS

RESUMO DA SEMANA

Data	Dia	Efetivo	Tempo	Ritmo	% execução (eng.)
05/10/2026	seg	3	Seco	Normal	91%

1 visita(s) entre 05/10/2026 e 09/10/2026 Execução: 91%. Previsão de término: .

AVANÇO DA OBRA

Indicador	%	Referência
Aprovado pela FDE (medições aprovadas)	33,1%	M001 a M002 aprovadas
Execução apontada pelo engenheiro	91%	visita de 09/10/2026
Fiscal da FDE — último livro de ocorrências	35%	LO nº 2 de 10/09/2026

SERVIÇOS EXECUTADOS NA SEMANA

FINALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA VALA PARA PASSAGEM DA TUBULAÇÃO DE GÁS

MATERIAIS — SITUAÇÃO DOS PEDIDOS EM 06/10/2026

Situação na data de emissão deste relatório (06/10/2026 às 11:18): pedidos do Sienge (01/01/2025 a 05/10/2026, exportação de 05/10/2026 19:13), marcações de entrega do painel e solicitações sem pedido de compra (Sienge, 05/10/2026).


Nenhum pedido mudou de pendente para entregue nesta semana.

Nenhum pedido do Sienge vinculado a esta obra.

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES DA SEMANA


Observações - FINALIZAÇÃO DA OBRA, POIS A ENTREGA COM O FISCAL ESTÁ AGENDADA PARA QUINTA-FEIRA Pendências em aberto 01 - EXECUÇÃO DE RAMPA PARA TROCA DE GÁS 02 - EXECUÇÃO DE ACABAMENTO NA CASA DE GÁS 03 - FINALIZAÇÃO DA CANALETA
--

REGISTRO FOTOGRÁFICO DA SEMANA

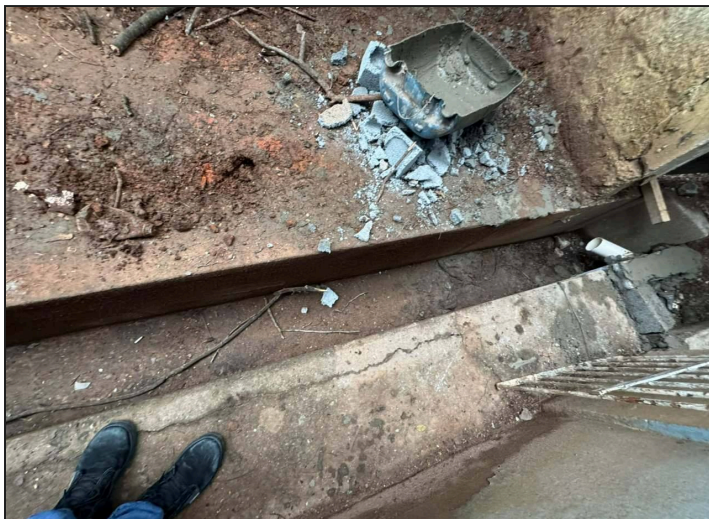

PENDÊNCIA 01

06/10/2026

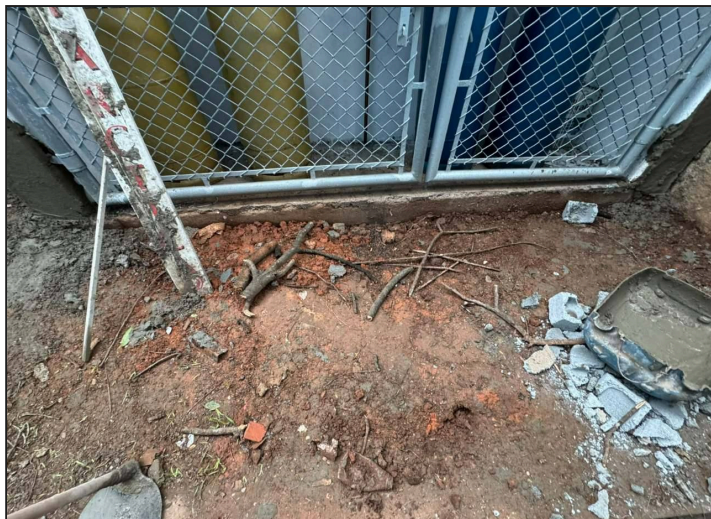

PENDÊNCIA 01

06/10/2026




DEMOLIÇÃO

06/10/2026



DEMOLIÇÃO

06/10/2026

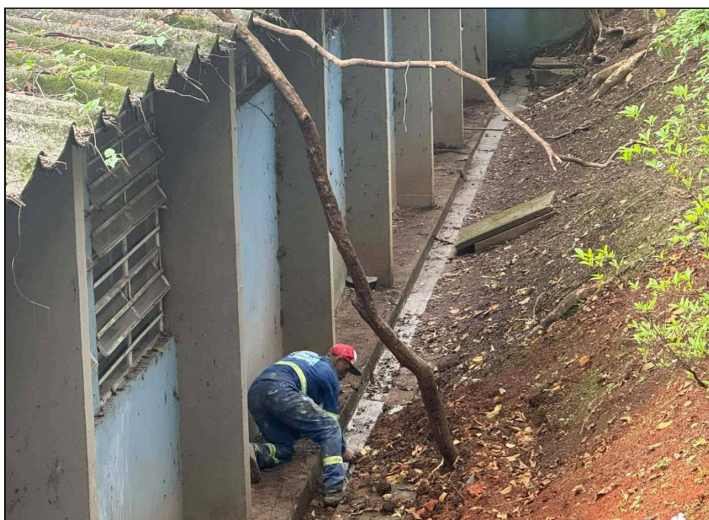

PENDÊNCIA 03

06/10/2026



PENDÊNCIA 03

06/10/2026



TAPUME

06/10/2026



PENDÊNCIA 02

06/10/2026

LEONARDO Eng. responsável — contratada	REINALDO Empreiteiro	VINICIUS Fiscal / FDE
---	-------------------------	--------------------------
