

ATA FDE CONTRATO ATA.FDE 42.276	RELATÓRIO SEMANAL DE ACOMPANHAMENTO Modelo conforme o Livro de Ocorrências da FDE · documento de acompanhamento da contratada	Semana 41
		05/10/2026 a 09/10/2026
		1 visita(s) registrada(s)
OBRA / UNIDADE DE ENSINO REPUBLICA DO EQUADOR		CÓDIGO DO PRÉDIO 102109
LOCAL BARUERI		PI (PORTAL) 2026/00989
ORDEM DE SERVIÇO —		CONTRATO FDE 70/00633/26-001-001
EMPREITEIRO REINALDO		ENG. RESPONSÁVEL / FISCAL FDE LEONARDO / RODRIGO

RESUMO DA SEMANA

Data	Dia	Efetivo	Tempo	Ritmo	% execução (eng.)
06/10/2026	ter	1	Seco	Lento	37%

1 visita(s) entre 05/10/2026 e 09/10/2026 Execução: **37%**. Previsão de término: .

AVANÇO DA OBRA

Indicador	%	Referência
Aprovado pela FDE (medições aprovadas)	17,1%	M001 a M003 aprovadas · M004 em análise fiscal
Execução apontada pelo engenheiro	37%	visita de 09/10/2026
Fiscal da FDE — último livro de ocorrências	25%	LO nº 8 de 22/09/2026

SERVIÇOS EXECUTADOS NA SEMANA

- ASSENTAMENTO DE PORCELANATO - REVISÃO ELÉTRICA - COLOCAÇÃO DE PORTAS
--

MATERIAIS — SITUAÇÃO DOS PEDIDOS EM 07/10/2026

Situação na data de emissão deste relatório (07/10/2026 às 01:43): pedidos do Sienge (01/01/2025 a 07/10/2026, exportação de 07/10/2026 01:40), marcações de entrega do painel e solicitações sem pedido de compra (Sienge, 05/10/2026).

Nenhum pedido mudou de pendente para entregue nesta semana.

15 pedidos no Sienge · 12 entregues · 3 com item pendente, somando **R\$ 11.234,35** a receber.

3 pedido(s) sem entrega confirmada até 07/10/2026 — todos listados abaixo, do mais antigo para o mais novo.

Pedido	Fornecedor	Itens	Valor	Entrega
53527 23/07/2026	LEANDRO GONZALEZ ELETRICA pedido há 76 dias	41940 - CONDULETE 3/4 COM TAMPA — 20 un (<i>pend. 20</i>) 41941 - LUMINÁRIA SOBREPOR LED TUBULAR VIDRO 2X18W (COM LAMPADAS) — 18 un (<i>pend. 18</i>) 10126 - Eletroduto Galvanizado 3/4 — 15 br (<i>pend. 15</i>) 9375 - EX-01 Exaustor axial DN= 40cm — 1 un (<i>pend. 1</i>) 11012 - Tomada 2P + T 20A — 5 un (<i>pend. 5</i>) 17839 - TOMADA 2P+T DE 10A — 5 cj (<i>pend. 5</i>)	R\$ 2.492,35	PARCIAL marcado por Eng. Leonardo · 06/10/2026 01:46
57416 05/10/2026	ATACADAO DAS MADEIRAS LTDA pedido há 2 dias	44607 - PORTA DE BANHEIRO DE MADEIRA, BOX, 62CM X 1,50M, COM FECHADURA INDICADORA — 14 un	R\$ 5.740,00	PENDENTE falta R\$ 5.740,00

Pedido	Fornecedor	Itens	Valor	Entrega
57492 06/10/2026	EVERSON CARLOS NOGUEIRA DE SOUZA 34422490826 pedido há 1 dias	45121 - FERRO U 4" 6M — 19 br	R\$ 3.002,00	PENDENTE falta R\$ 3.002,00

Solicitações sem pedido de compra (4) — ≈ R\$ 1.500,00 estimado pelos pedidos do Sienge

Solicitação	Finalidade	Itens ainda sem pedido	Entrega
29607 13/07/2026	FINALIDADE: PCI solicitado há 86 dias	AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" — 5 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
30908 01/09/2026	FINALIDADE: ELÉTRICA solicitado há 36 dias	CABO PP 2,00 X 2,00 X 2,5 — 100 m · ≈ R\$ 1.500,00 ≈ R\$ 1.500,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
31153 11/09/2026	FINALIDADE: COZINHA *IMAGEM EM ANEXO* *ITENS CONFORME ANEXO* solicitado há 26 dias	CC -01 VÁLVULA DE PIA — 1 un CC-03 — 1 un CC-04 — 1 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
31480 25/09/2026	FINALIDADE: COZINHA *SUPORTE METÁLICO (45 X 20 CM) EM PERFIL TREFILADO "T" (1 ¼" X 1 ¼" X 1/8")* solicitado há 12 dias	SUPORTE METÁLICO PR-09 20X45 — 45 un Parafusos galvanizados e buchas de nylon (S8) — 180 un PR-09 PRATELEIRA DE 3,45 X 0,60 — 6 un PR-09 PRATELEIRA DE 2,35 M X 0,60 M — 6 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES DA SEMANA	
Recomendações à contratada - APÓS A REGULARIZAÇÃO, ENVIAR FOTOS NO GRUPO PARA REGISTRO Pendências em aberto 01 - AUMENTAR O EFETIVO NA OBRA, CONFORME ACORDADO COM O EMPREITEIRO 02 - INÍCIO DA DEMOLIÇÃO DO MURO DE DIVISA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DA SEMANA



PENDÊNCIA 01

06/10/2026



PENDÊNCIA 01

06/10/2026



PENDÊNCIA 01

06/10/2026



PENDÊNCIA 02 E 01

06/10/2026




PENDÊNCIA 01

06/10/2026




PENDÊNCIA 01

06/10/2026

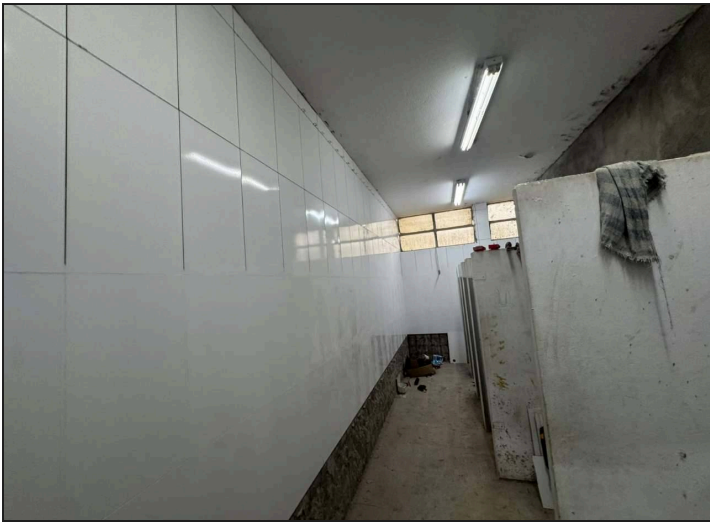


PENDÊNCIA 01

06/10/2026

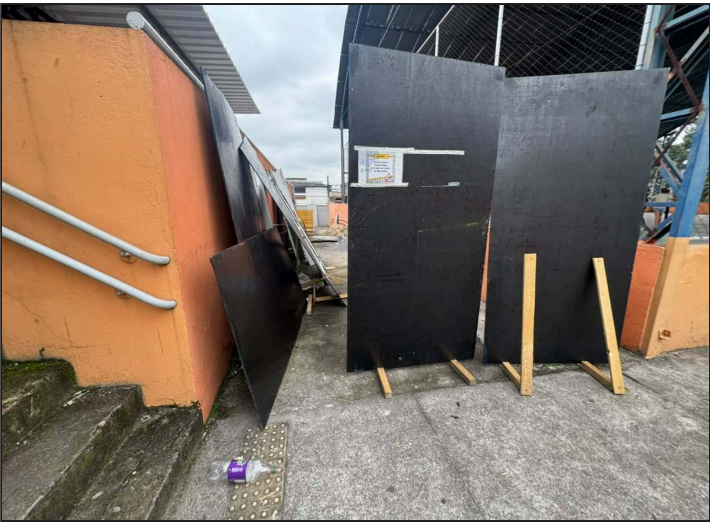

PENDÊNCIA 02 E 01

06/10/2026

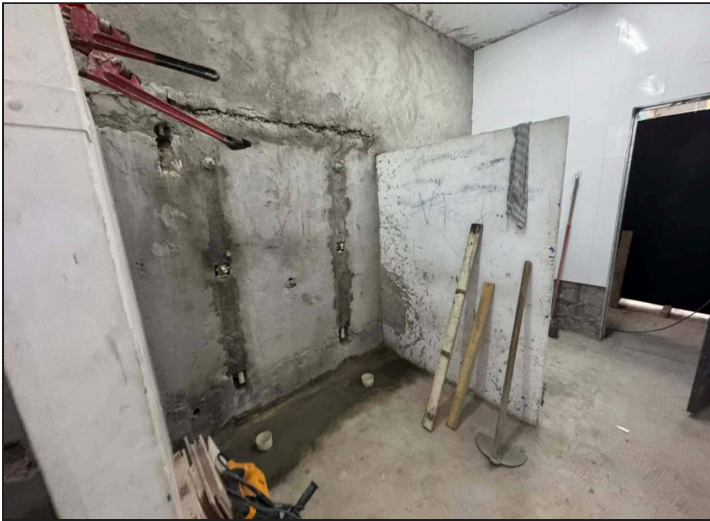

PENDÊNCIA 01

06/10/2026



PENDÊNCIA 01

06/10/2026

LEONARDO Eng. responsável — contratada	REINALDO Empreiteiro	RODRIGO Fiscal / FDE
--	--	--
