

ATA FDE CONTRATO ATA.FDE 41.301	RELATÓRIO SEMANAL DE ACOMPANHAMENTO Modelo conforme o Livro de Ocorrências da FDE · documento de acompanhamento da contratada	Semana 41
		05/10/2026 a 09/10/2026
		1 visita(s) registrada(s)
OBRA / UNIDADE DE ENSINO EE EDUARDO VAZ	CÓDIGO DO PRÉDIO 109111	
LOCAL EMBU DAS ARTES	PI (PORTAL) 2026/02482	
ORDEM DE SERVIÇO —	CONTRATO FDE 05/00853/26-001-001	
EMPREITEIRO ANTONIO CABELO	ENG. RESPONSÁVEL / FISCAL FDE Douglas / FABIO	

RESUMO DA SEMANA

Data	Dia	Efetivo	Tempo	Ritmo	% execução (eng.)
05/10/2026	seg	1	Seco	Parado	5%

1 visita(s) entre 05/10/2026 e 09/10/2026 Execução: 5%. Previsão de término: .

AVANÇO DA OBRA

Indicador	%	Referência
Aprovado pela FDE (medições aprovadas)	0%	M001 aprovada · M002 em análise scm
Execução apontada pelo engenheiro	5%	visita de 09/10/2026
Fiscal da FDE — último livro de ocorrências	10%	LO nº 5 de 29/09/2026

SERVIÇOS EXECUTADOS NA SEMANA

- Serviços parados - Efetivo tinha apenas uma funcionários organizando e limpando

MATERIAIS — SITUAÇÃO DOS PEDIDOS EM 07/10/2026

Situação na data de emissão deste relatório (07/10/2026 às 01:46): pedidos do Sienge (01/01/2025 a 07/10/2026, exportação de 07/10/2026 01:40), marcações de entrega do painel e solicitações sem pedido de compra (Sienge, 05/10/2026).

Entregue durante a semana: pedido 57396 (ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA).

7 pedidos no Sienge · 6 entregues · 1 com item pendente, somando R\$ 5.000,00 a receber.

1 pedido(s) sem entrega confirmada até 07/10/2026 — todos listados abaixo, do mais antigo para o mais novo.

Pedido	Fornecedor	Itens	Valor	Entrega
57366 02/10/2026	CONSTRUTORA MOURA E MORAES LTDA pedido há 5 dias	12440 - MAO DE OBRA — 1 un	R\$ 5.000,00	PENDENTE falta R\$ 5.000,00

Solicitações sem pedido de compra (17) — ≈ R\$ 45.953,13 estimado pelos pedidos do Sienge

Solicitação	Finalidade	Itens ainda sem pedido	Entrega
30280 07/08/2026	FINALIDADE: LABORATÓRIO DE FARMACIA *ORÇAMENTO EM ANEXO* solicitado há 61 dias	CIMENTO — 20 sc · R\$ 838,00 Areia fina — 3 m³ · R\$ 728,46 Pincel 1" — 2 un · R\$ 15,80 PINCEL 2" — 2 un · R\$ 15,50 Aguarrás 5l — 3 gl · R\$ 255,00 Cabo flex 4mm² preto — 200 m · R\$ 870,00 CONDULETES 3/4 — 50 un · R\$ 495,00 UNIDUTE CÔNICO 3/4 — 100 un · R\$ 336,00 UNIDUTE RETO 3/4" — 50 un · R\$ 199,00 UNIDUTE CÔNICO 1" — 10 un · R\$ 46,90 ≈ R\$ 11.332,15 estimado ... e mais 19 itens	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
30285 07/08/2026	FINALIDADE: LABORATÓRIO FARMACIA - CUBAS E ACESSIBILIDADE *IMAGEM EM ANEXO* solicitado há 61 dias	CUBA SIMPLES ACO INOX 304 CH.20 500X400X250MM — 4 un · R\$ 2.236,20 BR-11 BARRA DE APOIO COM FIXAÇÃO LATERAL LAVATORIO COLETIVO — 1 un · R\$ 330,45 ≈ R\$ 2.566,65 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
30286 07/08/2026	FINALIDADE: LABORATÓRIO FARMACIA - INSUMO PARA PISO VINILICO *IMAGEM EM ANEXO* *AGUARDAR AUTORIZACAO DE COMPRA* solicitado há 61 dias	COLA PARA PISO VINILICO 18KG — 1 un · R\$ 535,30 COLA PARA PISO VINILICO 4KG — 1 un · R\$ 198,72 AUTONIVELANTE 20KG — 8 un · R\$ 891,52 ≈ R\$ 1.625,54 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
30287 07/08/2026	FINALIDADE: LABORATÓRIO FARMACIA - PISO VINILICO *IMAGEM EM ANEXO* solicitado há 61 dias	RODAPÉ CURVO 5CM — 36 m · R\$ 215,64 MANTA VINILICA L= 2,00M E=2MM — 80 m² · R\$ 11.559,20 ≈ R\$ 11.774,84 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
30288 07/08/2026	FINALIDADE: LABORATÓRIO FARMACIA *IMAGEM EM ANEXO* solicitado há 61 dias	Extintor manual de PÓ QUIMICO SECO capacidade 12Kg — 1 un · R\$ 265,00 ≈ R\$ 265,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
30289 07/08/2026	FINALIDADE: LABORATÓRIO FARMACIA - ESQUADRIA DE ALUMINIO *IMAGEM EM ANEXO* solicitado há 61 dias	CAIXILHO DE ALUMINIO FIXO BRANCO 60X60CM — 4 un · R\$ 1.160,00 ≈ R\$ 1.160,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
30290 07/08/2026	FINALIDADE: LABORATÓRIO FARMACIA - METAIS E ACESSÓRIOS *IMAGEM EM ANEXO* solicitado há 61 dias	SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1 1/2X2" — 4 un · R\$ 613,76 TORNEIRA MEC/CER 1/4 VOLTA TIPO MESA CROMADO 1/2" — 4 un · R\$ 757,04 VALVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2" — 4 un · R\$ 80,48 CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE CERÂMICA ESMALTADA IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA — 2 un · R\$ 187,66 TORNEIRA DE ACIONAMENTO MANUAL E CICLO DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO, EIXO DE ENTRADA D'ÁGUA NA VERTICAL (MESA) — 2 un · R\$ 369,72 SIFÃO TIPO COPO D= 1" X 1 ½" — 2 un · R\$ 233,60 VÁLVULA DE ESCOAMENTO - D = 1" — 2 un · R\$ 68,64 ≈ R\$ 2.310,90 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
30291 07/08/2026	FINALIDADE: LABORATÓRIO FARMACIA solicitado há 61 dias	ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO TIPO AC-I — 25 sc · R\$ 417,50 ARGAMASSA PRE FABRICADA PARA REJUNTAMENTO — 10 kg · R\$ 100,70 AZULEJO RETIFICADO LISO BRANCO BRILHANTE — 60 m² · R\$ 3.102,60 ≈ R\$ 3.620,80 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
30292 07/08/2026	FINALIDADE: LABORATÓRIO FARMACIA solicitado há 61 dias	BLOCO DE CONCRETO TIPO CANALETA 14X19X39 — 30 un · R\$ 130,50 BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM - 6MPa — 80 un · ≈ R\$ 357,60 MEIO BLOCO DE CONCRETO 14X19X19 - 6MPa — 80 un · ≈ R\$ 239,20 ≈ R\$ 727,30 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra

Solicitação	Finalidade	Itens ainda sem pedido	Entrega
30293 07/08/2026	FINALIDADE: LABORATÓRIO FARMACIA solicitado há 61 dias	ESPELHO DE 6MM DE ESPESSURA, LAPIDADO E ADESIVADO AO SUBSTRATO 1,35X0,75M — 1 un · R\$ 690,00 ≈ R\$ 690,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
30294 07/08/2026	FINALIDADE: LABORATÓRIO FARMACIA solicitado há 61 dias	Cuba de embutir, oval, de cerâmica esmaltada impermeável, na cor branca — 2 un · R\$ 187,66 TORNEIRA DE ACIONAMENTO MANUAL E CICLO DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO, EIXO DE ENTRADA D'ÁGUA NA VERTICAL (MESA) — 2 un · R\$ 329,08 SIFÃO TIPO COPO D= 1" X 1 ½" — 2 un · R\$ 233,60 VÁLVULA DE ESCOAMENTO - D = 1" — 2 un · R\$ 68,64 ≈ R\$ 818,98 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
30296 07/08/2026	FINALIDADE: LABORATÓRIO FARMACIA solicitado há 61 dias	BE-14 — 1 un BE-12 — 4 un BE-17 — 4 un BE-15 — 17 m LT-07 COMPLETO — 1,35 m	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
30297 07/08/2026	FINALIDADE: LABORATÓRIO FARMACIA solicitado há 61 dias	CANTONEIRA DE ALUMINIO BRANCA — 6 br	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
30932 02/09/2026	FINALIDADE: ELÉTRICA LABORATORIO *ARQUIVO EM ANEXO* solicitado há 35 dias	Areia fina — 3 m³ · R\$ 728,46 Cimento 50kg — 20 sc · R\$ 778,00 Pincel 1" — 2 un · R\$ 15,80 PINCEL 2" — 2 un · R\$ 15,50 Rolo 23cm — 2 un · R\$ 66,82 Aguarrás 5l — 3 gl · R\$ 255,00 Fita crepe 2" — 2 rol · R\$ 20,48 Fita crepe 1" — 2 rol · ≈ R\$ 18,00 LUMINARIA — 12 un · R\$ 1.076,04 TINTA LATEX BRANCA 18L — 1 lt · R\$ 335,00 ≈ R\$ 7.159,24 estimado ... e mais 5 itens	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
30943 02/09/2026	FINALIDADE: LABORATÓRIO solicitado há 35 dias	CAÇAMBA — 1 un · R\$ 480,00 ≈ R\$ 480,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
30945 02/09/2026	FINALIDADE: ISOLAMENTO DE ÁREA PARA INICIAR TELHADO solicitado há 35 dias	PREGO 18X27 — 2 kg · R\$ 40,00 Sarrafo 5cm C=3,00m — 20 pç · R\$ 140,00 Prego 15x15 — 1 kg · R\$ 20,00 Sarrafo 10cm — 30 pc · R\$ 648,00 MADEIRIT ROSA 22MM — 30 un PONTALETE QUADRADO — 20 un ≈ R\$ 848,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
31397 23/09/2026	FINALIDADE: FINALIZAR CONTRAPISO/BANCADA E REBOCO solicitado há 14 dias	CIMENTO — 5 sc · R\$ 209,50 Areia fina — 0,50 m³ · R\$ 121,41 Areia grossa — 1 m³ · R\$ 242,82 ≈ R\$ 573,73 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES DA SEMANA

Pendências em aberto

- Aguardando entrega de material já comprado - elétrico e hidráulico

REGISTRO FOTOGRÁFICO DA SEMANA



Entregue apenas luminária da elétrica

05/10/2026



Demolição de revestimento

05/10/2026




Portas de ferro entregue

05/10/2026



Demolição e contrapiso parado

05/10/2026

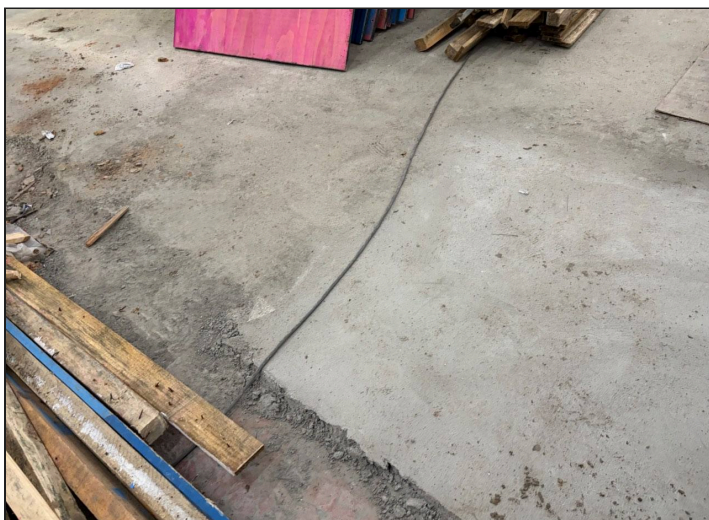

Contrapiso parado

05/10/2026



Porta de acesso mas sem identificação da obra

05/10/2026



Demolição e piso parada

05/10/2026



Desorganização na obra

05/10/2026

_____ LUIS JÚNIOR Eng. responsável — contratada	_____ ANTONIO CABELO Empreiteiro	_____ FABIO Fiscal / FDE
--	---	---
