

ATA FDE CONTRATO ATA.FDE 42.222	RELATÓRIO SEMANAL DE ACOMPANHAMENTO Modelo conforme o Livro de Ocorrências da FDE · documento de acompanhamento da contratada	Semana 41
		05/10/2026 a 09/10/2026
		1 visita(s) registrada(s)
OBRA / UNIDADE DE ENSINO ETEC Doutor Celso Giglio		CÓDIGO DO PRÉDIO 1200297
LOCAL OSASCO		PI (PORTAL) 2026/00561
ORDEM DE SERVIÇO —		CONTRATO FDE 70/00495/26-001-001
EMPREITEIRO RAFAEL		ENG. RESPONSÁVEL / FISCAL FDE Luis / GUILHERME

RESUMO DA SEMANA

Data	Dia	Efetivo	Tempo	Ritmo	% execução (eng.)
07/10/2026	qua	3	Seco	Normal	35%

1 visita(s) entre 05/10/2026 e 09/10/2026 Execução: 35%. Previsão de término: .

AVANÇO DA OBRA

Indicador	%	Referência
Aprovado pela FDE (medições aprovadas)	20,7%	M001 a M004 aprovadas · M005 em edição fiscal
Execução apontada pelo engenheiro	35%	visita de 09/10/2026
Fiscal da FDE — último livro de ocorrências	23%	LO nº 11 de 21/09/2026

SERVIÇOS EXECUTADOS NA SEMANA

Pintura laboratório de informática e circulacao

MATERIAIS — SITUAÇÃO DOS PEDIDOS EM 08/10/2026

Situação na data de emissão deste relatório (08/10/2026 às 01:24): pedidos do Sienge (01/01/2025 a 07/10/2026, exportação de 07/10/2026 23:23), marcações de entrega do painel e solicitações sem pedido de compra.

Nenhum pedido mudou de pendente para entregue nesta semana.

4 pedidos no Sienge · 4 entregues · 0 com item pendente, somando R\$ 0,00 a receber.

Nenhum pedido sem entrega confirmada até 08/10/2026.

Solicitações sem pedido de compra (1) — ≈ R\$ 580,00 estimado pelos pedidos do Sienge

Solicitação	Finalidade	Itens ainda sem pedido	Entrega
28954 09/06/2026	FINALIDADE: PINTURA INTERNA DA ETEC solicitado há 121 dias	TINTA LATEX TANGERINA 18L — 2 un · R\$ 580,00 ≈ R\$ 580,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES DA SEMANA

Pendências em aberto Uso de EPI e isolamento dos locais de trabalho
--

REGISTRO FOTOGRÁFICO DA SEMANA




Isolamento equipamentos

07/10/2026




Pintura área administrativa

07/10/2026

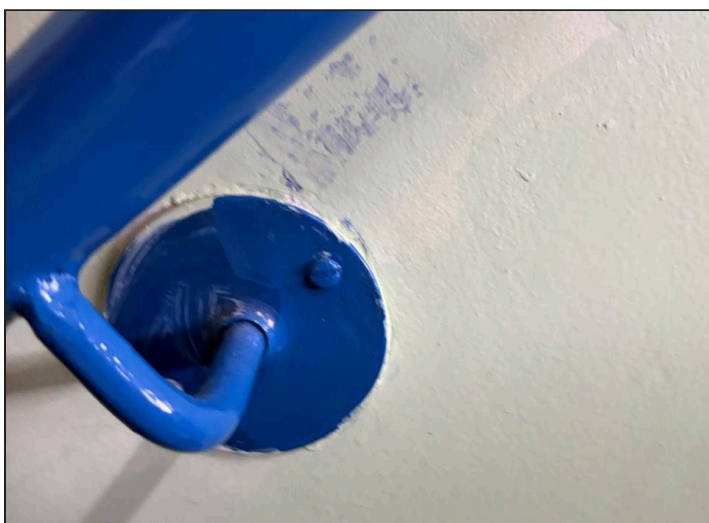

Pintura a ser corrigida, escada administrativa

07/10/2026

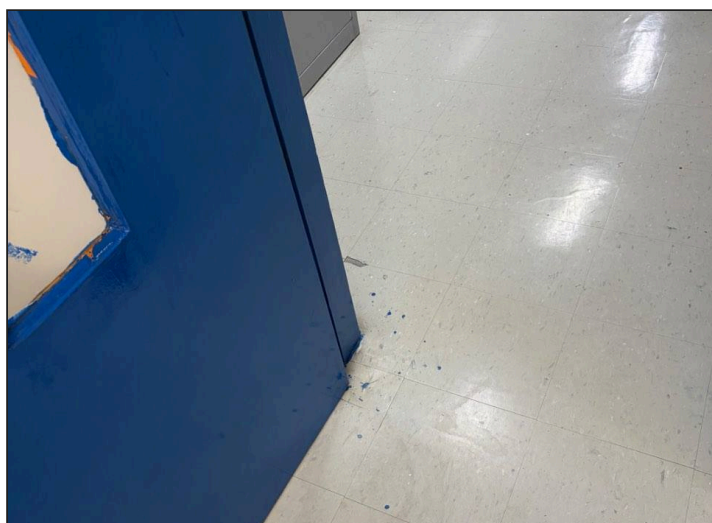

Respingo pintura piso, confirmar se equipe da obra executou

07/10/2026




Registro da visita

07/10/2026



Aguardando definição piso vinílico

07/10/2026

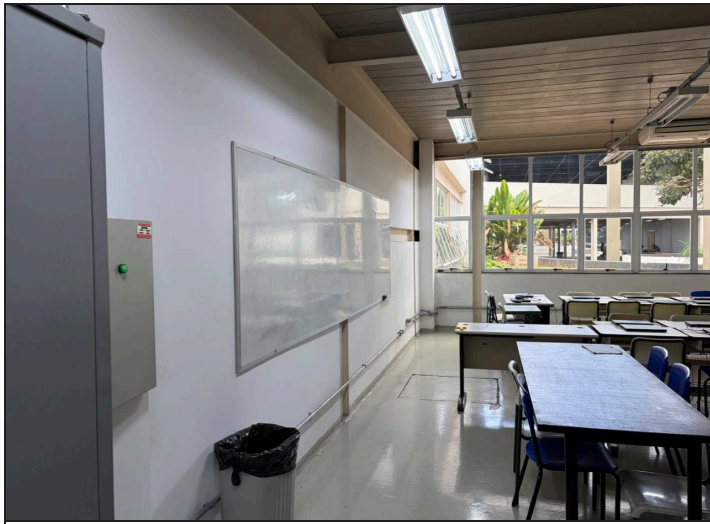

Pintura laboratorio

07/10/2026



Pintura laboratorio

07/10/2026

_____ LUIS JÚNIOR Eng. responsável — contratada	_____ RAFAEL Empreiteiro	_____ GUILHERME Fiscal / FDE
--	---	---
