

ATA FDE CONTRATO ATA.FDE 42.228	RELATÓRIO SEMANAL DE ACOMPANHAMENTO Modelo conforme o Livro de Ocorrências da FDE · documento de acompanhamento da contratada	Semana 41
		05/10/2026 a 09/10/2026
		1 visita(s) registrada(s)
OBRA / UNIDADE DE ENSINO NERCY AMELIA MARTELINI DAHER PROFESSORA		CÓDIGO DO PRÉDIO 125102
LOCAL PIRAPORA DO BOM JESUS		PI (PORTAL) 2023/02722
ORDEM DE SERVIÇO —		CONTRATO FDE 70/00313/26-001-001
EMPREITEIRO ARAUJO		ENG. RESPONSÁVEL / FISCAL FDE LEONARDO / RODRIGO

RESUMO DA SEMANA

Data	Dia	Efetivo	Tempo	Ritmo	% execução (eng.)
05/10/2026	seg	5	Seco	Normal	79%

1 visita(s) entre 05/10/2026 e 09/10/2026 Execução: 79%. Previsão de término: 29/01/2027.

AVANÇO DA OBRA

Indicador	%	Referência
Aprovado pela FDE (medições aprovadas)	65%	M001 a M004 aprovadas · M005 em análise fiscal
Execução apontada pelo engenheiro	79%	visita de 09/10/2026
Fiscal da FDE — último livro de ocorrências	58%	LO nº 14 de 28/09/2026

SERVIÇOS EXECUTADOS NA SEMANA

- EXECUÇÃO DE MURO - EXECUÇÃO DE PINTURA EM ESTRUTURA METÁLICA - EXECUÇÃO DE FORRO DE GESSO NA SALA DE LEITURA
--

MATERIAIS — SITUAÇÃO DOS PEDIDOS EM 08/10/2026

Situação na data de emissão deste relatório (08/10/2026 às 01:24): pedidos do Sienge (01/01/2025 a 07/10/2026, exportação de 07/10/2026 23:23), marcações de entrega do painel e solicitações sem pedido de compra.

Nenhum pedido mudou de pendente para entregue nesta semana.

20 pedidos no Sienge · 20 entregues · 0 com item pendente, somando R\$ 0,00 a receber.

Nenhum pedido sem entrega confirmada até 08/10/2026.

Solicitações sem pedido de compra (6) — ≈ R\$ 25.455,26 estimado pelos pedidos do Sienge

Solicitação	Finalidade	Itens ainda sem pedido	Entrega
28391 15/05/2026	FINALIDADE: MURO DE DIVISA solicitado há 146 dias	CIMALHA (PINGADEIRA) PRÉ MOLDADA — 75 m · R\$ 2.950,50 ≈ R\$ 2.950,50 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra

Solicitação	Finalidade	Itens ainda sem pedido	Entrega
28483 19/05/2026	FINALIDADE: QE-02 E QE-03 * DE 2KIT COMPLETO DA BASQUETE* *Tabela em chapa de compensado com colagem fenólica, e=20mm e requadro com perfil metálico galvanizado $\frac{1}{2}$ "x $\frac{1}{8}$ " ou $\frac{1}{4}$ "x $\frac{1}{8}$ " Aro com diâmetro interno de 450mm em barra redonda galvanizada de 16mm< $\varnothing$ <20mm; Rede em malha de nylon presa ao aro em 12 pontos, com- primento entre 400 a 450mm; Suporte em chapa de aço galvanizado, e=3/16" solicitado há 142 dias	QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL — 1 un · R\$ 1.440,00 QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO — 2 un · R\$ 2.357,00 Treliça Cantoneiras de abas iguais $\frac{1}{2}$ "x $\frac{1}{8}$ " em aço ASTM A-36: 1 1/2"x1/8" (38x3,2mm) — 1 un · ≈ R\$ 2.125,00 Treliça Cantoneiras de abas iguais $\frac{1}{4}$ "x $\frac{1}{8}$ " em aço ASTM A-36: 1 1/4"x1/8" (32x3,2mm) — 1 un · ≈ R\$ 2.125,00 Treliça Cantoneiras de abas iguais "L" em aço ASTM A-36 1/2"x3/8" (64x9,5mm) — 2 un · ≈ R\$ 4.250,00 Tabela/Cesto: Tabela em chapa de compensado com colagem fenólica, e=20mm e requadro com perfil metálico galvanizado $\frac{1}{2}$ "x $\frac{1}{8}$ " ou $\frac{1}{4}$ "x $\frac{1}{8}$ " Aro com diâmetro interno de 450mm em barra redonda galvanizada de 16mm< $\varnothing$ <20mm; Rede em malha de nylon presa ao aro em 12 pontos, com- primento entre 400 a 450mm; — 2 un Suporte em chapa de aço galvanizado, e=3/16" — 1 un ≈ R\$ 12.297,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28607 22/05/2026	FINALIDADE: WC ALUNOS LT- 06 solicitado há 139 dias	Torneira de acionamento manual e com ciclo de fechamento automático, com desenho projetado para instalação reforçada e proteção contra o vandalismo, conforme ficha H6.14 — 8 un · R\$ 7.758,80 VÁLVULA DE ESCOAMENTO - $\varnothing$ =1 — 8 un · ≈ R\$ 274,56 SIFÃO TIPO COPO - $\varnothing$ =1"X 1 1/2" — 8 un · R\$ 934,40 ≈ R\$ 8.967,76 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28610 22/05/2026	FINALIDADE: WC ALUNOS solicitado há 139 dias	Espelho EP-01 — 8 un · R\$ 1.240,00 ≈ R\$ 1.240,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28624 25/05/2026	FINALIDADE: ESTRUTURAS DE AÇO (FERRAGEM TELHADO) solicitado há 136 dias	CALHA COM ABA 5X8X15 — 195 m SUPORTE U PARA CALHA BEIRAL TIPO 5X8X15 — 195 un BOCAL SAIDA P/CALHA COCHO 100MM GALV. — 8 un PRIMER ANTICORROSIVO (GALV. A FRIO) 3,6L — 10 gl	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
29583 13/07/2026	FINALIDADE: FORMA QE-37 solicitado há 87 dias	FORMA DE PAPELAO D=30CM ALT=4,0M — 2 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES DA SEMANA

Recomendações à contratada

- INÍCIO DA EXECUÇÃO DE TELA DA QUADRA POLIESPORTIVA
- APÓS A REGULARIZAÇÃO, ENVIAR FOTOS NO GRUPO PARA REGISTRO

Pendências em aberto

- 01 - VERIFICAR COM O ENCANADOR O PRAZO NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, A FIM DE PROGRAMAR A INTERVENÇÃO NO RESERVATÓRIO DURANTE O FERIADO
- 02 - PRIORIZAR E INTENSIFICAR A EXECUÇÃO DO MURO
- 03 - VERIFICAR E REGULARIZAR O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS MICTÓRIOS
- 04 - VERIFICAR E REGULARIZAR AS HIDRAS QUE NÃO ESTÃO FUNCIONANDO
- 05 - TORNEIRAS ANTIVANDALISMO COM AVARIAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO DA SEMANA



PENDÊNCIA 02

06/10/2026



SEM LIGAÇÃO

06/10/2026




PENDÊNCIA 02

06/10/2026




PENDÊNCIA 01

06/10/2026

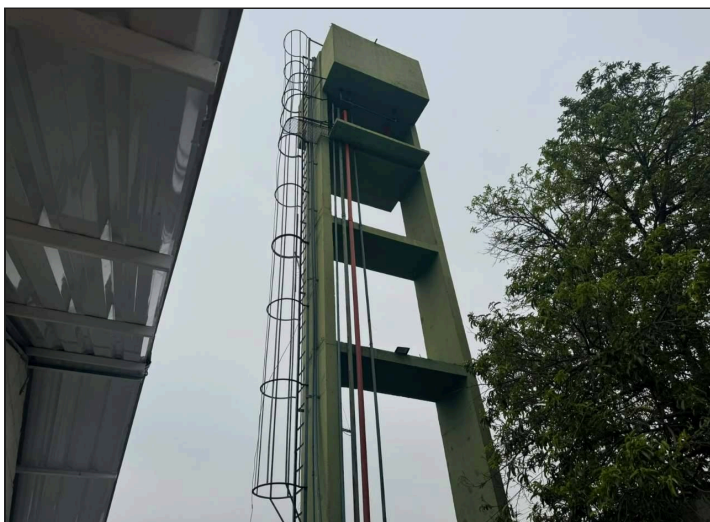

PENDÊNCIA 01

06/10/2026

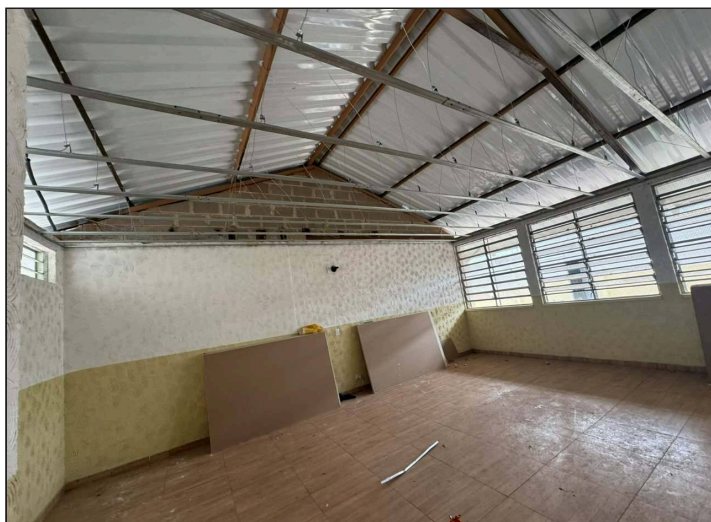

FORRO DE GESSO

06/10/2026



SEM LIGAÇÃO

06/10/2026



PENDÊNCIA 03 E 04

06/10/2026




PENDÊNCIA 05

06/10/2026




PENDÊNCIA 01

06/10/2026

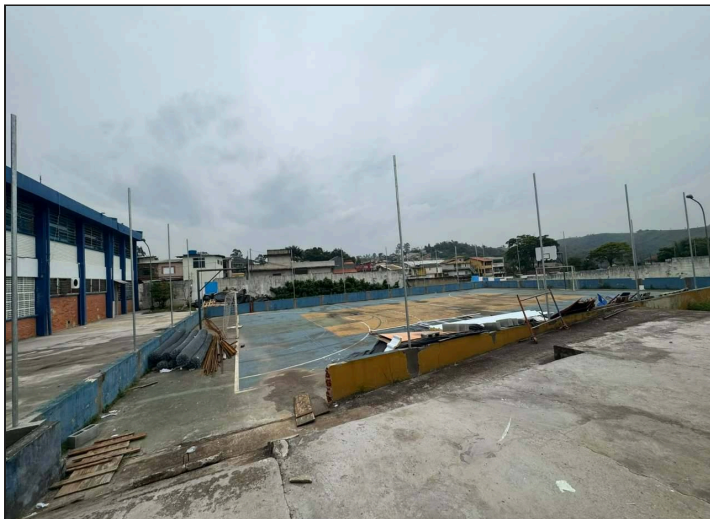

COMEÇAR ALAMBRADO

06/10/2026

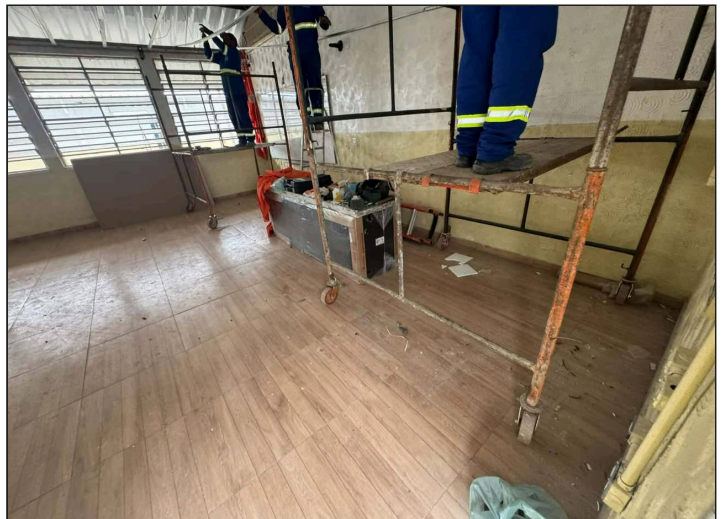

FORRO DE GESSO

06/10/2026

LEONARDO Eng. responsável — contratada	ARAUJO Empreiteiro	RODRIGO Fiscal / FDE
---	-----------------------	-------------------------
