

ATA FDE CONTRATO ATA.FDE 42.266	RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA Modelo conforme o Livro de Ocorrências da FDE · documento de acompanhamento da contratada	Nº 1
		Data: 07/10/2026
		Visita: 14:19
		Preenchido por: Eng. Leonardo

OBRA / UNIDADE DE ENSINO ETEC JOSE MIGUEL SOARES	CÓDIGO DO PRÉDIO 1203341
LOCAL ITAPEVI	PI (PORTAL) 2026/00866
ORDEM DE SERVIÇO —	CONTRATO FDE 70/00412/26-001-001
EMPREITEIRO MARCOS FERNANDES	ENG. RESPONSÁVEL / FISCAL FDE LEONARDO / RODRIGO

ITENS VERIFICADOS NA VISITA

1. Mão-de-obra / Número de funcionários Qtd. (5)	☐ Suficiente ☒ Insuficiente
2. Material em canteiro	☐ Suficiente ☒ Insuficiente
3. Equipamentos	☒ Suficiente ☐ Insuficiente
4. Tempo	☒ Seco ☐ Chuva
5. Falhas construtivas a serem corrigidas	☒ Sim ☐ Não
6. Placa de obra instalada	☐ Sim ☐ Não ☒ N/A
7. Andamento dos serviços (43) % atual aprovado 53,9% · fiscal FDE 35% (LO 30/09/2026)	☐ Não iniciada ☒ Em execução ☐ Obra paralisada ☐ Obra concluída ☐ Em rescisão
8. Ritmo da obra	☐ Normal ☒ Lento ☐ Parado
9. Organização e limpeza da obra	☐ Boa ☒ Regular ☐ Ruim
10. Previsão de término	—

AVANÇO DA OBRA

Indicador	%	Referência
Aprovado pela FDE (medições aprovadas)	53,9%	M001 a M004 aprovadas · M005 em análise fiscal
Execução apontada pelo engenheiro	43%	visita de 07/10/2026
Fiscal da FDE — último livro de ocorrências	35%	LO nº 15 de 30/09/2026

SERVIÇOS EXECUTADOS

- EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO
- EXECUÇÃO DE REJUNTAMENTO DO PISO DO AUDITÓRIO

MATERIAIS — PEDIDOS SEM ENTREGA ATÉ 07/10/2026

23 pedidos no Sienge · 16 entregues · 7 com item pendente, somando R\$ 78.162,56 a receber.

7 pedido(s) sem entrega confirmada até 07/10/2026 — todos listados abaixo, do mais antigo para o mais novo.

Pedido	Fornecedor	Itens	Valor	Entrega
50794 23/05/2026	ARTEFATOS DE CONCRETO CONCEICAO E OLIVEIRA LTDA pedido há 138 dias	31182 - TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA — 90 m	R\$ 5.100,00	PENDENTE marcado por Eng. Leonardo · 08/10/2026 13:10
54111 04/08/2026	GIOVANA HELENA DUARTE DE SOUZA 14195404835 pedido há 65 dias	6928 - MATERIAL E MÃO DE OBRA — 1 un	R\$ 18.150,00	PENDENTE marcado por Eng. Leonardo · 08/10/2026 13:10
54453 10/08/2026	LOOPING ENGENHARIA LTDA pedido há 59 dias	38508 - REEMBOLSO — 1 un	R\$ 1.070,00	PENDENTE marcado por Eng. Leonardo · 08/10/2026 13:10
54692 12/08/2026	SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA pedido há 57 dias	21245 - LAMPADA LED TUBULAR 120CM T8 18W 6500K — 60 un	R\$ 612,00	PENDENTE marcado por Eng. Leonardo · 08/10/2026 13:10
57537 07/10/2026	ACOS GOLDONI LTDA pedido há 1 dias	44565 - TELHA GALVALUME / AÇO GALVANIZADO, ACABAMENTO NATURAL, TRAPEZOIDAL H=40 MM, E=0,65 MM, COMP.=3,5 M — 170 un	R\$ 33.439,00	PENDENTE marcado por Eng. Leonardo · 08/10/2026 13:10
57538 07/10/2026	COMERCIAL GOLDONI PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA pedido há 1 dias	6591 - Eletrodo 2,5mm — 5 kg 19099 - VIGA "U" 100x40 CHAPA 2,65 — 60 br 27724 - Viga UE 100x50x17 #2,65mm — 60 br	R\$ 19.199,00	PENDENTE marcado por Eng. Leonardo · 08/10/2026 13:10
57629 07/10/2026	TORRES CABRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI pedido há 1 dias	7833 - JOELHO 50MM X 90 SOLDÁVEL — 5 un 10808 - LUVA SOLDÁVEL 50MM — 2 pç. 7702 - Joelho soldável 90 32mm — 2 un 45104 - JOELHO 45° SOLDÁVEL 32 MM — 4 un 45105 - LUVA SOLDÁVEL 40 MM 1.1/4 PVC MARROM ÁGUA FRIA — 4 un 45106 - COLA ADESIVO PLÁSTICO TUBOS CONEXÕES PVC COM PINCEL 850 G — 1 un 41847 - SERRAS STARRETT — 1 un 45110 - CONECTOR MACHO PARA 1/5 MM — 1 un 45109 - TUBO CANO PVC SOLDÁVEL 50 MM 1.1/2" — 3 m 45100 - BUCHA RED CT SOLDÁVEL 40X32 MM — 2 un 13959 - Lixa n.80 — 2 un 45099 - JOELHO 90° SOLDÁVEL 40 MM — 2 un 45107 - LUVA CORRER MARROM 1/2X20 MM — 2 un 40756 - FITA VEDA ROSCA 18X50 M — 3 pç ... e mais 3 itens	R\$ 592,25	PENDENTE marcado por Eng. Leonardo · 08/10/2026 13:10

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES

Observações

- CONFORME ALINHADO COM A DIREÇÃO, DEIXAR A QUADRA 100% PRONTA E EM PLENAS CONDIÇÕES PARA A FORMATURA


Recomendações à contratada

- AUMENTAR O EFETIVO DA OBRA
- APÓS A REGULARIZAÇÃO DAS PENDÊNCIAS, REALIZAR REGISTRO FOTOGRÁFICO E ENVIAR AS FOTOS NO GRUPO

Pendências em aberto

- 01 - CALHA DA QUADRA JÁ SUBSTITUÍDA, PORÉM AINDA HÁ RELATOS DE INFILTRAÇÃO. REALIZAR NOVA VISTORIA PARA IDENTIFICAR A ORIGEM DO PROBLEMA E PROVIDENCIAR A CORREÇÃO COM URGÊNCIA, VISANDO GARANTIR QUE A QUADRA ESTEJA EM PLENAS CONDIÇÕES PARA A FORMATURA NO FINAL DO ANO
- 02 - FALTA DE TAPUMES E NECESSIDADE DE ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS DA OBRA, QUE ESTÃO COM ACESSO AOS ALUNOS. PROVIDENCIAR O ISOLAMENTO E A ORGANIZAÇÃO ADEQUADA DOS MATERIAIS, GARANTINDO A SEGURANÇA DOS ALUNOS
- 03 - RESERVATÓRIO COM VAZAMENTO, NECESSITANDO DE VERIFICAÇÃO E CORREÇÃO DO SISTEMA DE TUBULAÇÕES

REGISTRO FOTOGRÁFICO

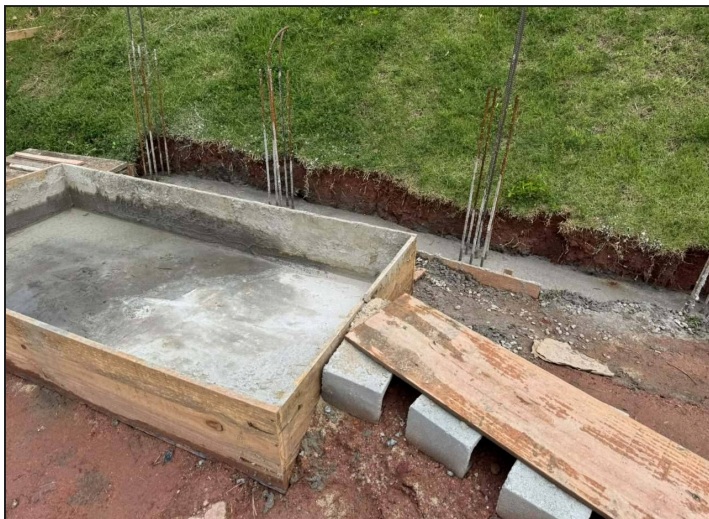

Registro da visita

08/10/2026



PENDÊNCIA 03

08/10/2026




Registro da visita

08/10/2026




Registro da visita

08/10/2026

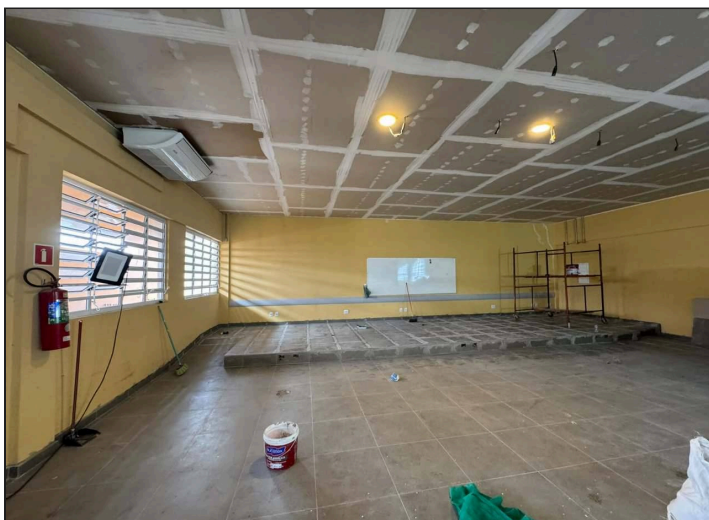

Registro da visita

08/10/2026

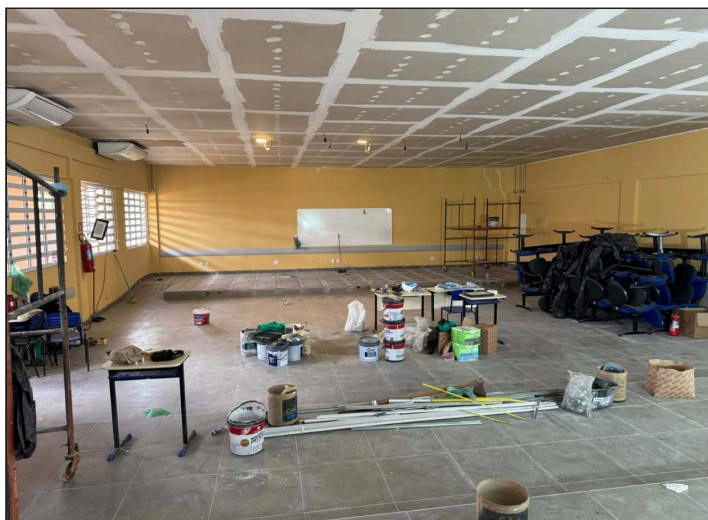

Registro da visita

08/10/2026



PENDÊNCIA 02

08/10/2026




PENDÊNCIA 02

08/10/2026



Registro da visita

08/10/2026

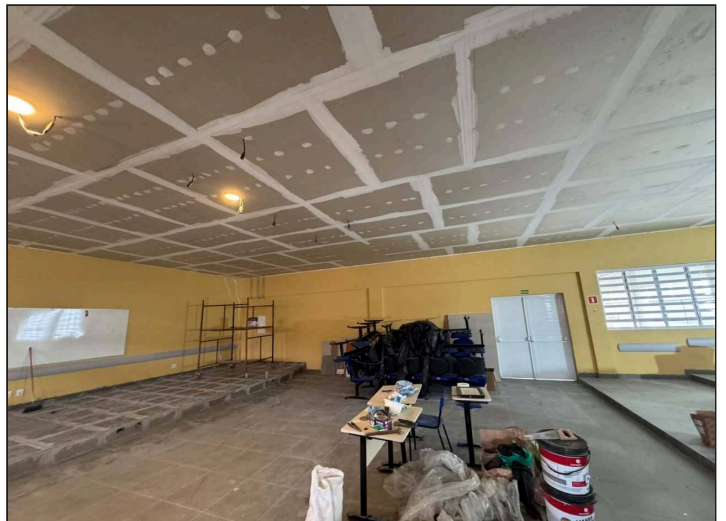

Registro da visita

08/10/2026



PENDÊNCIA 01

08/10/2026



PENDÊNCIA 01

08/10/2026



PENDÊNCIA 01

08/10/2026

LEONARDO Eng. responsável — contratada	MARCOS FERNANDES Empreiteiro	RODRIGO Fiscal / FDE
--	--	--
