

ATA FDE CONTRATO ATA.FDE 42.266	RELATÓRIO SEMANAL DE ACOMPANHAMENTO Modelo conforme o Livro de Ocorrências da FDE · documento de acompanhamento da contratada	Semana 41
		05/10/2026 a 09/10/2026
		1 visita(s) registrada(s)
OBRA / UNIDADE DE ENSINO ETEC JOSE MIGUEL SOARES	CÓDIGO DO PRÉDIO 1203341	
LOCAL ITAPEVI	PI (PORTAL) 2026/00866	
ORDEM DE SERVIÇO —	CONTRATO FDE 70/00412/26-001-001	
EMPREITEIRO MARCOS FERNANDES	ENG. RESPONSÁVEL / FISCAL FDE LEONARDO / RODRIGO	

RESUMO DA SEMANA

Data	Dia	Efetivo	Tempo	Ritmo	% execução (eng.)
07/10/2026	qua	5	Seco	Lento	43%

1 visita(s) entre 05/10/2026 e 09/10/2026 Execução: **43%**. Previsão de término: .

AVANÇO DA OBRA

Indicador	%	Referência
Aprovado pela FDE (medições aprovadas)	53,9%	M001 a M004 aprovadas · M005 em análise fiscal
Execução apontada pelo engenheiro	43%	visita de 09/10/2026
Fiscal da FDE — último livro de ocorrências	35%	LO nº 15 de 30/09/2026

SERVIÇOS EXECUTADOS NA SEMANA

- EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO - EXECUÇÃO DE REJUNTAMENTO DO PISO DO AUDITÓRIO
--

MATERIAIS — SITUAÇÃO DOS PEDIDOS EM 08/10/2026

Situação na data de emissão deste relatório (08/10/2026 às 17:14): pedidos do Sienge (01/01/2025 a 07/10/2026, exportação de 07/10/2026 23:23), marcações de entrega do painel e solicitações sem pedido de compra.

Nenhum pedido mudou de pendente para entregue nesta semana.

23 pedidos no Sienge · 16 entregues · 7 com item pendente, somando **R\$ 78.162,56** a receber.

7 pedido(s) sem entrega confirmada até 08/10/2026 — todos listados abaixo, do mais antigo para o mais novo.

Pedido	Fornecedor	Itens	Valor	Entrega
50794 23/05/2026	ARTEFATOS DE CONCRETO CONCEICAO E OLIVEIRA LTDA pedido há 138 dias	31182 - TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA — 90 m	R\$ 5.100,00	PENDENTE marcado por Eng. Leonardo · 08/10/2026 13:10
54111 04/08/2026	GIOVANA HELENA DUARTE DE SOUZA 14195404835 pedido há 65 dias	6928 - MATERIAL E MÃO DE OBRA — 1 un	R\$ 18.150,00	PENDENTE marcado por Eng. Leonardo · 08/10/2026 13:10

Pedido	Fornecedor	Itens	Valor	Entrega
54453 10/08/2026	LOOPING ENGENHARIA LTDA pedido há 59 dias	38508 - REEMBOLSO — 1 un	R\$ 1.070,00	PENDENTE marcado por Eng. Leonardo · 08/10/2026 13:10
54692 12/08/2026	SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA pedido há 57 dias	21245 - LAMPADA LED TUBULAR 120CM T8 18W 6500K — 60 un	R\$ 612,00	PENDENTE marcado por Eng. Leonardo · 08/10/2026 13:10
57537 07/10/2026	ACOS GOLDONI LTDA pedido há 1 dias	44565 - TELHA GALVALUME / AÇO GALVANIZADO, ACABAMENTO NATURAL, TRAPEZOIDAL H=40 MM, E=0,65 MM, COMP.=3,5 M — 170 un	R\$ 33.439,00	PENDENTE marcado por Eng. Leonardo · 08/10/2026 13:10
57538 07/10/2026	COMERCIAL GOLDONI PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA pedido há 1 dias	6591 - Eletrodo 2,5mm — 5 kg 19099 - VIGA "U" 100x40 CHAPA 2,65 — 60 br 27724 - Viga UE 100x50x17 #2,65mm — 60 br	R\$ 19.199,00	PENDENTE marcado por Eng. Leonardo · 08/10/2026 13:10
57629 07/10/2026	TORRES CABRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI pedido há 1 dias	7833 - JOELHO 50MM X 90 SOLDÁVEL — 5 un 10808 - LUVA SOLDÁVEL 50MM — 2 pç. 7702 - Joelho soldável 90 32mm — 2 un 45104 - JOELHO 45° SOLDÁVEL 32 MM — 4 un 45105 - LUVA SOLDÁVEL 40 MM 1.1/4 PVC MARROM ÁGUA FRIA — 4 un 45106 - COLA ADESIVO PLÁSTICO TUBOS CONEXÕES PVC COM PINCEL 850 G — 1 un 41847 - SERRAS STARRETT — 1 un 45110 - CONECTOR MACHO PARA 1/5 MM — 1 un 45109 - TUBO CANO PVC SOLDÁVEL 50 MM 1.1/2" — 3 m 45100 - BUCHA RED CT SOLDÁVEL 40X32 MM — 2 un 13959 - Lixa n.80 — 2 un 45099 - JOELHO 90° SOLDÁVEL 40 MM — 2 un 45107 - LUVA CORRER MARROM 1/2X20 MM — 2 un 40756 - FITA VEDA ROSCA 18X50 M — 3 pç ... e mais 3 itens	R\$ 592,25	PENDENTE marcado por Eng. Leonardo · 08/10/2026 13:10

Solicitações sem pedido de compra (12) — ≈ R\$ 95.335,09 estimado pelos pedidos do Sienge

Solicitação	Finalidade	Itens ainda sem pedido	Entrega
28322 14/05/2026	FINALIDADE: WC ALUNOS FEM E MASC solicitado há 147 dias	FECHADURA — 4 un · R\$ 64,00 KIT DE REPARO COM ACABAMENTO — 9 un TAMPA DE ACIONAMENTO DE PRIVADA DOCOL — 1 un SIFÃO COM COPO CROMADO — 4 un · ≈ R\$ 127,56 ≈ R\$ 191,56 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28613 22/05/2026	FINALIDADE: MANUTENCAO ELETRICA solicitado há 139 dias	LUMINÁRIA SOBREPOR LED TUBULAR VIDRO 2X18W — 40 un · R\$ 3.586,80 IL42 COMPLETA (DIFUSOR TRANSPARENTE) — 28 un IL42 COMPLETA — 40 un ≈ R\$ 3.586,80 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
29053 12/06/2026	FINALIDADE: MATERIAL PARA PINTURA solicitado há 118 dias	BARRICA DE TEXTURA ROLADA 50 KG — 3 un · R\$ 414,00 ≈ R\$ 414,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra

Solicitação	Finalidade	Itens ainda sem pedido	Entrega
30825 27/08/2026	FINALIDADE: PINTURA solicitado há 42 dias	PINCEL 2" — 4 un · R\$ 32,00 THINNER 5L — 7 gl · R\$ 646,52 Tinta látex Branco 18L — 12 lt · R\$ 4.020,00 Aguarrás 5l — 7 gl · R\$ 1.050,00 Tinta piso Amarelo 3,6l — 1 un · R\$ 150,00 Lixa ferro n.120 — 50 fl · R\$ 150,00 Tinta piso branco 3,6 l — 3 gl · R\$ 276,00 Tinta esmalte sintético 3,6l Laranja — 6 gl · ≈ R\$ 870,00 TINTA ESMALTE SINTÉTICO AZUL 3,6L — 6 gl · ≈ R\$ 671,64 Lona — 162 m · R\$ 72.090,00 ≈ R\$ 80.520,73 estimado ... e mais 12 itens	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
31052 08/09/2026	FINALIDADE: MATERIAL PARA MURO solicitado há 30 dias	estribos 15x15 — 760 un DISCO SERRA MADEIRA MTX 4.3/8X40D — 12 un DISCO P/BLOCO 4 3/8" — 2 un ESTRIBO 20 X 25 — 170 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
31070 09/09/2026	FINALIDADE: PISO TÁTIL solicitado há 29 dias	ADESIVO COLA DE CONTATO SAPATEIRO FORMICA CASCOLA 730G — 1 un PISO TATIL ALERTA 24X24 — 30 un PISO TATIL DIRECIONAL 24X24 — 30 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
31247 17/09/2026	FINALIDADE: PASSAGEM COBERTA solicitado há 21 dias	PARAFUSO AUTOPERFORANTE COM CONJUNTO DE VEDAÇÃO PARA TELHA DE AÇO — 3.000 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
31249 17/09/2026	FINALIDADE: FUNDAÇÃO DA PASSAGEM COBERTA solicitado há 21 dias	AÇO CA-50 6,30MM — 4 br · R\$ 149,56 AÇO CA-50 10,00MM — 10 br · R\$ 578,60 ≈ R\$ 728,16 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
31250 17/09/2026	FINALIDADE: ÁGUAS PLUVIAIS solicitado há 21 dias	CIMENTO — 20 sc · R\$ 849,80 TIJOLO COMUM MACICO — 1.000 un · R\$ 900,00 Areia média — 6 m³ · R\$ 1.460,10 Brita — 6 m³ · R\$ 1.277,34 TC-11 PLACA DE CONCR. PRE-MOLD PERF. 59,5X34,5X5CM — 180 m ≈ R\$ 4.487,24 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
31571 29/09/2026	FINALIDADE: ELÉTRICA solicitado há 9 dias	Cabo flex 4mm² preto — 200 m · R\$ 870,00 Cabo flex 2,5mm² verde — 100 m · R\$ 252,00 CABO FLEX 2,5MM VERMELHO — 100 m · R\$ 252,00 Fita isolante — 7 rol · R\$ 63,42 DISJUNTOR BIPOLAR 32A — 10 un · R\$ 295,00 Cabo flex 6mm² preto — 100 m · R\$ 778,00 DISJUNTOR BIPOLAR 20A — 5 un · R\$ 116,65 DISJUNTOR BIPOLAR 63 A — 3 un · R\$ 360,00 cabo flex 2,5mm azul — 100 m · R\$ 252,00 Saco de entulho — 50 sc · R\$ 260,00 ≈ R\$ 3.557,02 estimado ... e mais 4 itens	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
31675 05/10/2026	FINALIDADE: MATERIAL PARA MURO solicitado há 3 dias	AREIA — 3 m³ · R\$ 830,67 PREGO 18X27 — 5 kg · R\$ 100,00 PEDRA — 3 m³ · R\$ 718,56 COLA PVC 1L — 1 tb · R\$ 34,90 TUBO ESGOTO 50MM — 2 br · R\$ 104,30 JUNCAO ESGOTO 100 X 100MM — 1 pç MANTA BIDIM 4MM — 25 m² ABRAÇADEIRA DE NYLON GRANDE (ENFORCA-GATO) PRETA, 25 CM — 100 un TUBO DRENO PERFURADO 150MM — 20 m TUBO DRENO PERFURADO 100 MM — 20 m ≈ R\$ 1.788,43 estimado ... e mais 1 itens	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra

Solicitação	Finalidade	Itens ainda sem pedido	Entrega
31716 06/10/2026	FINALIDADE: MATERIAL PARA VAZAMENTO NA ETEC solicitado há 2 dias	SERRAS STARRETT — 1 un · R\$ 61,15 CONECTOR RM FIXA PEX FÊMEA 32X1 — 3 un CONECTOR RM FIXA PEX MACHO 32X1 — 3 un ADAPTADOR CT SOLDÁVEL 50X112 — 2 un TUBO MONOCAMADA PEX 30 M 1" OU 32MM — 1 un LUVA LR BUCHA LATÃO 32X1 AZUL — 2 un LUVA PVC SOLDA CSOLA ROSCA LR 32 MM X 1" — 2 un ≈ R\$ 61,15 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES DA SEMANA

Observações • CONFORME ALINHADO COM A DIREÇÃO, DEIXAR A QUADRA 100% PRONTA E EM PLENAS CONDIÇÕES PARA A FORMATURA Recomendações à contratada • AUMENTAR O EFETIVO DA OBRA • APÓS A REGULARIZAÇÃO DAS PENDÊNCIAS, REALIZAR REGISTRO FOTOGRÁFICO E ENVIAR AS FOTOS NO GRUPO Pendências em aberto • 01 - CALHA DA QUADRA JÁ SUBSTITUÍDA, PORÉM AINDA HÁ RELATOS DE INFILTRAÇÃO. REALIZAR NOVA VISTORIA PARA IDENTIFICAR A ORIGEM DO PROBLEMA E PROVIDENCIAR A CORREÇÃO COM URGÊNCIA, VISANDO GARANTIR QUE A QUADRA ESTEJA EM PLENAS CONDIÇÕES PARA A FORMATURA NO FINAL DO ANO • 02 - FALTA DE TAPUMES E NECESSIDADE DE ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS DA OBRA, QUE ESTÃO COM ACESSO AOS ALUNOS. PROVIDENCIAR O ISOLAMENTO E A ORGANIZAÇÃO ADEQUADA DOS MATERIAIS, GARANTINDO A SEGURANÇA DOS ALUNOS • 03 - RESERVATÓRIO COM VAZAMENTO, NECESSITANDO DE VERIFICAÇÃO E CORREÇÃO DO SISTEMA DE TUBULAÇÕES

REGISTRO FOTOGRÁFICO DA SEMANA



Registro da visita

08/10/2026




PENDÊNCIA 03

08/10/2026



Registro da visita

08/10/2026

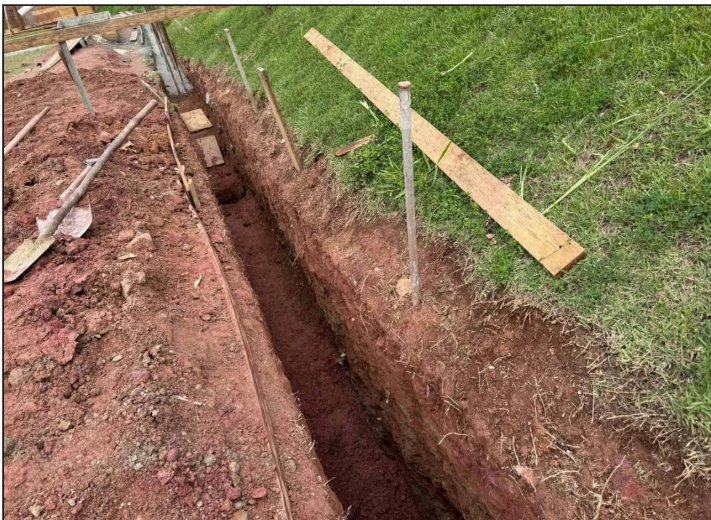


Registro da visita

08/10/2026



Registro da visita

08/10/2026

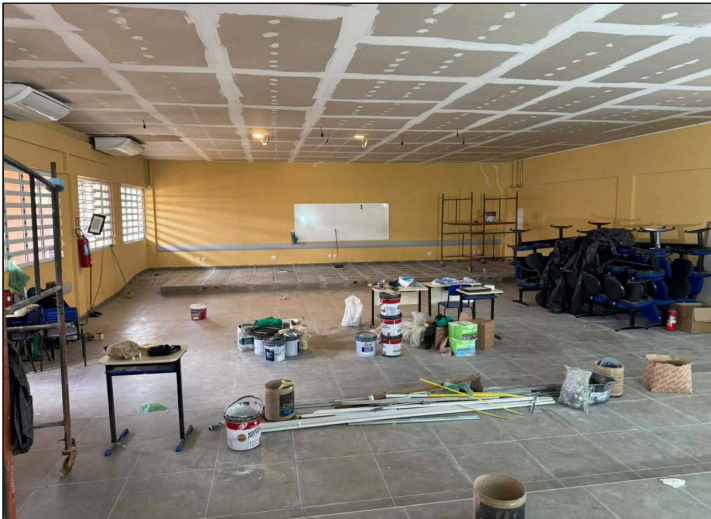

Registro da visita

08/10/2026



PENDÊNCIA 02

08/10/2026




PENDÊNCIA 02

08/10/2026



Registro da visita

08/10/2026

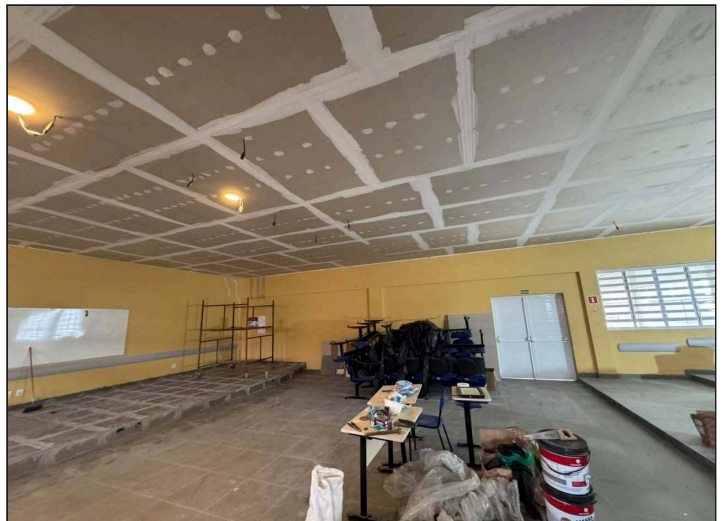

Registro da visita

08/10/2026



PENDÊNCIA 01

08/10/2026



PENDÊNCIA 01

08/10/2026



PENDÊNCIA 01

08/10/2026

LEONARDO Eng. responsável — contratada	MARCOS FERNANDES Empreiteiro	RODRIGO Fiscal / FDE
--	--	--
