

ATA FDE CONTRATO ATA.FDE 42.275	RELATÓRIO SEMANAL DE ACOMPANHAMENTO Modelo conforme o Livro de Ocorrências da FDE · documento de acompanhamento da contratada	Semana 41
		05/10/2026 a 09/10/2026
		1 visita(s) registrada(s)
OBRA / UNIDADE DE ENSINO EE/EMEF JD MARIA HELENA / PADRE ELIDIO		CÓDIGO DO PRÉDIO 102206
LOCAL BARUERI		PI (PORTAL) 2024/01752
ORDEM DE SERVIÇO —		CONTRATO FDE 70/00559/26-001-001
EMPREITEIRO RAFAEL		ENG. RESPONSÁVEL / FISCAL FDE LEONARDO / GUILHERME

RESUMO DA SEMANA

Data	Dia	Efetivo	Tempo	Ritmo	% execução (eng.)
05/10/2026	seg	0	Seco	Normal	24%

1 visita(s) entre 05/10/2026 e 09/10/2026 Execução: **24%**. Previsão de término: .

AVANÇO DA OBRA

Indicador	%	Referência
Aprovado pela FDE (medições aprovadas)	21,2%	M001 a M003 aprovadas · M004 em aprovação supervisor
Execução apontada pelo engenheiro	24%	visita de 09/10/2026
Fiscal da FDE — último livro de ocorrências	38%	LO nº 10 de 28/09/2026

SERVIÇOS EXECUTADOS NA SEMANA

No horário da vistoria não havia funcionário na unidade

MATERIAIS — SITUAÇÃO DOS PEDIDOS EM 08/10/2026

Situação na data de emissão deste relatório (08/10/2026 às 01:24): pedidos do Sienge (01/01/2025 a 07/10/2026, exportação de 07/10/2026 23:23), marcações de entrega do painel e solicitações sem pedido de compra.

Nenhum pedido mudou de pendente para entregue nesta semana.

4 pedidos no Sienge · 4 entregues · 0 com item pendente, somando **R\$ 0,00** a receber.

Nenhum pedido sem entrega confirmada até 08/10/2026.

Solicitações sem pedido de compra (2) — ≈ **R\$ 36.814,89** estimado pelos pedidos do Sienge

Solicitação	Finalidade	Itens ainda sem pedido	Entrega
29150 18/06/2026	FINALIDADE: REVESTIMENTO solicitado há 112 dias	PISO PORCELANATO — 548,80 m2 · R\$ 22.100,18 AZULEJO BRANCO BRILHANTE — 150 m² · R\$ 5.079,00 ≈ R\$ 27.179,18 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra

Solicitação	Finalidade	Itens ainda sem pedido	Entrega
29369 01/07/2026	FINALIDADE: REVISÃO ELÉTRICA QUADROS solicitado há 99 dias	Cabo flex 2,5mm² preto — 1 rol · R\$ 239,00 Cabo flex 2,5mm² verde — 1 rol · R\$ 239,00 Cabo flex 1,5mm² azul — 1 rol · R\$ 167,00 Cabo flex 1,5mm² amarelo — 1 rol · R\$ 167,00 Fita isolante — 7 rol · R\$ 63,42 DISJUNTOR BIPOLAR 16A — 6 un · R\$ 208,92 Cabo flex 1,5mm² branco — 1 rol · R\$ 167,00 DISJUNTOR BIPOLAR 25A — 8 un · R\$ 186,64 Luva 3/4 galv — 80 un · R\$ 304,00 Cabo flex 2,5mm² vermelho — 1 rol · R\$ 251,00 ≈ R\$ 9.635,71 estimado <i>... e mais 38 itens</i>	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES DA SEMANA


Pendências em aberto • Instalação da porta de vidro no corredor, solicitado diversas vezes e até o momento não instalado • Material sem isolamento no corredor de acesso ao estacionamento • Material sem isolamento no refeitório, acesso para qualquer pessoa • Pisos sem junta de dilatação executada • Pisos com degrau entre ambientes • Sem soleiras, mostrando o piso sob piso executado

REGISTRO FOTOGRÁFICO DA SEMANA




Latas de tintas sem isolamento no refeitório

05/10/2026

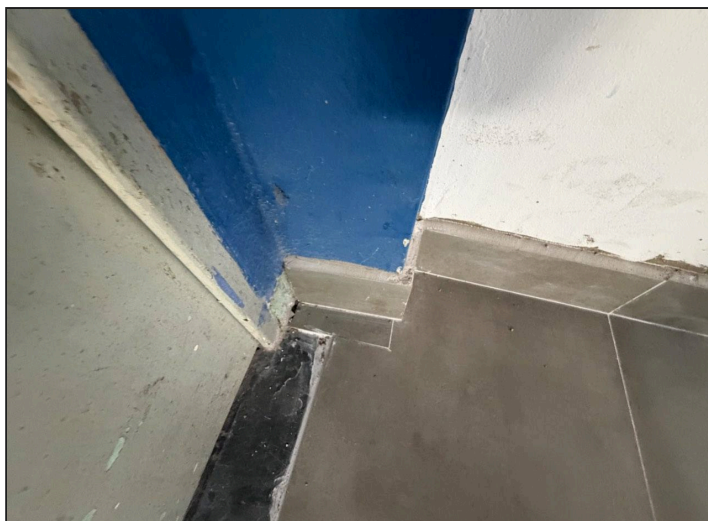


Acabamento do piso ficou ruim

05/10/2026

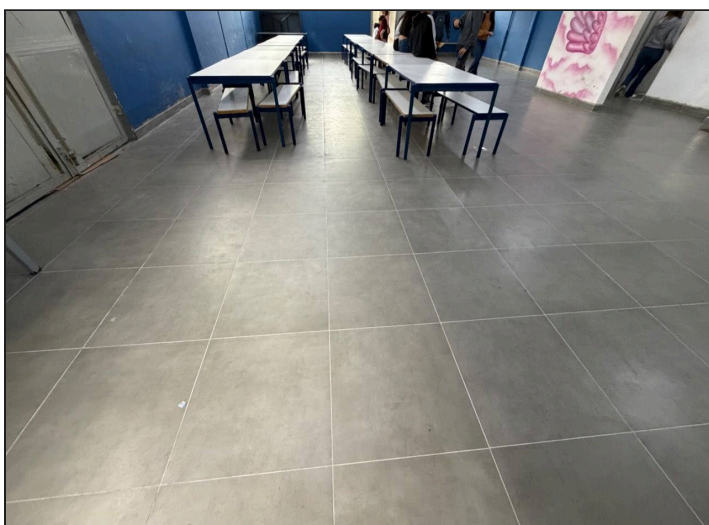


Piso refeitório sem junta de dilatação

05/10/2026

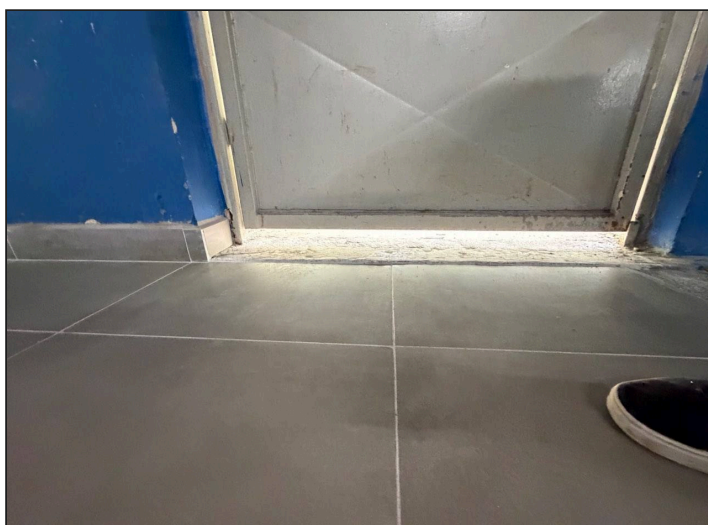

Degrau no acesso externo

05/10/2026

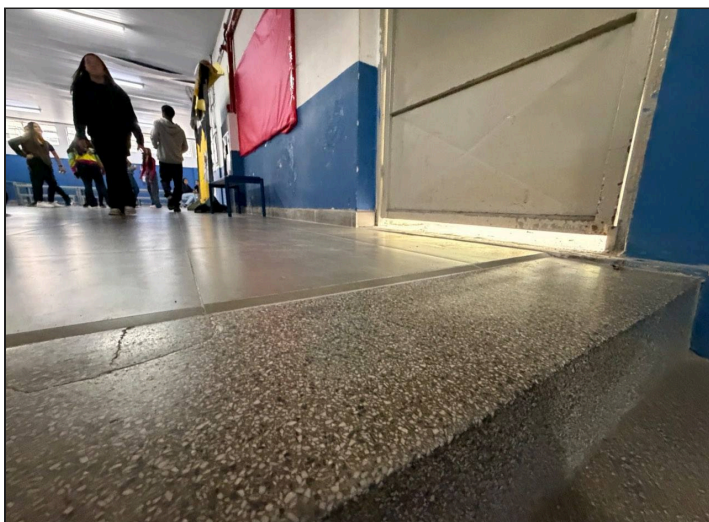

Registro da visita

05/10/2026



Registro da visita

05/10/2026



Não trocado soleira entre ambientes, degrau no piso 05/10/2026



Sem soleira, podendo danificar o piso 05/10/2026




Sem soleira, mostrando o piso sob piso 05/10/2026



Sem isolamento material no corredor acesso estacionamento 05/10/2026



Entulho no estacionamento 05/10/2026

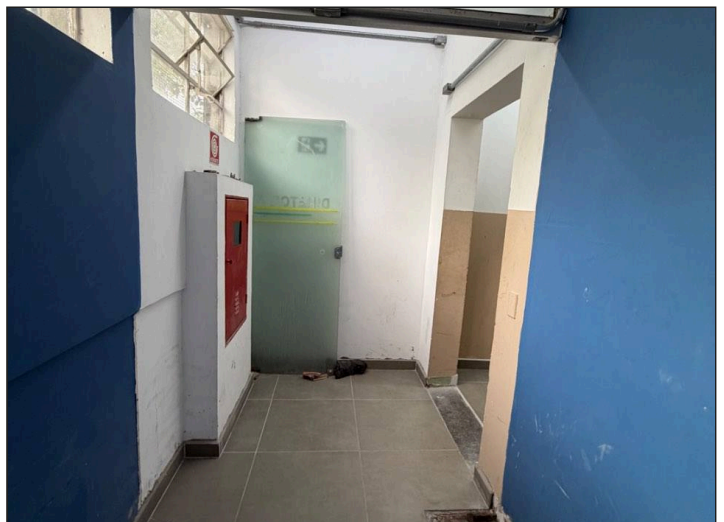

Porta removida ainda não foi instalada 05/10/2026



Danificado guarnição porta sala direção

05/10/2026

_____ LUIS JÚNIOR Eng. responsável — contratada	_____ RAFAEL Empreiteiro	_____ GUILHERME Fiscal / FDE
--	---	---
