

ATA FDE CONTRATO ATA.FDE 42.277	RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA Modelo conforme o Livro de Ocorrências da FDE · documento de acompanhamento da contratada	Nº 1
		Data: 08/10/2026
		Visita: 09:52
		Preenchido por: Eng. Leonardo
OBRA / UNIDADE DE ENSINO HENRIQUE FERNANDO GOMES ESTUDANTE		CÓDIGO DO PRÉDIO 102131
LOCAL BARUERI		PI (PORTAL) 2026/01156
ORDEM DE SERVIÇO —		CONTRATO FDE 70/00620/26-001-001
EMPREITEIRO LEONIZIO		ENG. RESPONSÁVEL / FISCAL FDE LEONARDO / RODRIGO

ITENS VERIFICADOS NA VISITA

1. Mão-de-obra / Número de funcionários Qtd. (2)	☐ Suficiente ☒ Insuficiente
2. Material em canteiro	☒ Suficiente ☐ Insuficiente
3. Equipamentos	☒ Suficiente ☐ Insuficiente
4. Tempo	☒ Seco ☐ Chuva
5. Falhas construtivas a serem corrigidas	☐ Sim ☒ Não
6. Placa de obra instalada	☐ Sim ☐ Não ☒ N/A
7. Andamento dos serviços (40) % atual aprovado 25,3% · fiscal FDE 34% (LO 30/09/2026)	☐ Não iniciada ☒ Em execução ☐ Obra paralisada ☐ Obra concluída ☐ Em rescisão
8. Ritmo da obra	☐ Normal ☒ Lento ☐ Parado
9. Organização e limpeza da obra	☒ Boa ☐ Regular ☐ Ruim
10. Previsão de término	21/02/2027

AVANÇO DA OBRA

Indicador	%	Referência
Aprovado pela FDE (medições aprovadas)	25,3%	M001 a M003 aprovadas · M004 em análise fiscal
Execução apontada pelo engenheiro	40%	visita de 08/10/2026
Fiscal da FDE — último livro de ocorrências	34%	LO nº 9 de 30/09/2026

SERVIÇOS EXECUTADOS

- EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS NO BANHEIRO MASCULINO

MATERIAIS — PEDIDOS SEM ENTREGA ATÉ 08/10/2026

21 pedidos no Sienge · 21 entregues · 0 com item pendente, somando R\$ 0,00 a receber.

Nenhum pedido sem entrega confirmada até 08/10/2026.

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES


Observações

- CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIREÇÃO, OS SERVIÇOS QUE GERAM RUÍDO NÃO SERÃO EXECUTADOS DURANTE O HORÁRIO DIURNO. O SERVIÇO NO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS NECESSITA DE QUEBRAS PARA ADEQUAÇÃO DOS PONTOS DE ÁGUA E ELÉTRICA. A EXECUÇÃO SERÁ PROGRAMADA PARA O PERÍODO NOTURNO OU FINAL DE SEMANA, EM DATA A SER ALINHADA

Pendências em aberto

- 01 - AUMENTAR O EFETIVO NA OBRA
- 02 - PRIORIZAR E INTENSIFICAR AS FRENTES DE SERVIÇO DO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

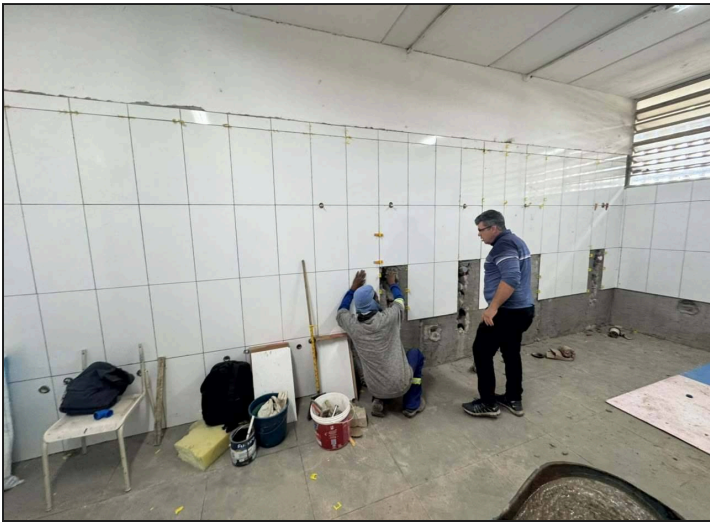

PENDÊNCIA 01

08/10/2026



PENDÊNCIA 01

08/10/2026




PENDÊNCIA 01

08/10/2026



PENDÊNCIA 01

08/10/2026

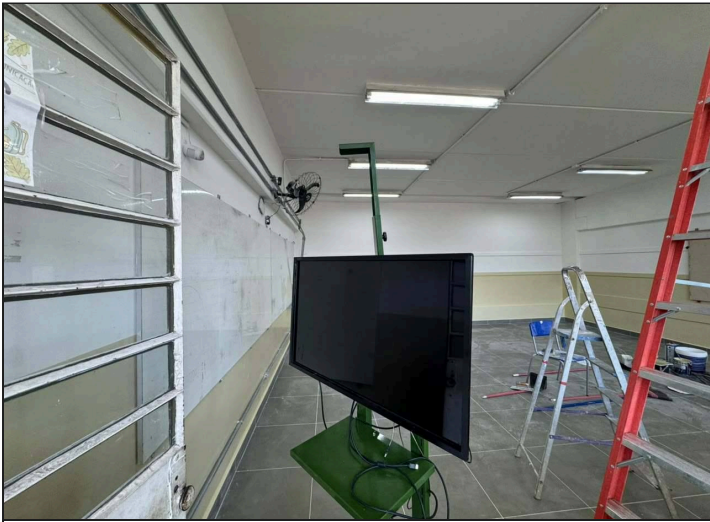


PENDÊNCIA 01

08/10/2026




PENDÊNCIA 01

08/10/2026

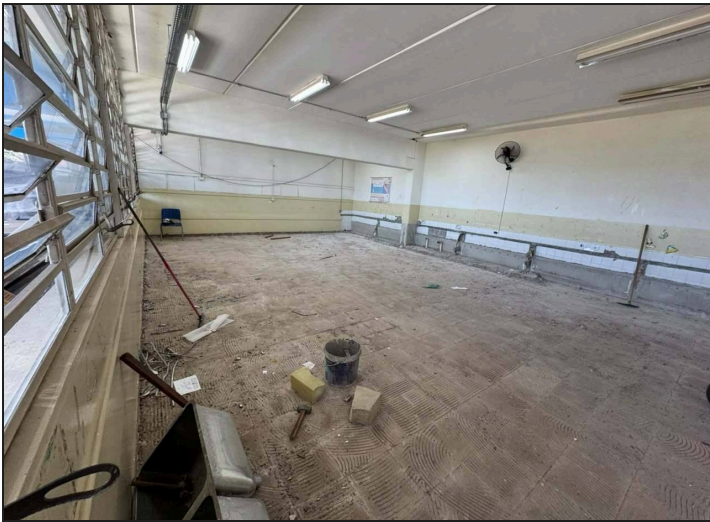


PENDÊNCIAS 01 E 02

08/10/2026

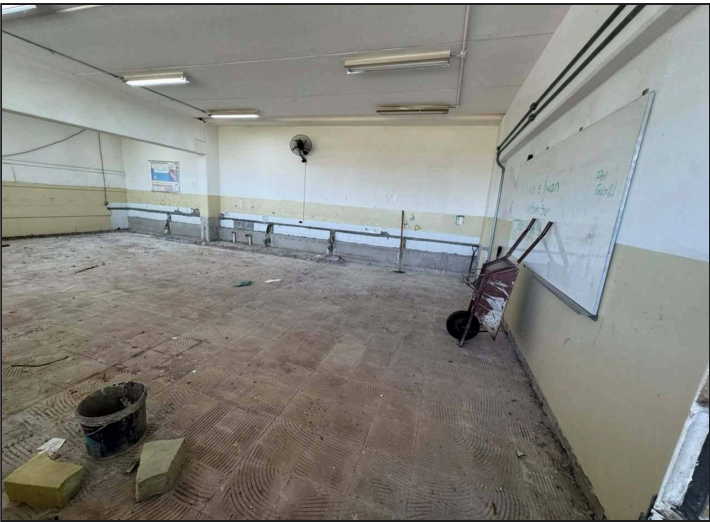

PENDÊNCIAS 01 E 02

08/10/2026

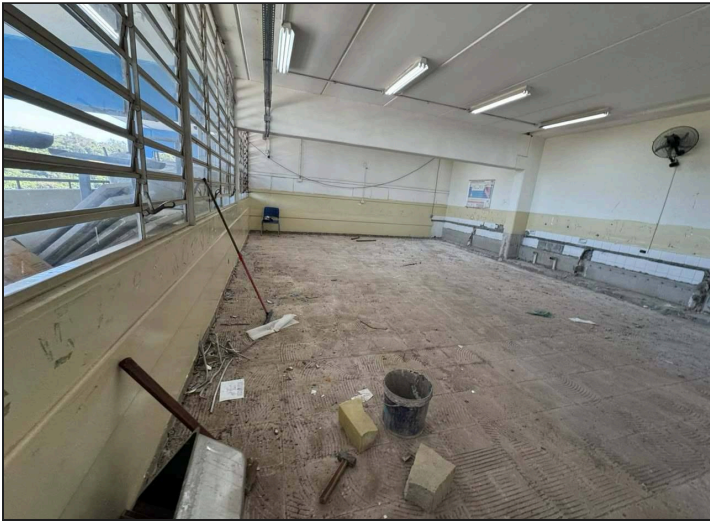

PENDÊNCIAS 01 E 02

08/10/2026



PENDÊNCIAS 01 E 02

08/10/2026

LEONARDO Eng. responsável — contratada	LEONIZIO Empreiteiro	RODRIGO Fiscal / FDE
--	--	--
