

ATA FDE CONTRATO ATA.FDE 42.277	RELATÓRIO SEMANAL DE ACOMPANHAMENTO Modelo conforme o Livro de Ocorrências da FDE · documento de acompanhamento da contratada	Semana 41
		05/10/2026 a 09/10/2026
		1 visita(s) registrada(s)
OBRA / UNIDADE DE ENSINO HENRIQUE FERNANDO GOMES ESTUDANTE		CÓDIGO DO PRÉDIO 102131
LOCAL BARUERI		PI (PORTAL) 2026/01156
ORDEM DE SERVIÇO —		CONTRATO FDE 70/00620/26-001-001
EMPREITEIRO LEONIZIO		ENG. RESPONSÁVEL / FISCAL FDE LEONARDO / RODRIGO

RESUMO DA SEMANA

Data	Dia	Efetivo	Tempo	Ritmo	% execução (eng.)
08/10/2026	qui	2	Seco	Lento	40%

1 visita(s) entre 05/10/2026 e 09/10/2026 Execução: **40%**. Previsão de término: **21/02/2027**.

AVANÇO DA OBRA

Indicador	%	Referência
Aprovado pela FDE (medições aprovadas)	25,3%	M001 a M003 aprovadas · M004 em análise fiscal
Execução apontada pelo engenheiro	40%	visita de 09/10/2026
Fiscal da FDE — último livro de ocorrências	34%	LO nº 9 de 30/09/2026

SERVIÇOS EXECUTADOS NA SEMANA

• EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS NO BANHEIRO MASCULINO

MATERIAIS — SITUAÇÃO DOS PEDIDOS EM 08/10/2026

Situação na data de emissão deste relatório (08/10/2026 às 17:14): pedidos do Sienge (01/01/2025 a 07/10/2026, exportação de 07/10/2026 23:23), marcações de entrega do painel e solicitações sem pedido de compra.

Nenhum pedido mudou de pendente para entregue nesta semana.

21 pedidos no Sienge · 21 entregues · 0 com item pendente, somando **R\$ 0,00** a receber.

Nenhum pedido sem entrega confirmada até 08/10/2026.

Solicitações sem pedido de compra (2) — ≈ **R\$ 9.468,55** estimado pelos pedidos do Sienge


Solicitação	Finalidade	Itens ainda sem pedido	Entrega
31339 21/09/2026	FINALIDADE: DIVISÓRIAS solicitado há 17 dias	DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA (1,40X1,95) — 11 un · ≈ R\$ 5.437,85 DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA (1,80X1,95) — 2 un · ≈ R\$ 988,70 DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL (0,40X1,95) — 10 un · ≈ R\$ 1.521,00 DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL (0,25X1,95) — 10 un · ≈ R\$ 1.521,00 DV-04 DIVISÓRIA DE GRANILITE - ANTEPARO (1,70X1,95) — 2 un ≈ R\$ 9.468,55 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra

Solicitação	Finalidade	Itens ainda sem pedido	Entrega
31352 21/09/2026	FINALIDADE: BANHEIROS solicitado há 17 dias	Porta de madeira, sarrafeada maciça para BOX L=0,62 H=1,5M conforme PM-74 — 12 un PM-81 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXE ACESSIVEL — 2 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES DA SEMANA

Observações • CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIREÇÃO, OS SERVIÇOS QUE GERAM RUÍDO NÃO SERÃO EXECUTADOS DURANTE O HORÁRIO DIURNO. O SERVIÇO NO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS NECESSITA DE QUEBRAS PARA ADEQUAÇÃO DOS PONTOS DE ÁGUA E ELÉTRICA. A EXECUÇÃO SERÁ PROGRAMADA PARA O PERÍODO NOTURNO OU FINAL DE SEMANA, EM DATA A SER ALINHADA Pendências em aberto • 01 - AUMENTAR O EFETIVO NA OBRA • 02 - PRIORIZAR E INTENSIFICAR AS FRENTES DE SERVIÇO DO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS
--

REGISTRO FOTOGRÁFICO DA SEMANA

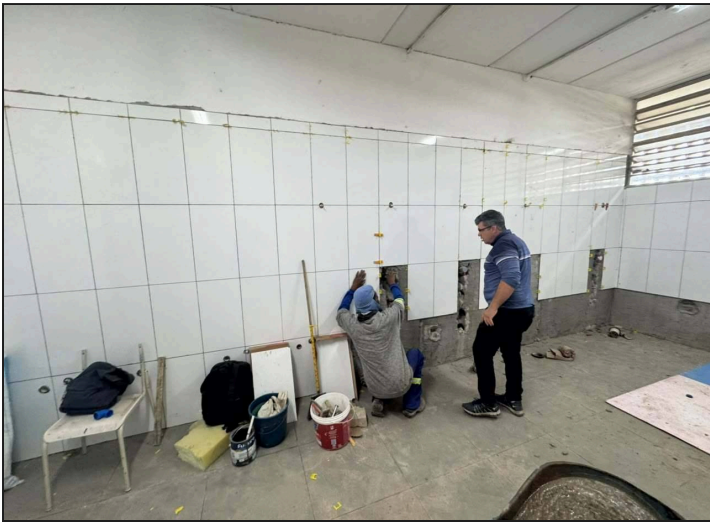

PENDÊNCIA 01

08/10/2026



PENDÊNCIA 01

08/10/2026




PENDÊNCIA 01

08/10/2026



PENDÊNCIA 01

08/10/2026

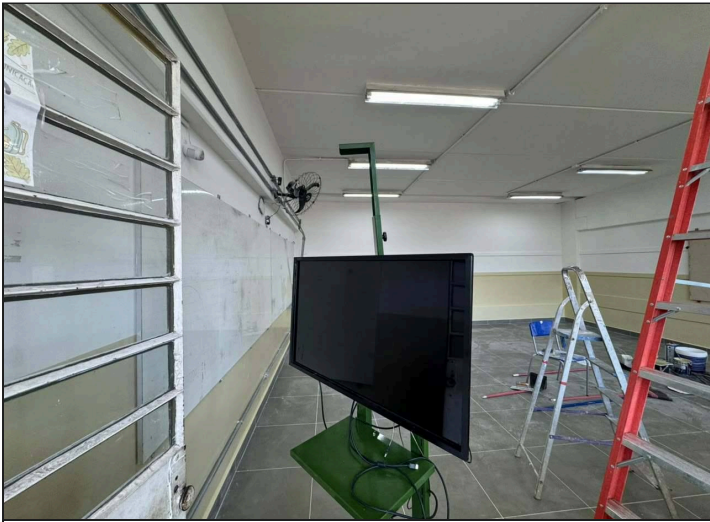


PENDÊNCIA 01

08/10/2026




PENDÊNCIA 01

08/10/2026

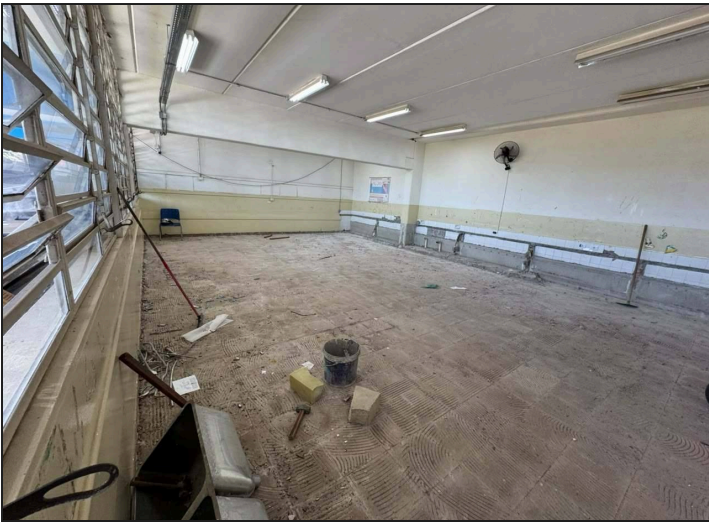


PENDÊNCIAS 01 E 02

08/10/2026

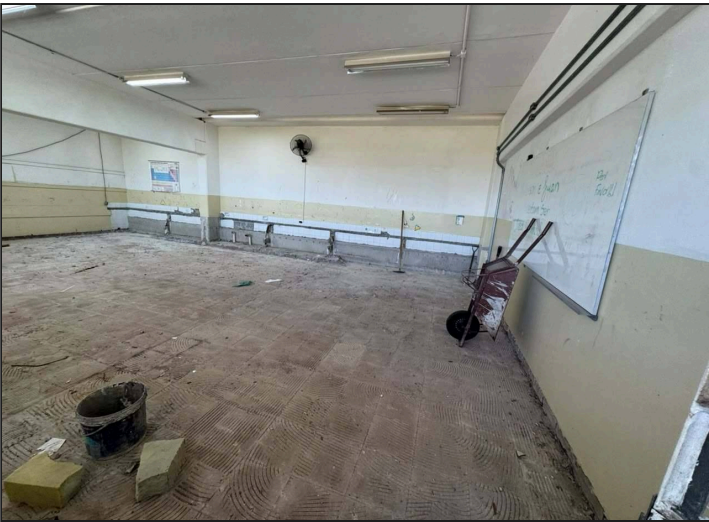

PENDÊNCIAS 01 E 02

08/10/2026

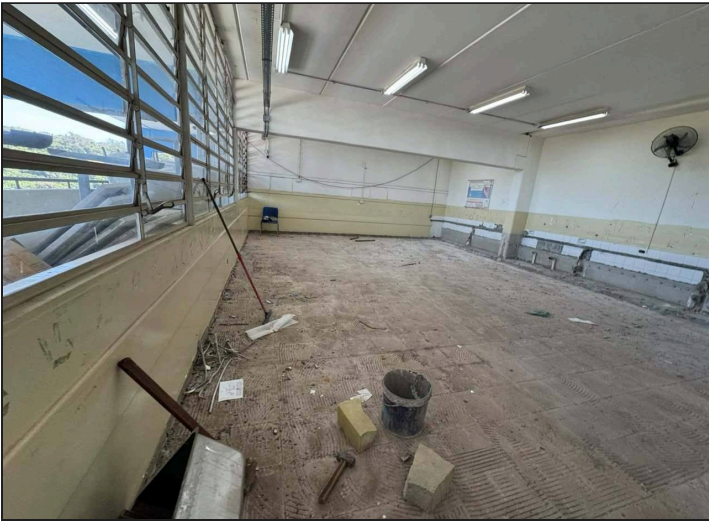

PENDÊNCIAS 01 E 02

08/10/2026



PENDÊNCIAS 01 E 02

08/10/2026

LEONARDO Eng. responsável — contratada	LEONIZIO Empreiteiro	RODRIGO Fiscal / FDE
--	--	--
