

ATA FDE CONTRATO ATA.FDE 41.278	RELATÓRIO SEMANAL DE ACOMPANHAMENTO Modelo conforme o Livro de Ocorrências da FDE · documento de acompanhamento da contratada	Semana 41
		05/10/2026 a 09/10/2026
		1 visita(s) registrada(s)
OBRA / UNIDADE DE ENSINO EE GERTRUDES EDER		CÓDIGO DO PRÉDIO 116104
LOCAL ITAPECERICA DA SERRA		PI (PORTAL) 2026/01192
ORDEM DE SERVIÇO —		CONTRATO FDE 70/00589/26-001-001
EMPREITEIRO LEONARDO ZANAO		ENG. RESPONSÁVEL / FISCAL FDE Douglas / RENATO

RESUMO DA SEMANA

Data	Dia	Efetivo	Tempo	Ritmo	% execução (eng.)
06/10/2026	ter	3	Seco	Lento	10%

1 visita(s) entre 05/10/2026 e 09/10/2026 Execução: **10%**. Previsão de término: .

AVANÇO DA OBRA

Indicador	%	Referência
Aprovado pela FDE (medições aprovadas)	9,9%	M001 a M003 aprovadas
Execução apontada pelo engenheiro	10%	visita de 09/10/2026
Fiscal da FDE — último livro de ocorrências	28%	LO nº 11 de 30/09/2026

SERVIÇOS EXECUTADOS NA SEMANA

• INICIANDO ESTRUTURA COBERTURA

MATERIAIS — SITUAÇÃO DOS PEDIDOS EM 08/10/2026

Situação na data de emissão deste relatório (08/10/2026 às 01:25): pedidos do Sienge (01/01/2025 a 07/10/2026, exportação de 07/10/2026 23:23), marcações de entrega do painel e solicitações sem pedido de compra.

Nenhum pedido mudou de pendente para entregue nesta semana.

20 pedidos no Sienge · 19 entregues · 1 com item pendente, somando **R\$ 960,00** a receber.

1 pedido(s) sem entrega confirmada até 08/10/2026 — todos listados abaixo, do mais antigo para o mais novo.

Pedido	Fornecedor	Itens	Valor	Entrega
57648 07/10/2026	LIGEIRINHO COLETA E GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA pedido há 1 dias	25765 - CAÇAMBA — 2 un	R\$ 960,00	PENDENTE falta R\$ 960,00

Solicitações sem pedido de compra (13) — ≈ R\$ 16.750,26 estimado pelos pedidos do Sienge

Solicitação	Finalidade	Itens ainda sem pedido	Entrega
29410 02/07/2026	FINALIDADE: COBERTURA GERAL solicitado há 98 dias	TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=50MM (PIR) TRAPEZ H=40MM NAS UMA FACES E= 0,50MM COMPR= 7,10M - DUAS FACES BRANCA — 6 pç · ≈ R\$ 4.268,04 ≈ R\$ 4.268,04 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra


Solicitação	Finalidade	Itens ainda sem pedido	Entrega
29817 17/07/2026	FINALIDADE: INICIO PINTURAS solicitado há 83 dias	PINCEL 2" — 5 un · R\$ 40,00 THINNER 5L — 1 gl · R\$ 92,36 Tinta látex Branco 18L — 4 lt · R\$ 1.340,00 Lixa n.120 — 15 fl · R\$ 30,00 FITA CREPE LARGA — 3 rol · R\$ 33,87 Barrica de massa corrida — 2 un · R\$ 133,00 ROLO DE LÃ 15CM — 5 un · R\$ 35,00 FUNDO ZARCÃO ACABADO 2 EM 1 18L — 1 un · R\$ 380,00 ROLO 12CM — 5 un ≈ R\$ 2.084,23 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
29818 17/07/2026	FINALIDADE: COBERTURA METALICA solicitado há 83 dias	PARAFUSO AUTOBROCANTE 12CM COM ROSCA INTEIRO — 100 un · R\$ 138,00 ≈ R\$ 138,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
29819 17/07/2026	FINALIDADE: COBERTURA METALICA solicitado há 83 dias	Pu 40 — 20 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
30322 10/08/2026	SOLICTADO POR DOUGLAS ANASTACIO FINALIDADE:: REFORMA ZELADORIA solicitado há 59 dias	PEDRA — 1 m3 · R\$ 239,52 GRAUTE — 5 sc DISCO DE CORTE PARA CONCRETO 4" MAKITA — 6 un TROCA DE CAÇAMBA — 1 un · R\$ 480,00 MASCARA AZUL PFF2 — 10 un · R\$ 39,00 Luvas — 10 par CAÇAMBA — 1 un · R\$ 480,00 ≈ R\$ 1.238,52 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
30572 18/08/2026	FINALIDADE: LIMPEZA DE OBRA solicitado há 51 dias	TROCA DE CAÇAMBA — 2 un · R\$ 960,00 ≈ R\$ 960,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
31045 08/09/2026	FINALIDADE: LIMPEZA DE OBRA solicitado há 30 dias	CIMENTO — 10 sc · R\$ 424,90 ≈ R\$ 424,90 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
31047 08/09/2026	FINALIDADE: LIMPEZA DE OBRA solicitado há 30 dias	CAÇAMBA — 2 un · R\$ 960,00 ≈ R\$ 960,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
31049 08/09/2026	FINALIDADE: PISO E REVESTIMENTO solicitado há 30 dias	Argamassa AC-II — 40 sc · R\$ 991,60 Rejunte branco — 20 kg · R\$ 160,00 ESPAÇADOR NIVELADOR 2MM — 1.000 pc · R\$ 290,00 Rejunte cinza artico — 20 kg · ≈ R\$ 300,00 SOLEIRA CORUMBÁ 0,15 X 1,00M — 3 un CANTONEIRA EM ALUMÍNIO TIPO L BRANCO 3/4 X 3M — 5 un SOLEIRA CORUMBA 0,16 X 1,00 — 1 un ≈ R\$ 1.741,60 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
31069 09/09/2026	FINALIDADE: ZELADORIA solicitado há 29 dias	BACIA SANITÁRIA C/ CAIXA ACOPLADA CONVENCIONAL - BRANCA — 1 un · ≈ R\$ 206,05 BANCADA/TAMPO LISO (COM CUBA) EM MÁRMORE SINTÉTICO — 1 un VALVULA METAL CROMADO P/ PIA — 1 un · ≈ R\$ 34,32 ≈ R\$ 240,37 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
31071 09/09/2026	FINALIDADE: ELÉTRICA ZELADORIA solicitado há 29 dias	Luminária IL-45 — 6 un · R\$ 538,02 LÂMPADAS LED TUBULAR T8 18W 4000K — 12 un · ≈ R\$ 121,44 ≈ R\$ 659,46 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
31287 18/09/2026	FINALIDADE: LIMPEZA DE OBRA solicitado há 20 dias	TROCA DE CAÇAMBA — 1 un · R\$ 480,00 ≈ R\$ 480,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra

Solicitação	Finalidade	Itens ainda sem pedido	Entrega
31659 02/10/2026	FINALIDADE: FORRO *PLACA DE DRYWALL ST (STANDARD) 1,20 X 1,80 M* solicitado há 6 dias	Placa de drywall — 52 un · R\$ 2.055,04 Massa junta para drywall 25kg — 3 un · R\$ 153,39 Arame 10 galvanizado KG — 15 kg Fita Telada 90m azul — 2 rolo · R\$ 37,68 PREGO DE ACO 15X15 — 2 pct · ≈ R\$ 33,82 REGULADOR GRANDE — 200 un Perfil Canaleta F530 — 72 un · R\$ 946,08 TABICA DE 3,0M — 23 un · R\$ 329,13 PARAFUSO 4,5 X 35 COM BUCHA — 3 cx PARAFUSO DRYWALL DTA 25 / GN25 — 2 cx ≈ R\$ 3.555,14 estimado ... e mais 1 itens	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES DA SEMANA

Observações - FINALIZAR ZELADORIA - LOUÇAS E METAIS - ZELADORIA - VIDROS COMPRAR VIDROS CAIXILHOS - CUMIEIRA ENTREGUE SEM PINTURA- REALIZAR PINTURA NA OBRA Recomendações à contratada - AUEMNTAR EFETIVO, PARA EXECUÇÃO DE COBERTURA Pendências em aberto - ELETRICA ZELADORIA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DA SEMANA

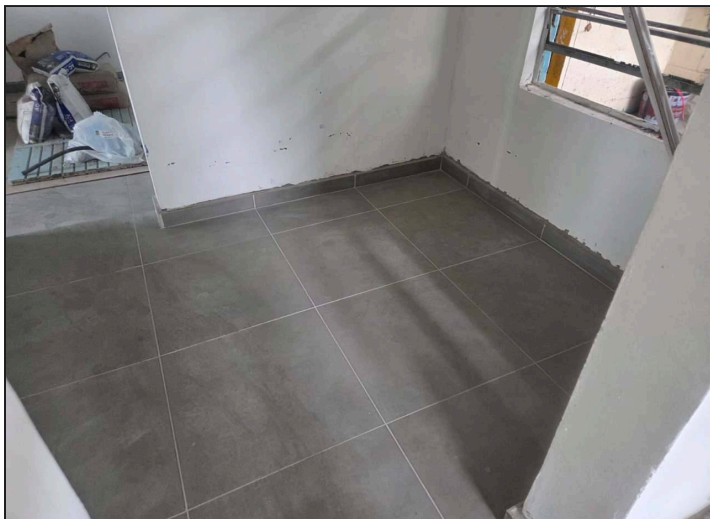


Registro da visita

07/10/2026




Registro da visita

07/10/2026

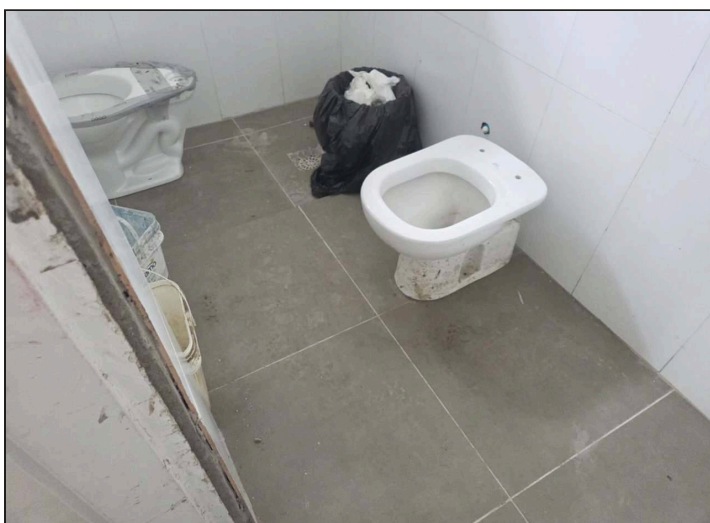

Registro da visita

07/10/2026

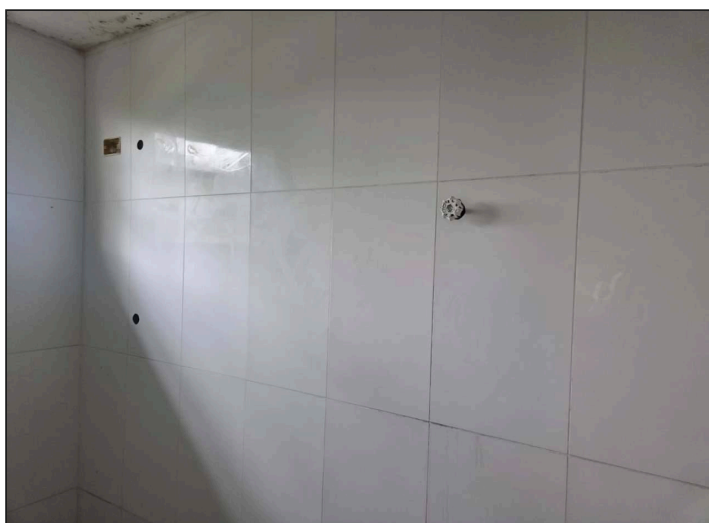


Registro da visita

07/10/2026




Registro da visita

07/10/2026

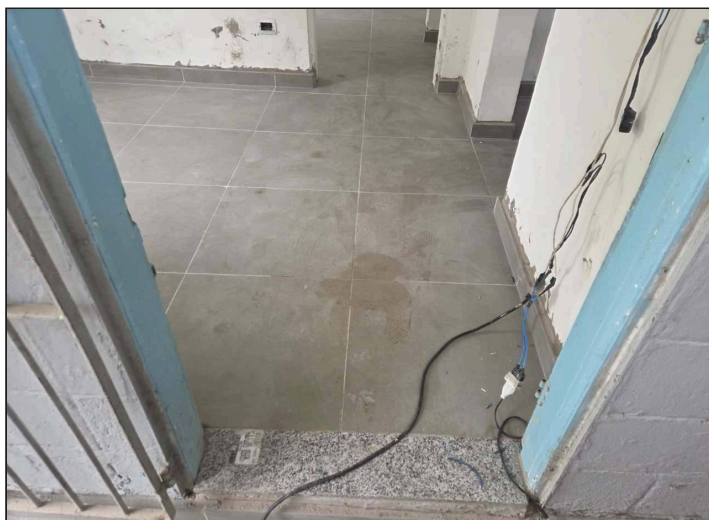


Registro da visita

07/10/2026

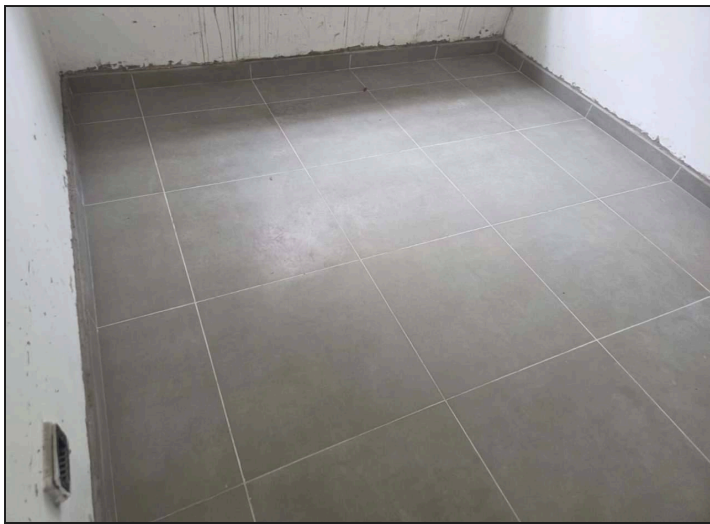


Registro da visita

07/10/2026

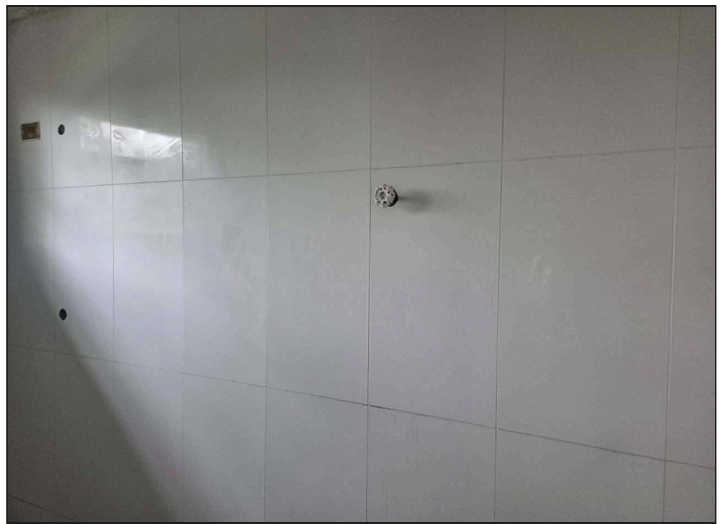


Registro da visita

07/10/2026

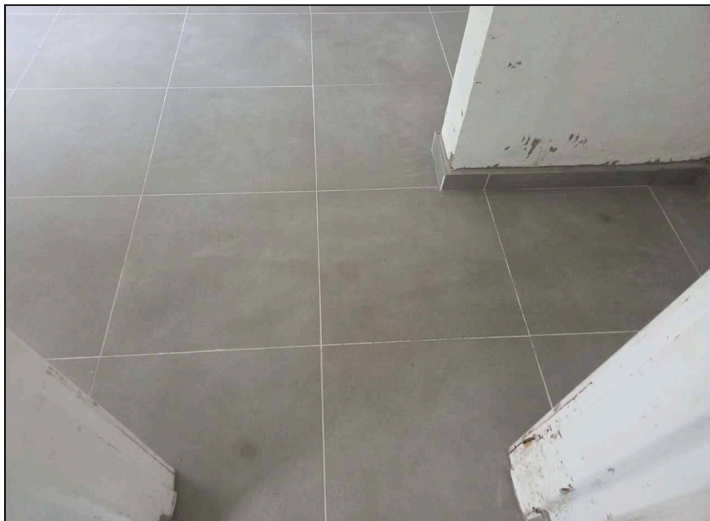

Registro da visita

07/10/2026

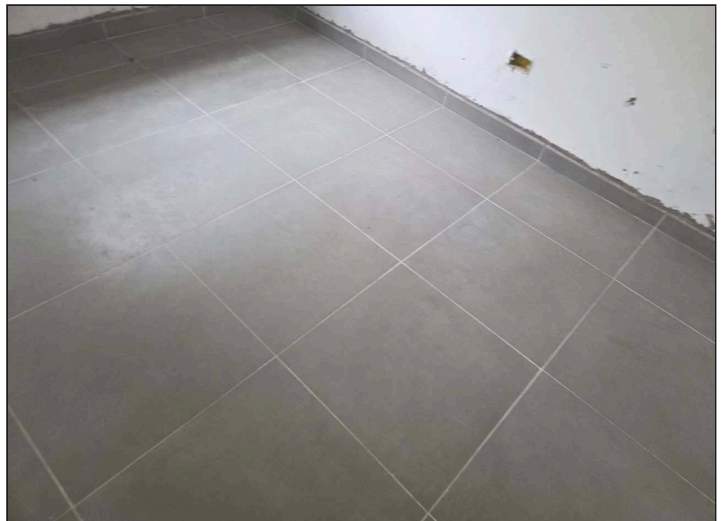


Registro da visita

07/10/2026




Registro da visita

07/10/2026

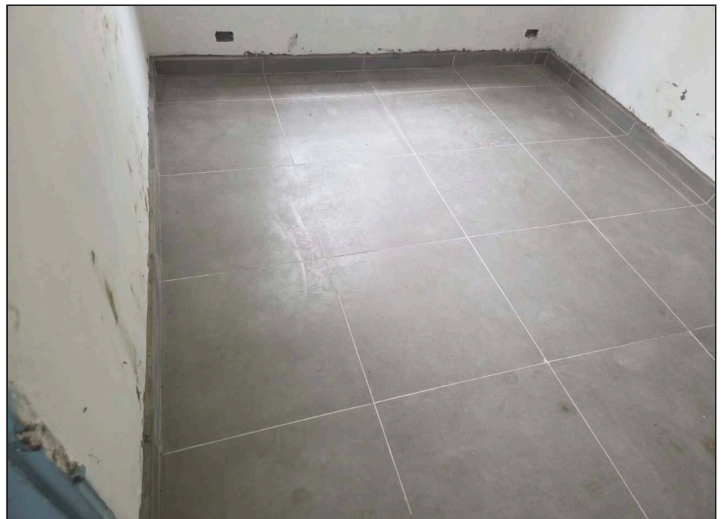

Registro da visita

07/10/2026

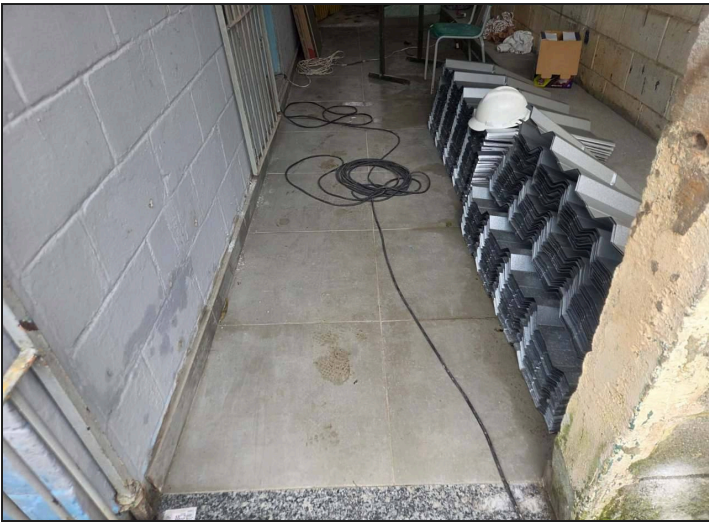


Registro da visita

07/10/2026



Registro da visita

07/10/2026

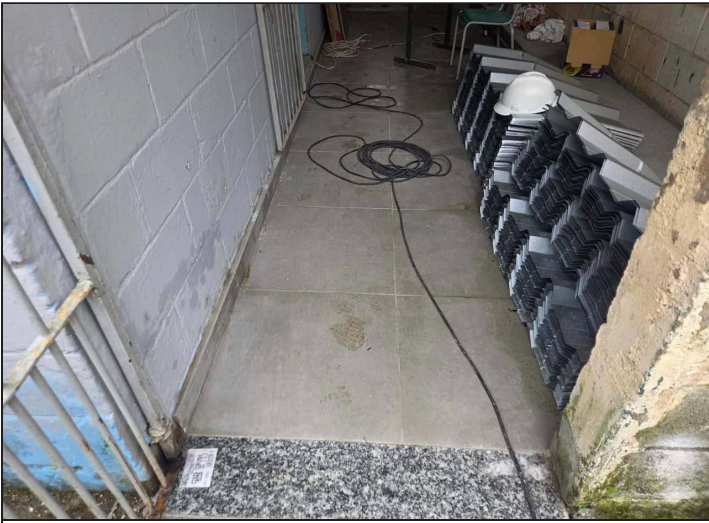

Registro da visita

07/10/2026

DOUGLAS Eng. responsável — contratada	LEONARDO ZANAO Empreiteiro	RENATO Fiscal / FDE
---	--	---
